



verslag

*2^e Inlichtingsessie Contract 31140318
Engineeren en uitvoeren van Groot Variabel Onderhoud
aan het HWN WNZ 2020/2021*

Datum bespreking

8 mei 2019

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen naar aanleiding van door Gegadigden aangedragen thema's:

1. Opening/welkom
2. Achtergronden Projectdoelstellingen
3. Veiligheid
4. Argumentatieleer Best Value
5. Vragen
6. Mededelingen

1. Opening/welkom en mededelingen

De aanwezigen worden van harte welkom geheten. Na een aantal huishoudelijke mededelingen stellen de aanwezigen zich voor.

2. Achtergronden Projectdoelstellingen

Toelichting op pagina 3 van de presentatie:

In de afgelopen jaren hebben wij als Opdrachtgever gemerkt dat onverwachte dingen aan het licht komen bij de uitvoering van het werk. Er kan sprake zijn van een delta tussen het contract en de werkelijkheid buiten. Twee voorbeelden van oorzaken is bijvoorbeeld dat de gegevens waarop het contract is gebaseerd is verouderd. Ook kan het zijn dat de verhardingsonderzoeken niet alles aan het licht hebben gebracht omdat deze onderzoeken zijn gebaseerd op steekproeven. Als opdrachtgever willen we voorkomen dat we tijdens de uitvoering voor voldongen feiten komen te staan en dan ter plekke een oplossing moeten kiezen. We horen graag hoe hiermee wordt omgegaan zodat wij als opdrachtgever op tijd weten waar we aan toe zijn.

Toelichting op pagina 4 van de presentatie:

Bij de MKI waarden hebben we alleen gekeken naar asfalt met betrekking tot duurzaamheid. Echter duurzaamheid is natuurlijk veel breder. Met deze doelstelling hopen we de inschrijvers te inspireren om ook op andere gebieden na te denken over duurzaamheid. Immers, de keten is heel breed. Wij hopen op mooie ideeën vanuit te markt op dit vlak.

Vraag gegadigde:

Projectdoelstelling 2: In de toelichting van de projectdoelstelling 2 staat 'Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze het onderhoud zoveel mogelijk duurzaam realiseert. De focus dient hierbij te liggen op Energie en materialen en Welzijn en gezondheid. Dit zijn 2 van de 12 thema's uit de Omgevingswijzer.'. Klopt dat hier 3 thema's worden bedoeld: 1) Energie, 2) CE & Materialen en 3) Welzijn en Gezondheid?

Antwoord RWS:

Bij het opstellen van de contractstukken is nog uitgegaan van een vorige versie van de omgevingswijzer. Het klopt inderdaad dat er moet worden uitgegaan van 3 van de 12 thema's, te weten:

- 1) Energie
- 2) CE & materialen
- 3) Welzijn en gezondheid

Bij het thema Energie moet uitgegaan worden van besparing van energie en niet van opwekking van energie.

Vraag gegadigde:

Projectdoelstelling 2: Kunt u verduidelijken waarom bij projectdoelstelling 2 focus op deze 2 (of 3) thema's dient te liggen? Het valt ons op dat het thema Bereikbaarheid, onderdeel betrouwbaar en robuust niet in voorkomt (Het mobiliteitssysteem wordt robuuster als extreem lange reistijden door incidenten (ongevallen, extreem weer, werkzaamheden, evenementen) minder vaak voorkomen). Klopt het dat u alleen op zoek bent naar de door u aangegeven thema's of verwacht u het ook dat we aan de andere thema's aandacht geven?

Antwoord RWS:

De vraag is gesteld of de andere thema's van de omgevingswijzer zoals bijvoorbeeld het thema 'Bereikbaarheid' ook aandacht moet worden gegeven bij de inschrijving.

We hebben ervoor gekozen om de focus aan te brengen op de genoemde drie thema's. Aan de andere thema's hoeft geen extra aandacht worden besteed. Reden waarom bijvoorbeeld 'bereikbaarheid' niet is genoemd is als volgt. De Omgevingswijzer wordt ook gebruikt voor nieuwbouw projecten. Bereikbaarheid heeft meer betrekking op waar leg je een nieuwe weg aan en hoe beïnvloedt dat de bereikbaarheid van het gebied. Als je het ziet op groot onderhoud dan kun je bereikbaarheid zien als de bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden. Omdat de SLOTS al worden meegegeven is dit geen focuspunt geworden van deze projectdoelstelling.

Toelichting op pagina 6 van de presentatie:

Wat wij de laatste jaren hebben gemerkt is dat het opleverdossier en de overdracht niet altijd de aandacht heeft gekregen die het verdient. We zien dat enerzijds het projectteam bij opdrachtnemer ontbindt omdat het werk buiten klaar is eind 2021 en het opleverdossier pas 31 maart 2022 hoeft te zijn opgeleverd. Anderzijds zien we dat vanuit onze eigen organisatie soms aanvullende eisen komen vanuit stakeholders.

RWS ziet wel verschillende wijzen van opleveren, bijvoorbeeld op één dag oplevering. RWS heeft geen voorkeur voor een wijze maar is altijd geïnteresseerd in 'pareltjes' hiervoor.

Wij zijn op zoek naar een slimme aanpak en afhandeling zodat we het project goed kunnen afronden en overdragen.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Overleg
2^e Inlichtingsessie
Contract 31140318

Datum
8 mei 2019

Bijlage(n)
1

Toelichting op pagina 7 van de presentatie:

De weekenden (SLOTS) liggen vast en worden met het contract meegegeven. Echter, er is nog een hele weg te bewandelen voordat deze weekenden zo zijn ingericht dat het leidt tot acceptatie van het verkeersmaatregelenplan door wegbeheerders onderliggend wegennet. Om dit te bewerkstelligen dient te worden afgestemd met verkeerskundigen van Rijkswaterstaat en externe stakeholders. Het proces dient te voldoen aan de daarvoor geldende termijnen. Hoe gaat de opdrachtnemer dit proces inrichten en beheersen? Kent hij het speelveld en de belangen van de Opdrachtgever en weet hij de juiste partijen tijdig te raadplegen en de raakvlakken en aandachtspunten te verwerken in zijn plannen.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Overleg
2^e Inlichtingsessie
Contract 31140318

Datum
8 mei 2019

Bijlage(n)
1

3. Veiligheid

Vraag gegadigde:

Projectdilemma: spanning tussen veiligheid, bereikbaarheid en tijdigheid in drukke omgeving. We zijn de scope aan het analyseren en doorgronden, daarna bekijken we of dit binnen de SLOTS past. Hoe gaan we ermee om als we van mening zijn dat voor een veilige uitvoering er eigenlijk een SLOT meer nodig is?

Antwoord RWS:

Als een gegadigde van mening is dat de werkzaamheden niet binnen een SLOT passen omdat anders de veiligheid in het geding komt dan moet gegadigde dit aan RWS kenbaar maken. RWS zal het bewuste SLOT dan nogmaals nader bekijken i.r.t. de geplande werkzaamheden.

Vraag gegadigde:

In het contract worden in de SLOTS geen verkeersregelaars voorgeschreven om het betreden van het afgesloten werkvak door onbevoegden te voorkomen. Uit ervaring op soortgelijke projecten blijkt vaak dat verkeer via afgesloten toegangen welke conform richtlijnen van de juiste verkeersmaatregelen en afsluitingen zijn voorzien (bijv. toe- en afritten en verbindingswegen) alsnog het afgesloten vak probeert te betreden. Dit heeft tot bijna ongevallen geleid. Om hier een veilige situatie te bewerkstelligen verzoeken wij u om bij elke toegang over de openbare weg de inzet van een verkeersregelaar voor te schrijven. Door deze verkeersregelaars uitdrukkelijk voor te schrijven wordt Level Playing Field bereikt en zorgt u er daarmee voor dat er niet wordt geconcurrereerd kan door de inzet van geen of minder verkeersregelaars. Kunt u dit aanpassen en daarmee zorgen voor een optimaal veilige werkomgeving?

Antwoord RWS:

Veilig werk uitvoeren hoort bij de Opdracht. Het is aan de Opdrachtnemer om een inschatting te maken of en zo ja bij welke afzetting het nodig is een verkeersregelaar in te zetten t.b.v. veiligheid van het werkvak.

Om misverstanden te voorkomen hieronder een nuancering:

RWS heeft budget voor flankerende maatregelen. Het inzetten van verkeersregelaars op het onderliggend wegennet om de doorstroming, bereikbaarheid of verkeersveiligheid te bevorderen valt daaronder. Dit hoort dus niet bij de Opdracht.

4. Argumentatieleer Best Value

Vraag gegadigde:

In de presentatie van Best Value training wordt een voorbeeld van een argumentatieleer toegelicht. In dit voorbeeld wordt ook het antwoord op de "hoe" vraag in verwerkt. Kunt u verduidelijken in hoeverre het "hoe" onderdeel is van de beoordeling bij het prestatiedossier?

Antwoord RWS:

Bij de beoordeling wordt het 'hoe' neutraal beoordeeld. Sheets 57 is slechts een voorbeeld van hoe een prestatie er uit zou kunnen zien. Met de kleuren groen, geel, blauw wordt in sheets 54 en 55 aangegeven welke onderdelen essentieel zijn voor een beoordeling beter dan neutraal.

Aanvulling:

Vrijdag 17 mei 2019 wordt er om 10:00 uur bij RWS Westraven in Utrecht een training met als onderwerp Best Value Argumentatie verzorgd door het Best Value kernteam van RWS.

Gegadigden kunnen zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk donderdag 16 mei via de module 'Berichten' in TenderNed met opgave van de namen van de deelnemers.

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Overleg
2^e Inlichtingsessie
Contract 31140318

Datum
8 mei 2019

Bijlage(n)
1

Toelichting door de indiener van dit onderwerp:

De vraag is gesteld omdat in het voorbeeld een rood kruis staat bij het voorbeeld.

Reactie RWS:

In de sheet argumentatiestructuur staat 2x hoe. De 'aanpak-hoe' scoort niet voor een hogere score, maar kan wel ter verduidelijking opgenomen worden. Het blok eronder ("Wij gebruiken materialen...") geeft aan dat je de aanpak nog veel verder in detail kunt beschrijven. Meestal heeft de inschrijver daar ook zelf wel een beeld bij. Het kruis geeft aan dat de Best Value aanbesteder tijdens de inschrijvingsfase hier niet in geïnteresseerd is voor de beoordeling.

5. Vragen**Vraag:**

Wanneer kunnen de uitnodigingen worden verwacht voor de individuele inlichtingen?

Antwoord:

Gegadigden kunnen bij het indienen van de vragen voor de nadere inlichtingen hun voorkeur aangeven voor de dag van de nadere inlichtingen.

De uitnodigingen worden uiterlijk 13 mei verstuurd.

Vraag:

Voor de MKI-berekening is ook 2-laags ZOAB opgenomen. Hoe moet hiermee worden omgegaan?

Antwoord:

De lagen dienen afzonderlijk berekend te worden en gebundeld te worden (gemiddelde MKI-waarde voor het mengsel).

Bij de onderbouwing dient ook aangegeven te worden hoe de opgegeven MKI-waarde tot stand is gekomen.

Vraag:

Dient voor de MKI-berekening ook het asfalt op de kunstwerken meegenomen te worden?

Antwoord:

Dit is correct.

6. Mededelingen

De SLOTS en reserve-SLOTS zijn meegegeven voor dit contract. Wanneer een SLOT geen doorgang kan vinden op basis van de no-go criteria dan dient gebruik gemaakt te worden van het reserve-SLOT. Het gebruik maken van een reserve-SLOTS is onderdeel van de Inschrijving.

De inlichtingssessie wordt om 10.35 uur gesloten met dank voor ieders komst.

Overleg
*2^e Inlichtingssessie
Contract 31140318*

Datum
8 mei 2019

Bijlage(n)
1

	OVERZICHT BIJLAGEN 2^e INLICHTINGENSESSIE CONTRACT: 31140318
01	Presentatie 2e Algemene Inlichtingen 8 mei 2019



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

2e Inlichtingen zaaknr. 31140318

Engineeren en
uitvoeren van Groot
Variabel Onderhoud aan
HWN WNZ 2020-2021.

Woensdag 8 mei 2019



Programma

- 1 Achtergronden projectdoelstellingen
- 2 Veiligheid
- 3 Argumentatieleer Best Value
- 4 Vragen



Achtergronden projectdoelstellingen

1. Een zo transparant en beheerst mogelijk proces van het voorbereiden en uitvoeren van voorziene en onvoorziene werkzaamheden.

Toelichting: het gaat hierbij ook om een proces voor het in beeld brengen van afwijking t.o.v. de scopelijst en een proactieve houding van de ON, zodanig dat de OG ontzorgd wordt bij afwijkingen.



Achtergronden projectdoelstellingen

2. Bijdragen aan een duurzame leefomgeving door zoveel mogelijk invulling te geven aan de Aanpak Duurzaam GWW.

Toelichting: Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze het onderhoud zoveel mogelijk duurzaam realiseert. De focus dient hierbij te liggen op Energie en materialen en Welzijn en gezondheid. Dit zijn 2 van de 12 thema's uit de Omgevingswijzer. De Aanpak Duurzaam GWW is te vinden via deze link:

<http://www.duurzaamgww.nl/>; de Omgevingswijzer via:

<https://www.omgevingswijzer.org/>. De bijdrage van deze doelstelling is exclusief EMVI-BPKV criterium duurzaam asfalt.



Achtergronden projectdoelstellingen (PD2)

- In de toelichting van de projectdoelstelling 2 staat 'Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze het onderhoud zoveel mogelijk duurzaam realiseert. De focus dient hierbij te liggen op Energie en materialen en Welzijn en gezondheid. Dit zijn 2 van de 12 thema's uit de Omgevingswijzer.'. Klopt dat hier 3 thema's worden bedoeld: 1) Energie, 2) CE & Materialen en 3) Welzijn en Gezondheid?
- Kunt u verduidelijken waarom bij projectdoelstelling 2 focus op deze 2 (of 3) thema's dient te liggen? Het valt ons op dat het thema Bereikbaarheid , onderdeel betrouwbaar en robuust niet in voorkomt (Het mobiliteitssysteem wordt robuuster als extreem lange reistijden door incidenten (ongevallen, extreem weer, werkzaamheden, evenementen) minder vaak voorkomen). Klopt het dat u alleen op zoek bent naar de door u aangegeven thema's of verwacht u het ook dat we aan de andere thema's aandacht geven?



Achtergronden projectdoelstellingen

3. Een zo efficiënt mogelijk proces van opleveren tot en met acceptatie van opleverdossier, op een zo vroeg mogelijk tijdstip.



Achtergronden projectdoelstellingen

4. Een zo efficiënt mogelijk proces om te komen tot definitieve verkeersmaatregelenplannen




Veiligheid:

- 1 Extra SLOT nodig voor het (veilig) uitvoeren van de werkzaamheden
- 2 Inzet van verkeersregelaars



Best Value

Onderbouwing van Best Value: de 'hoe'-vraag

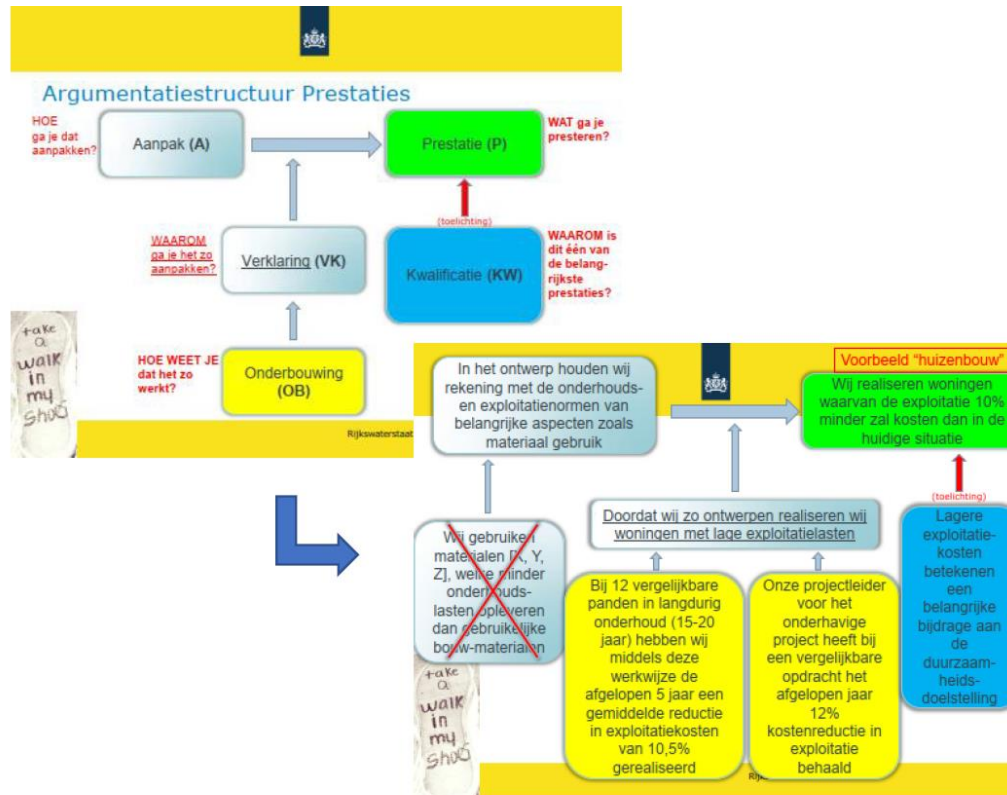



Vragen





Afsluiting

- Bedankt en wel thuis.
