


[illegible]

Deterministische planning Contract Zuid


Gunning t/m openstelling 2^e nieuwe Merwededebrug

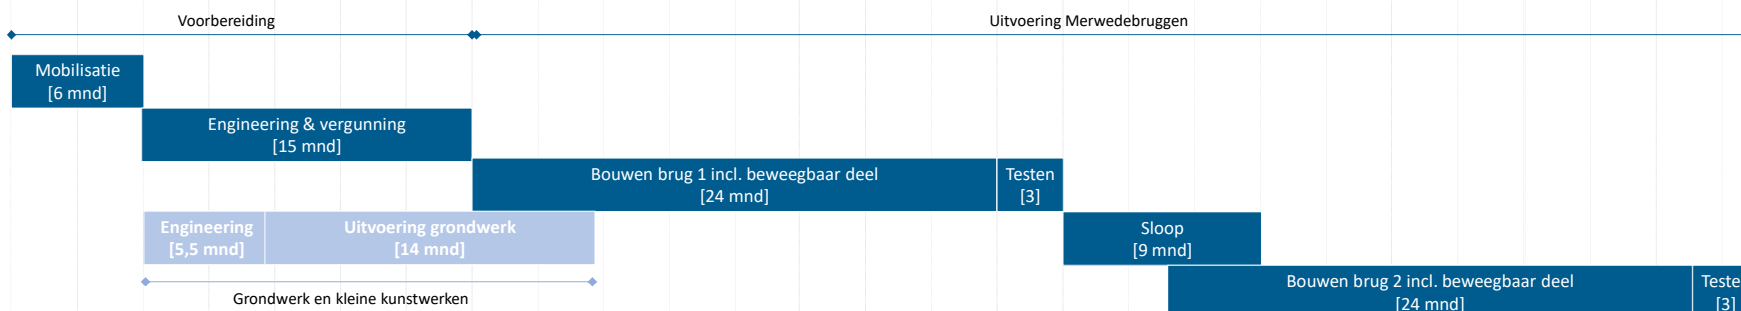

Deterministische planning Contract Noord

Gunning t/m openstelling 2^e nieuwe Hagesteinsebrug

Gunning Contract Noord valt later in tijd dan gunning Contract Zuid

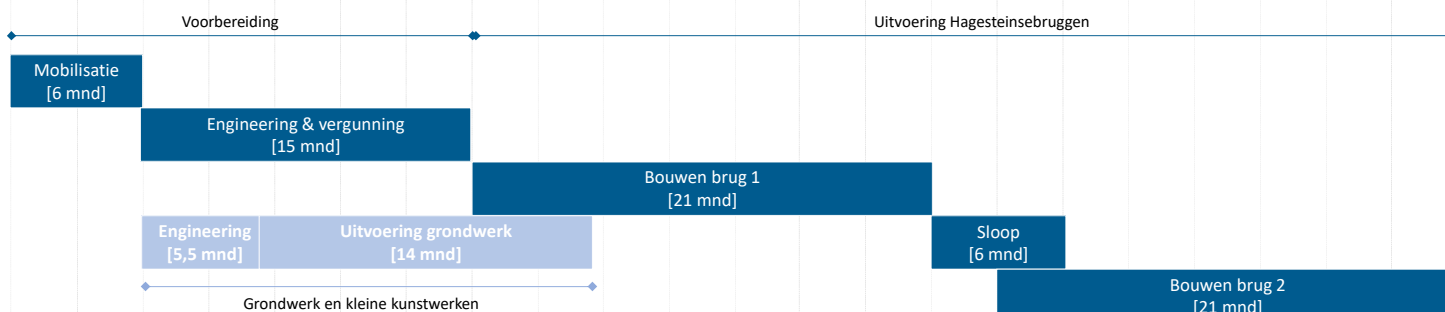

Planningsuitgangspunten Contract Zuid:

- Mobilisatieperiode van 6 maanden vanaf gunning
- Periode engineering en vergunning van de Merwedeburg van 15 maanden
- Parallel daaraan engineering en uitvoering van grondwerk (o.a. aanleg terpen), uitgangspunt is toepassen zettings-versnellende maatregelen
- Bouwtijd per brug van 24 maanden, incl. aanbruggen en beweegbaar deel
- Testen vindt voor beide bruggen deels parallel aan de bouw plaats en voor 3 maanden op het kritieke pad
- Na de helft van de totale 9 maanden sloottijd voor de bestaande brug, start de bouw van de tweede nieuwe Merwedeburg
- Stuwings- en stremmingseisen tijdens de bouw en sloop worden kritiek geacht voor de bouwfasering

Planningsuitgangspunten Contract Noord:

- Gunning contract Noord valt later in tijd dan gunning Contract Zuid
- Mobilisatieperiode van 6 maanden vanaf gunning
- Periode engineering en vergunning van de Hagestesteinsebrug van 15 maanden
- Parallel daaraan engineering en uitvoering van grondwerk (o.a. aanleg terpen), uitgangspunt is toepassen zettings-versnellende maatregelen
- Houwtijd per brug van 21 maanden, aanbruggen worden parallel aan de bouwdooverspanning gebouwd
- Na 3 maand van de 6 maanden slooptijd voor de bestaande brug, start de bouw van de tweede nieuwe Hagesteinebrug
- Stuwings- en stremmingseisen tijdens de bouw en sloop worden kritiek geacht voor de bouwfasering
