



gemeente
Haarlemmermeer


BLVC-

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Veiligheid

Communicatie

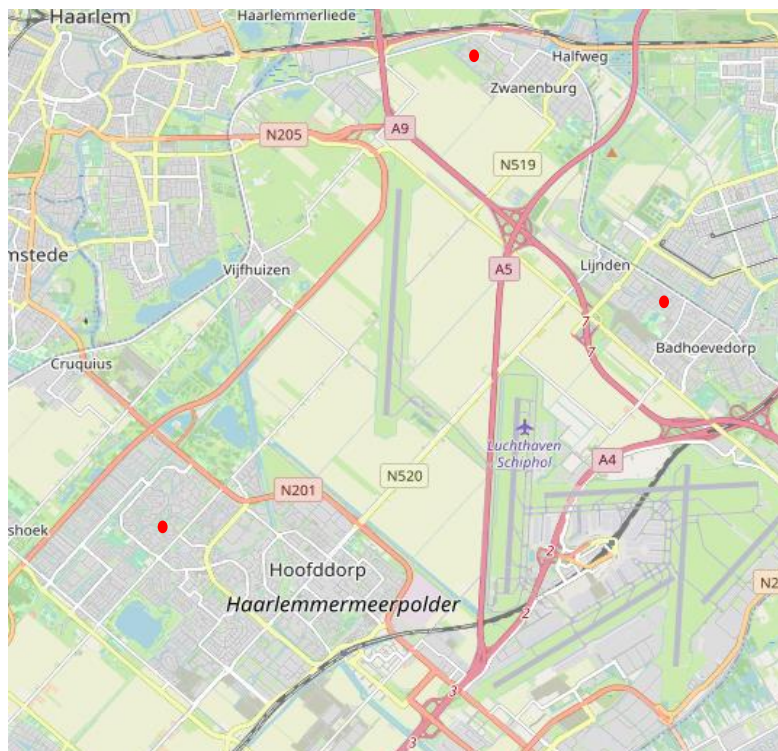

Gemeente Haarlemmermeer Onderhoud 3-tal recreatievelden Badhoevedorp, Zwanenburg en Hoofddorp

Ingenieursbureau	
Datum BLVC	15-12-2022
Status BLVC	Definitief rev. 01
Steller BLVC	R. Schoorstra
Werkordernummer	302153, 302154, 302155
Datum Uitvoering	september – november 2023
	Naam
Projectleider:	W. Dekker
Werkvoorbereider:	L-J. Korsuize



gemeente
Haarlemmermeer

Inhoudsopgave


1.	Inleiding	3
2.	Omgevingsanalyse	4
2.1	Elspeterbos, Hoofddorp	4
2.2	Leliestraat - Badhoevedorp	5
2.3	Kinheim. Zwanenburg	6
3.	Bereikbaarheid	7
3.1	Fasering	7
3.2	Bestemmingsverkeer	7
3.3	Nood- en hulpdiensten	7
3.4	Bouwverkeer	7
4.	Leefbaarheid	7
5.	Veiligheid	8
6.	Communicatie	8
7.	Melding	8
7.1	Wijziging en uitloop planning	9
Bijlage 1	Aan te pakken velden – Badhoevedorp, Hoofddorp en Zwanenburg	10
Bijlage 2	Informatieborden	13
Bijlage 3	Communicatieplanning	16
Bijlage 4	Verspreidingsgebied bewonersbrief	17

1. Inleiding

Naar aanleiding van de verplichte keuringen is gebleken dat een aantal recreatievelden niet meer voldoen aan de gestelde eisen. De velden moeten daarom vervangen worden. Het betreft:

- Elspeterbos t.h.v. nr. 46 Hoofddorp
- Leliestraat t.h.v. nr. 24 Badhoevedorp
- Kinheim t.h.v. nr. 228 Zwanenburg

Voor een overzicht van de locaties zie figuur 1 en bijlage 1.

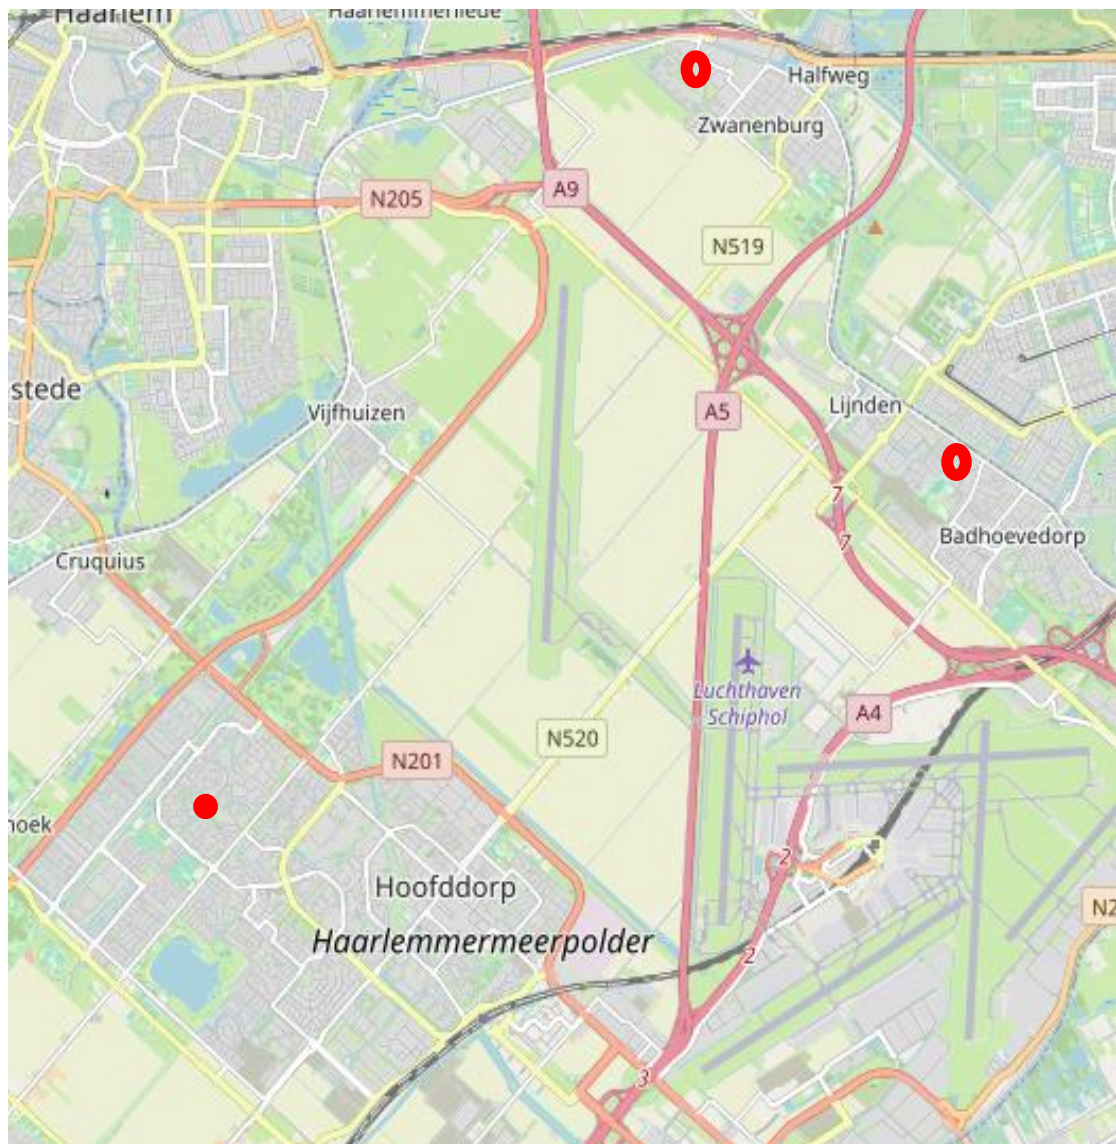

Figuur 1: Locaties te renoveren recreatievelden te Hoofddorp, Badhoevedorp en Zwanenburg (bron: gemeente Haarlemmermeer)

De werkzaamheden staan gepland in het najaar van 2023, tijdens de herfstvakantie (21 t/m 29 oktober) mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden en dienen de velden bespeelbaar te zijn. Per veld duren de totale werkzaamheden ongeveer 2 weken.



gemeente
Haarlemmermeer

In dit BLVC-memo staat beschreven hoe wordt omgegaan met de **Bereikbaarheid**, de **Leefbaarheid**, de **Veiligheid** en de **Communicatie**. Gevolgen van de projectuitvoering voor de omgeving en gebruikers, samen met de beheermaatregelen om de gevolgen te verminderen en te beheersen worden zo in beeld gebracht. Tevens worden voorwaarden aangegeven voor de aannemer met betrekking tot de BLVC-aspecten.

2. Omgevingsanalyse

2.1 Elspeterbos, Hoofddorp

Het recreatieveld Elspeterbos is gelegen in een groengebied omgeven door woonstraten in de wijk Overbos. In het groengebied is ook de speeltuin Elspeterbos gelegen.

Voor zover nu, november 2022, bekend zijn er geen andere werkzaamheden die conflicteren met deze werkzaamheden.

Voor een impressie van de bestaande situatie zie onderstaande foto's (bron: gemeente Haarlemmermeer).





gemeente
Haarlemmermeer

2.2 Leliestraat - Badhoevedorp

Het veld is gelegen in de buurt Akerveld in het noordwesten van Badhoevedorp midden in een woonwijk in een 30 km zone.

Voor zover nu, november 2022, bekend zijn er geen andere werkzaamheden die conflicteren met deze werkzaamheden.

Voor een impressie van de bestaande situatie en aanrij routes zie onderstaande foto's (bron: gemeente Haarlemmermeer).





2.3 Kinheim, Zwanenburg

Het recreatieveld Kinheim is gelegen in de woonwijk Kinheim gelegen tussen 2 woonbuurten nabij Wielerbaan de Bataaf.

Voor zover nu, november 2022, bekend zijn er geen andere werkzaamheden die conflicteren met deze werkzaamheden.

Voor een impressie van de bestaande situatie en aanrij routes zie onderstaande foto's (bron: gemeente Haarlemmermeer).





gemeente
Haarlemmermeer



3. Bereikbaarheid

3.1 Fasering

- Per veld duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september t/m november 2023, tijdens de herfstvakantie (21 t/m 29 oktober wordt niet gewerkt en zijn de velden bespeelbaar).
- De werkvolgorde is naar inzicht van de aannemer.

3.2 Bestemmingsverkeer

- Woningen en andere accommodaties blijven altijd bereikbaar.
- Speciale aandacht voor de bereikbaarheid van de aanwezige mindervalidenparkeerplaatsen.
- Er hoeven geen omleidingsroutes te worden ingesteld.
- Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, hiervoor moet een bereikbaarheidsplan worden opgesteld waarbij voldaan wordt aan de richtlijn “Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019”
- De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdelijke verkeersmaatregelen. Zie kopje ‘Melding’.

3.3 Nood- en hulpdiensten

- De nood- en hulpdiensten ondervinden géén hinder.
- De aannemer stelt een werkplanning en fasering op en legt deze – via de melding bij het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid – voor ter toetsing aan de nood- en hulpdiensten en toont aan dat er geen hinder is. Zo is voor de nood- en hulpdiensten inzichtelijk wanneer waar wordt gewerkt en of de aannemer voldoet aan de bereikbaarheidseisen.

3.4 Bouwverkeer

- De route van het bouwverkeer door de woonstraten dient zo kort mogelijk te zijn
 - De voorkeursroute voor de Leliestraat is via de Oleanderlaan, Fuchsiastraat en Orchidelaan.
 - De voorkeursroute voor het Elspeterbos is via het Ommerbos en het verharde plein aan het Elspeterbospad.
 - De voorkeursroute voor Kinheim is via de Zwanenburgerdijk en Kinheim.
- In overleg tussen Gebiedsbeheer en de directievoerder van de gemeente wordt bepaald waar materieel en materiaal wordt opgeslagen. Uitgangspunt is dat dit binnen het werkterrein wordt opgeslagen.

4. Leefbaarheid

- De werkzaamheden vinden regulier plaats doordeweeks tussen 07:00 uur en 17:00 uur; indien nodig kan hierbuiten gewerkt worden, de aannemer moet hiervoor wel toestemming vragen.



gemeente
Haarlemmermeer

5. Veiligheid

- De toe te passen tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan CROW-publicatie 527 '*Maatregelen op niet-autosnelwegen. Werk in uitvoering 96b 2020*'.
- Er dient voldaan te worden aan datgene wat in het document "*Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid brandweer 2019*" gesteld wordt. Dit is ook van toepassing voor ambulance en politie.
- Werkzaamheden rond bomen uitvoeren volgens Bomenposter "*Werken rond bomen*".
- Het werkterrein wordt veilig afgeschermd voor passanten

6. Communicatie

- | | |
|--|------------------------|
| • De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, de Wijkraad Overbos en de Dorpsraad Zwanenburg / Halfweg worden geïnformeerd door de gebiedsbeheerder over de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden en wordt gevraagd dit te plaatsen op de eigen website / nieuwsbrief / anders | Actie
Gemeente |
| • De directievoerder / aannemer maken zo nodig specifieke afspraken met bedrijven en/of bewoners over de bereikbaarheid voor leveranciers en personeel. | Gemeente /
Aannemer |
| • Bewoners ontvangen een algemene bewonersbrief. In deze brief staat aangegeven wat het werk inhoudt, de totale duur van de werkzaamheden, (eventueel) de fasering, waar informatie op internet is na te lezen en de naam van de contactpersoon | Gemeente |
| • Passanten worden door middel van attentieborden op de werkzaamheden (en daarmee de afsluiting van het werkterrein) gewezen | Aannemer |
| • Informatie op de website, "Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen" | Gemeente |
| • Indien van toepassing worden scholen en andere voorzieningen geïnformeerd met betrekking tot de werkzaamheden | Gemeente /
Aannemer |

In de bijlage "Communicatieplanning" worden de termijnen voor informatie benoemd.

7. Melding

De faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen, TVM) dienen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de melding bij Team Vergunningen aan het ingenieursbureau aangeleverd te worden ter goedkeuring.

Uiterlijk 45 kalenderdagen (inclusief 2 weken t.b.v. verspreiding bewonersbrief) vóór aanvang van werkzaamheden dienen de werkzaamheden door de aannemer digitaal te worden gemeld ter toetsing bij het Team Vergunningen via de link:

<https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/opslag-en-tijdelijke-verkeersmaatregel> , inclusief het bereikbaarheidsplan voor de hulpdiensten en de goedgekeurde faserings-, bebordingtekeningen (tekeningen met tijdelijke verkeersmaatregelen). Hierbij wordt ook de locatie voor opslag van materiaal aangevraagd.

De directievoerder meldt, ter controle, twee weken voor aanvang van de werkzaamheden, de feitelijke startdatum aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid.



gemeente
Haarlemmermeer

7.1 Wijziging en uitloop planning

Bij wijziging en/of uitloop van de planning moet de aannemer dit direct melden aan de directievoerder die op zijn beurt dit terstond terugkoppelt aan het Coördinatiecentrum Bereikbaarheid. Het Coördinatiepunt Bereikbaarheid toetst of het werk inderdaad uitgesteld kán worden. Pas na goedkeuring kan doorgewerkt worden conform de nieuwe planning.



gemeente
Haarlemmermeer

Bijlage 1 Aan te pakken velden – Badhoevedorp, Hoofddorp en Zwanenburg





gemeente
Haarlemmermeer





Figuur 3: Locatie recreatievelden Badhoevedorp, Hoofddorp en Zwanenburg (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Bijlage 2 Informatieborden




Overzicht Locatie Leliestraat – Badhoevedorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: locatie aankondigings- en attentiebord

	Bord 1 
Tekst bord:	'Werksaamheden kunstgrasvelden'
(attentiebord)	'van Xx – Yy 2023' ' www.haarlemmermeer.nl/verkeer '



gemeente
Haarlemmermeer

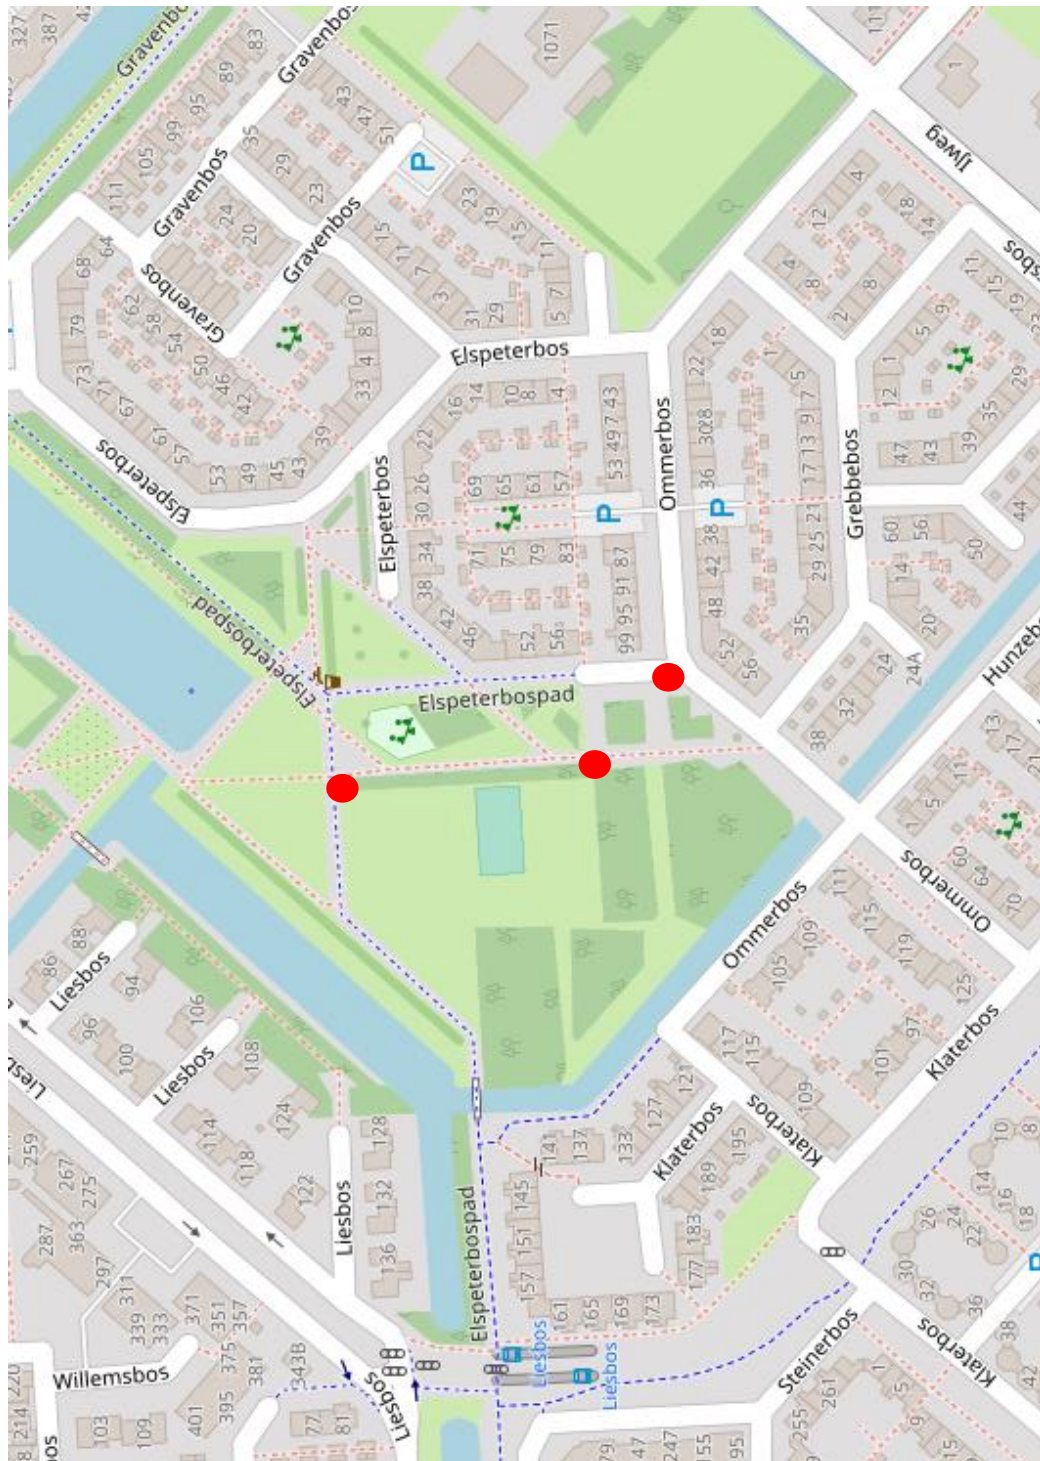

Overzicht Locatie Elspeterbos-Hoofddorp (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: locatie aankondigings- en attentiebord

	Bord 1 
Tekst bord:	'Werzaamheden kunstgrasvelden'
(attentiebord)	'van Xx – Yy 2023' ' www.haarlemmermeer.nl/verkeer '



gemeente
Haarlemmermeer



Overzicht Locatie Kinheim– Zwanenburg (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Rode stip: locatie aankondigings- en attentiebord

	Bord 1 
Tekst bord:	'Werksaamheden kunstgrasvelden'
(attentiebord)	'van Xx – Yy 2023' ' www.haarlemmermeer.nl/verkeer '



**gemeente
Haarlemmermeer**

Bijlage 3 Communicatieplanning

Toe te passen middelen

- Dorps- en wijkraden 4 à 6 weken vooraf informeren
- Gele vooraankondigingsborden twee weken vooraf plaatsen

Wie verzorgt de communicatie?

- De projectleider van het IB i.s.m. GM en anderen
- De gemeentelijke directievoerder is het aanspreekpunt voor de werkzaamheden

Door vóór de informatiebijeenkomst contact op te nemen is het uitwisselen van ideeën, het toelichten van planning en fasering en dergelijke tussen gemeente en wijkraad mogelijk.

Contactschema, NAW-gegevens uitvoeringswerkzaamheden

Functie	Naam	Telefoon	emailadres
Projectleider	Wim Dekker	tel 023-5676341	Wim.Dekker@haarlemmermeer.nl
Directievoerder	Ton Schoone	tel 023-5676346	Ton.Schoone@haarlemmermeer.nl
Toezichthouder	Erik Pessel	Tel 023-5674460	Erik.Pessel@haarlemmermeer.nl
Werkvoorbereider	Leendert-Jan Korsuize	tel 023-5676212	Leendert-Jan.Korsuize@haarlemmermeer.nl
Bereikbaarheid	Dienstdoende medewerker	tel 023-5674390	Bereikbaarheid@haarlemmermeer.nl


Datum /week nummer	Wat	Wie
X-##	GM beoordeelt of het concept BLVC afgestemd moet worden met dorps- of wijkraad en/of andere belangenvertegenwoordigers en stemt af	gemeente
X-6	CB informeert nood- en hulpdiensten (als er een concept plan ligt voor de nood- en hulpdiensten)	gemeente
X-6	GB informeert wijkraad en anderen	gemeente
X-4	Opstellen bewonersbrief	gemeente
X-2	versturen bewonersbrief (GB en GM) (IB en GM)	gemeente
X-2	Plaatsen aankondigingsborden (na versturen bewonersbrief)	aannemer
x-1	Website online "Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen"	gemeente
X	start werkzaamheden plaatsen overige borden	aannemer aannemer
Y#	voltooien werkzaamheden verwijderen attentieborden en tijdelijke verkeersmaatregelen	aannemer aannemer

IB Ingenieursbureau gemeente Haarlemmermeer
 GM GebiedsManagement
 GB Gebiedsbeheer
 CB Coördinatiepunt Bereikbaarheid

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp secretaris@dorpsraadbadoevedorp.nl
 Wijkraad Overbos secretariaat@wijkraadoverbos.nl
 Dorpsraad Zwanenburg / Halfweg bestuur@zwanenburg-halfweg.nl

Bijlage 4 Verspreidingsgebied bewonersbrief


In figuur 4 staat het voorgestelde verspreidingsgebied van de bewonersbrief aangegeven. Dit wordt afgestemd tussen GM en het IB (*kan nog wijzigen is niet van toepassing voor aannemer*).

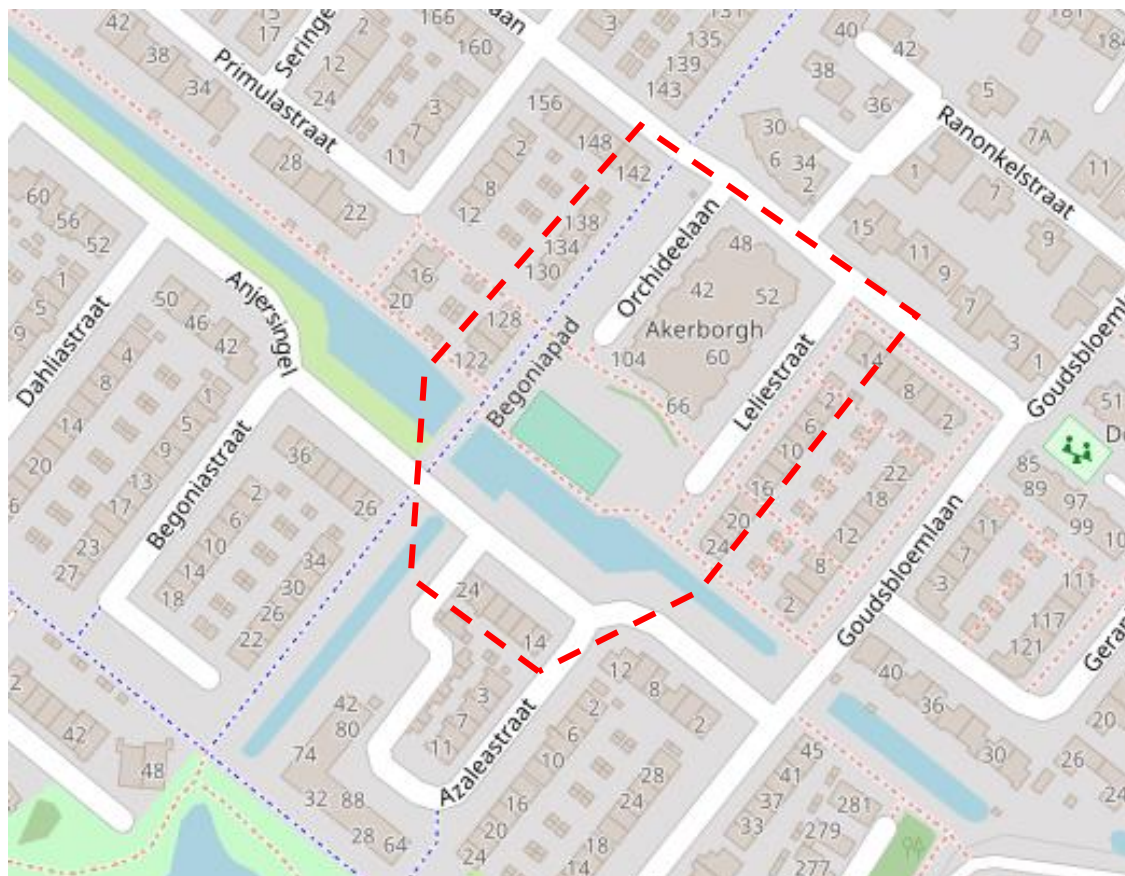

Figuur 4.1: voorgesteld verspreidingsgebied Leliestraat Badhoevedorp (bron: www.openstreetmap.nl)

Bewonersbrief ook sturen aan:


- Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

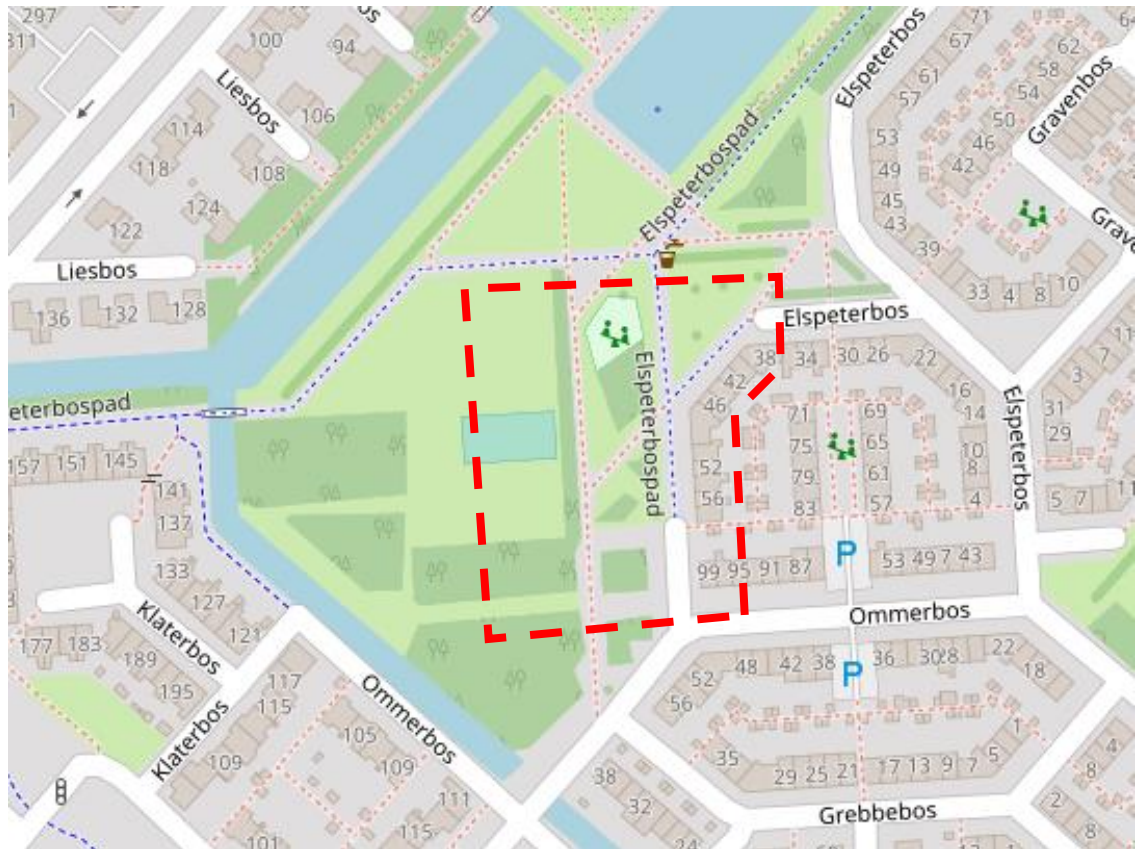

Figuur 4.2: voorgesteld verspreidingsgebied Elspeterbos - Hoofddorp(bron: www.openstreetmap.nl)

Bewonersbrief ook sturen aan:

- Wijkraad Overbos

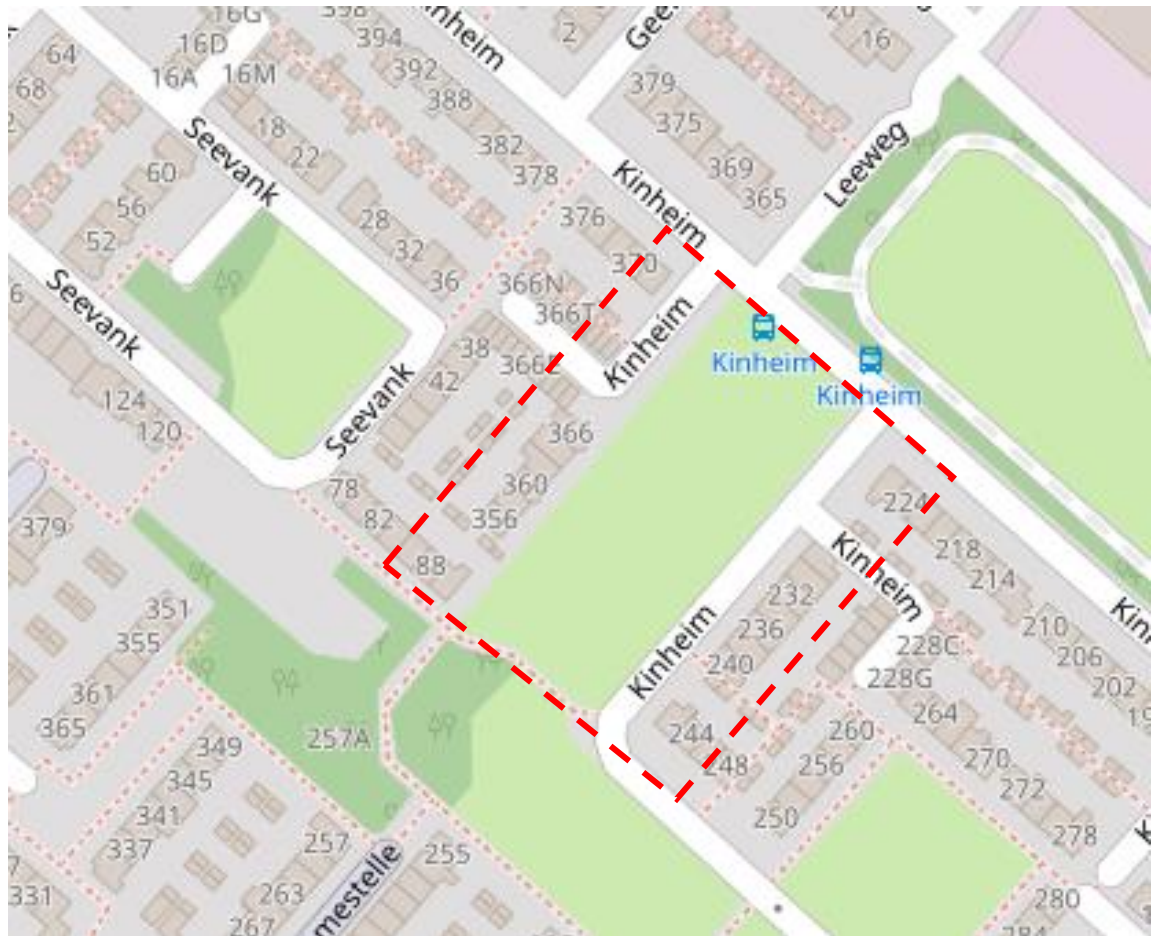

Figuur 4.3: voorgesteld verspreidingsgebied Kinheim – Zwanenburg (bron: www.openstreetmap.nl)

Bewonersbrief ook sturen aan:

- Dorpsraad Zwanenburg / Halfweg
