


Fase 1 Vaststellen Routekaart en uitgangspunten uitwerking Routekaart



Fase 2 Programma van Eisen



Fase 3 Aanbesteden ontwerpde partijen

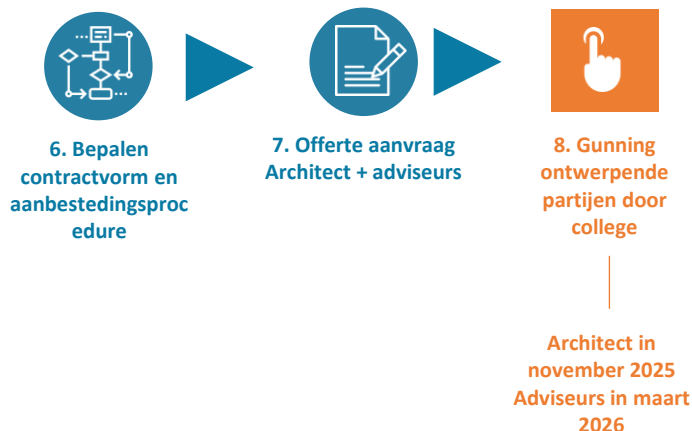

Fase 4a Organisatievorm en onderzoeken



Fase 4b Ontwerptraject



Fase 5a Vervolgonderzoek organisatievorm



13.

Vervolgonderzoek
organisatievorm


Fase 5b Opstellen bestek en contract



14. Opstellen van het
technisch ontwerp
(TO), bestek en
contractdocumenten
zwembad en openbare
ruimte. Definitieve
omgevingsvergunning.



15. Opstellen van een
raming investering en
exploitatie



Besluit bestek door
college, definitief
besluit
organisatievorm door
gemeenteraad

Juli 2027

Fase 6a Voorbereiden organisatievorm en start aanleg openbare ruimte



16. Voorbereiding organisatievorm (onder
voorbehoud besluit raad Sport BV)

Fase 6b Aanbesteding Bouw



Start aanleg
openbare ruimte
Medio 2027



17. Aanbesteden
bouw zwembad



18. Raadsvoorstel
opstellen uitkomsten
aanbesteding



Besluit over
beschikbaar stellen
realisatiebudget door
gemeenteraad

Oktober 2027

Fase 7 Realisatie en start organisatievorm



19. Opstellen van het
uitvoeringsgereed
ontwerp (UO)



Start bouw

Januari 2028



20. Start
organisatievorm
(onder voorbehoud
besluit raad Sport BV)



21. Bouwfase en
aanleg openbare
ruimte



Opening

Mei 2029

Fase 8 Nazorg



22. Nazorg

Toelichting versie 18 september 2026

- De stappen met de organisatievorm zijn toegevoegd
- De aanleg openbare ruimte is toegevoegd
