




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

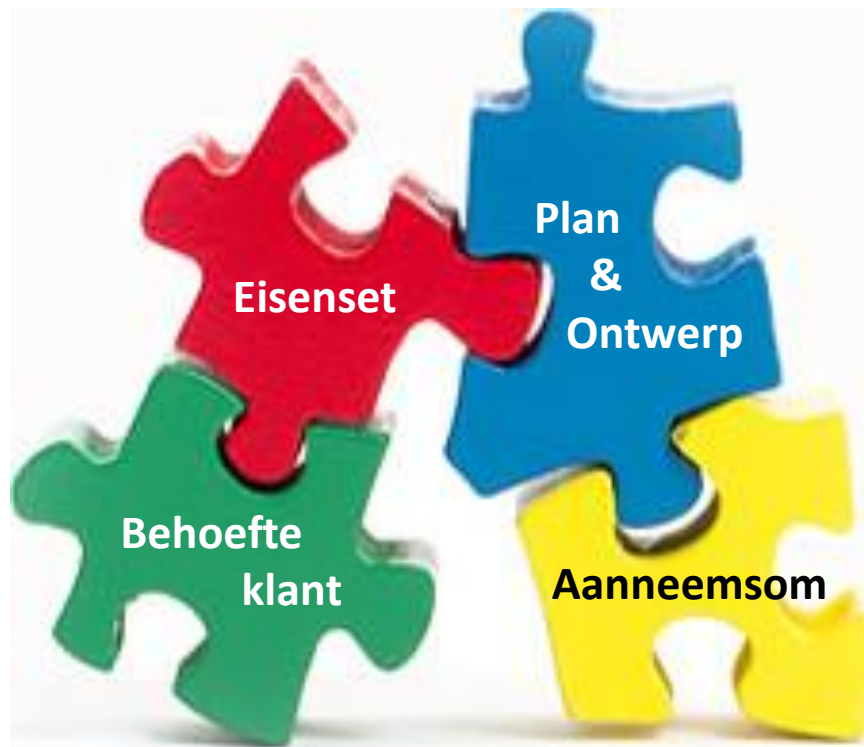

"DeCoDE, Uitvoeren conserveringswerkzaamheden binnenzijde drijflichamen Maeslantkering Noord en Zuid gecombineerd met onderhoud voor een deel van het deballastsysteem in de drijflichamen van de Maeslantkering Noord en Zuid. Geplande uitvoeringsjaren 2021, 2022, 2023 en 2024.", met zaaknummer 31146171

Informatiebijeenkomst vooraankondiging

18-06-2019



Graag de telefoon uitzetten





Wie zijn wij:

- Marjolein van Ruler
- Simon Voorberg
- Chris Pfeiffer
- Remco Ijsselstijn
- Jeroen de Heij
- Addy de Jong
- Dennis Claessen



Verantwoordelijkheid Keringen 1

- Keringenteam 1 is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van al het onderhoud (Civiel, WTB, E en IA) aan de Maeslantkering en de Hartelkering.



Wie zijn jullie? voorstelrondje, wie is wie?

- Voorstelronde (naam + bedrijf + functie).



Mededelingen

- Presentatie wordt op Tendered geplaatst



Doelstellingen Informatiebijeenkomst

- Marktpartijen vroegtijdig informeren
- Klankborden met marktpartijen
- Verdere invulling van de samenwerking




Onderwerpen

- Project DECODE aanpak
- DOEN gedachtengoed
- Klankborden
 - Samenwerking
 - Fase 1
 - Fase 2
 - Fase 3
 - Fase 4





Toelichting Scope Project Decode:

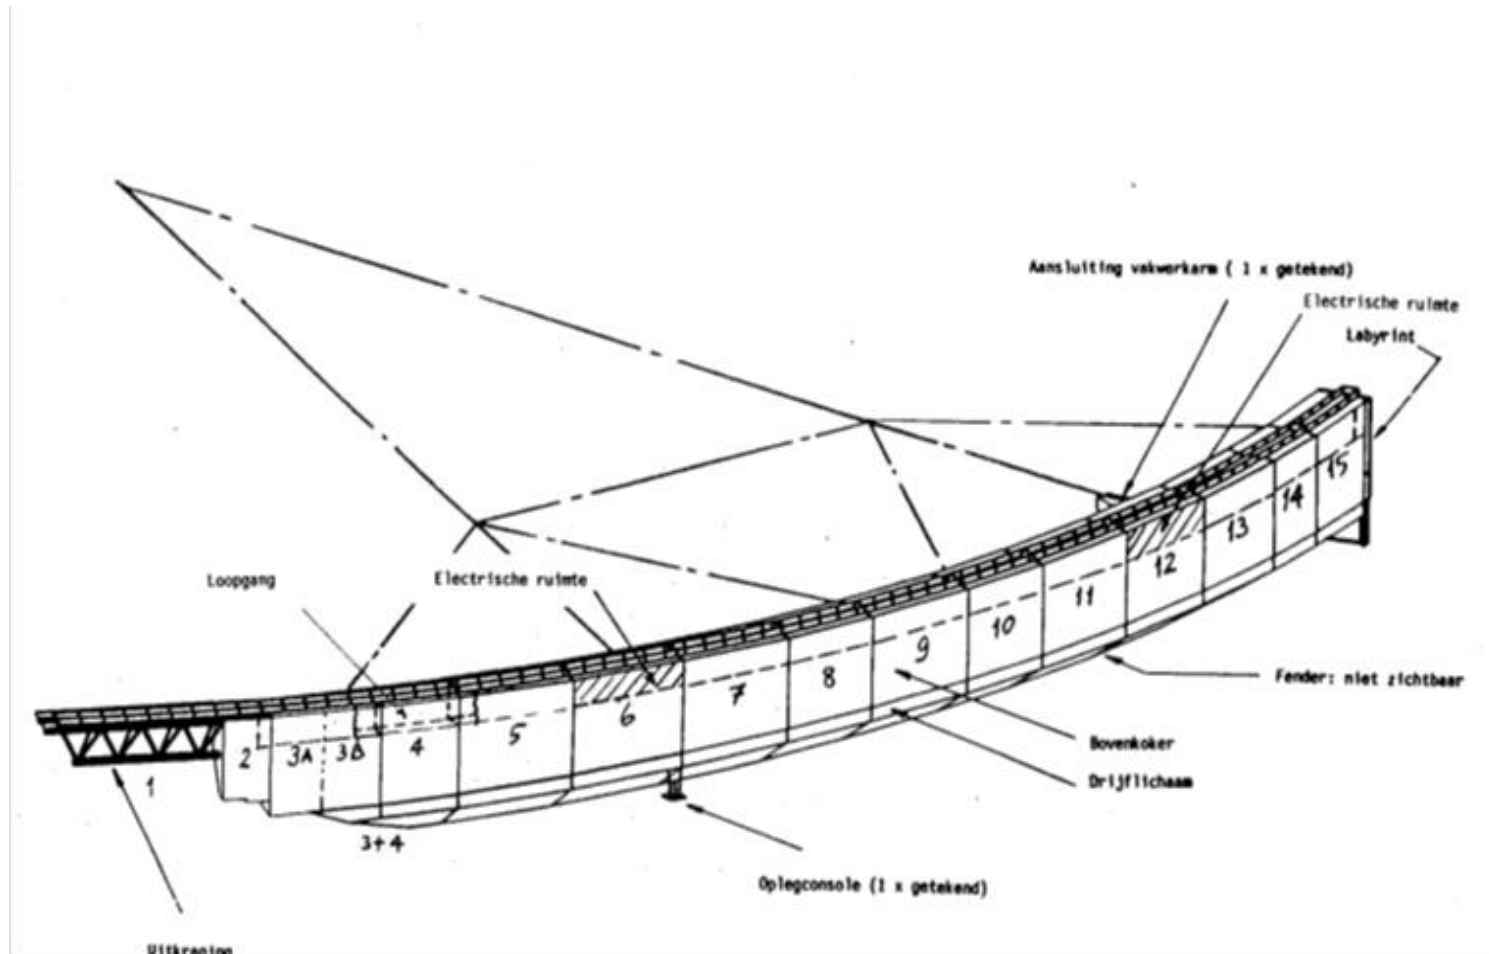



Toelichting Scope Project Decode:

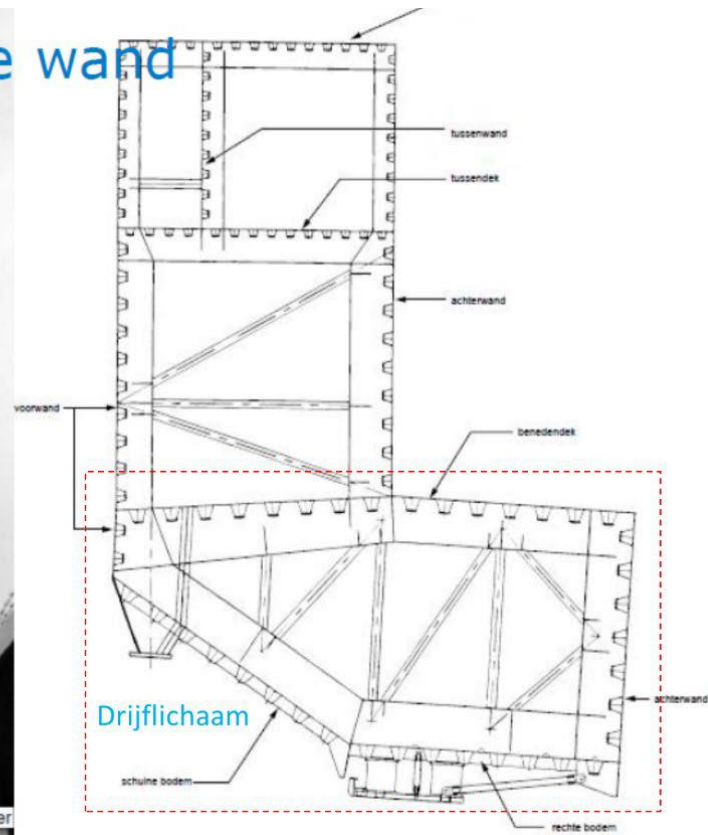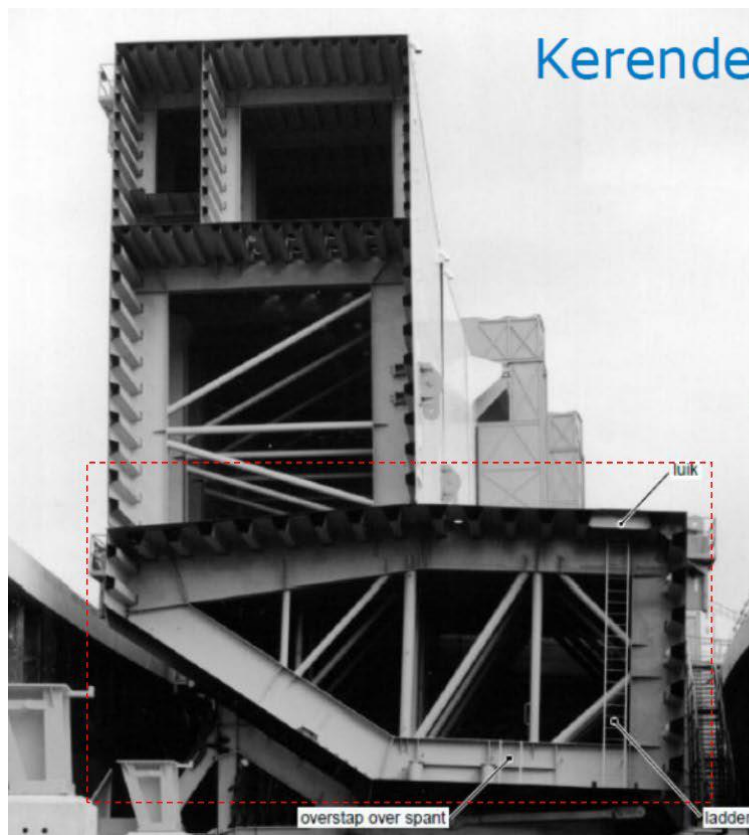



Beeld RWS van aanbestedingsproces

Start



Einde

Fase 1 Sept 2019 6-8 weken	Fase 2 3-5 weken	Fase 3 8-10 weken	Fase 4 Dec 2020
Van X naar 5	Van 5 naar 3	Van 3 naar 1	Contractvorming en prijsvorming in samenwerking
Geen prijs	Geen prijs	Prijs 5% meewegen	Pre award fase. Definitieve gunning aan het einde van deze fase



Fase 1 concept

- Start met Tender Start up (TSU)
- Selectiecriteria
 - Op dit moment overweegt Rijkswaterstaat PPO Keringen 1 de volgende criteria:
 - Projectmanagement in de bouwsector bij opdracht met omvang van € 3.000.000,- tot € 4.500.000,-.
 - Conserveringswerkzaamheden in de natte-infrastructuur
 - Installatietechniek in de natte-infrastructuur
- Visiedocument DOEN
 - RWS moet o.b.v. het document kunnen bepalen dat een gegadigde DOEN-gedachtengoed doorgrond, begrijpt en onderschrijft.



Fase 2 concept

- Start met TenderFollowUp (TFU)
 - Doel
 - Bespreken opzet fase 2
- Uitvoeren van assessment “samenwerking” door onafhankelijke partij



Fase 3

- Start met TenderFollowUp (TFU)
 - Doel
 - Bespreken opzet fase 3
- Dialooggesprekken
 - Doel
 - Producten fase 3



Producten Fase 3 concept

Gunnings - Criteria fase 3	Product	Belangrijke aandachtspunten voor de Opdrachtgever
In hoeverre leidt de voorgestelde aanpak Prijs tot een acceptabele prijs. Daarbij dient het onderdeel van : eerlijk geld voor eerlijk werk van het DOEN gedachte goed centraal te staan	Plan van aanpak Prijs	Mate van transparantie bij het tot stand komen van de prijs. Mate waarin het DOEN gedachtegoed wordt doorgevoerd in het inkoopproces. Mate waarin inzicht wordt verkregen over het proces van begroting tot werkelijke kosten. Risico Winst Mate waarin het gekozen tijdspad om tot een prijs te komen bijdraagt aan het DOEN gedachtegoed Overige



Producten Fase 3 concept

Gunnings - Criteria fase 3	Product	Belangrijke aandachtspunten voor de Opdrachtgever
In hoeverre doorgrondt en onderschrijft de inschrijver het DOEN gedachte goed	Uitwerking Visiedocument DOEN!	Maximale klantwaarde Leren Samenwerken in de keten Borging Overige



Producten Fase 3 concept

Gunnings - Criteria fase 3	Product	Belangrijke aandachtspunten voor de Opdrachtgever
In hoeverre leidt de voorgestelde aanpak fase 4 tot optimale invulling van het DOEN gedachtegoed	Plan van aanpak fase 4	Samenwerking: Hoe kom je tot goede samenwerkingsafspraken? Hoe borg je de samenwerkingsafspraken gedurende het project? Maximale klantwaarde: Wat betekent maximale klantwaarde? Hoe komt maximale klantwaarde tot stand? Fasering: welke structuur/fasering past het beste bij fase 4



Producten fase 3 concept

- Prijsvorming (telt mee voor 5%)



Fase 4 concept

- Start met een TFU
- Gezamenlijke invulling




Aandachtspunten

- Projectteamleden hebben meerdere contracten in voorbereiding/uitvoering
- Voorlopige vaste dagdelen voor project DeCoDe
 - 1 Maandag
 - 2 nader in te vullen
- Locatie: bij voorkeur keet MLK noord
- Idee: periodiek langere periodes (enkele dagen) continue samenwerking




Het DOEN-gedachtegoed

- Beproefde methode: Nijkerkerbrug
- Sluit aan bij de Marktvisie

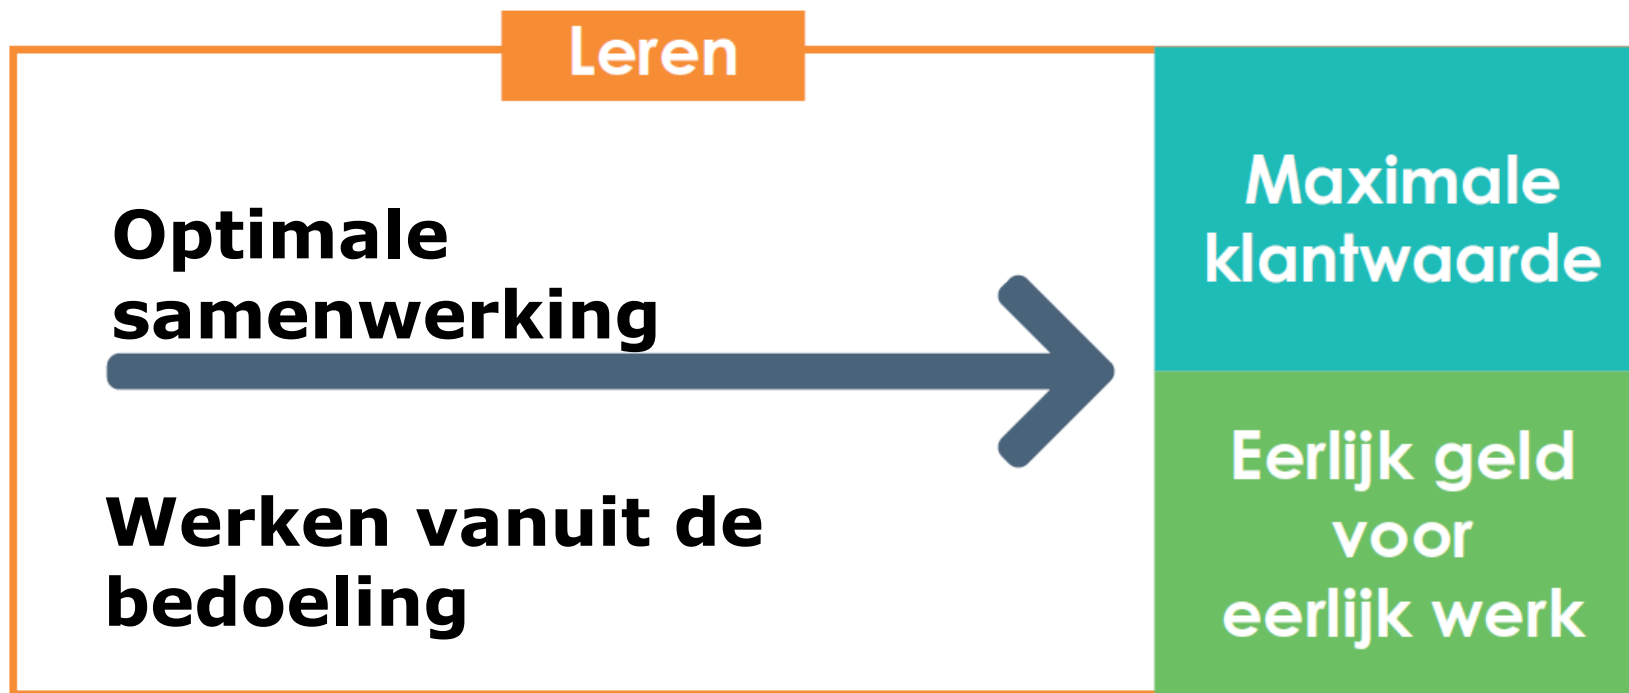

Maak samen de puzzel

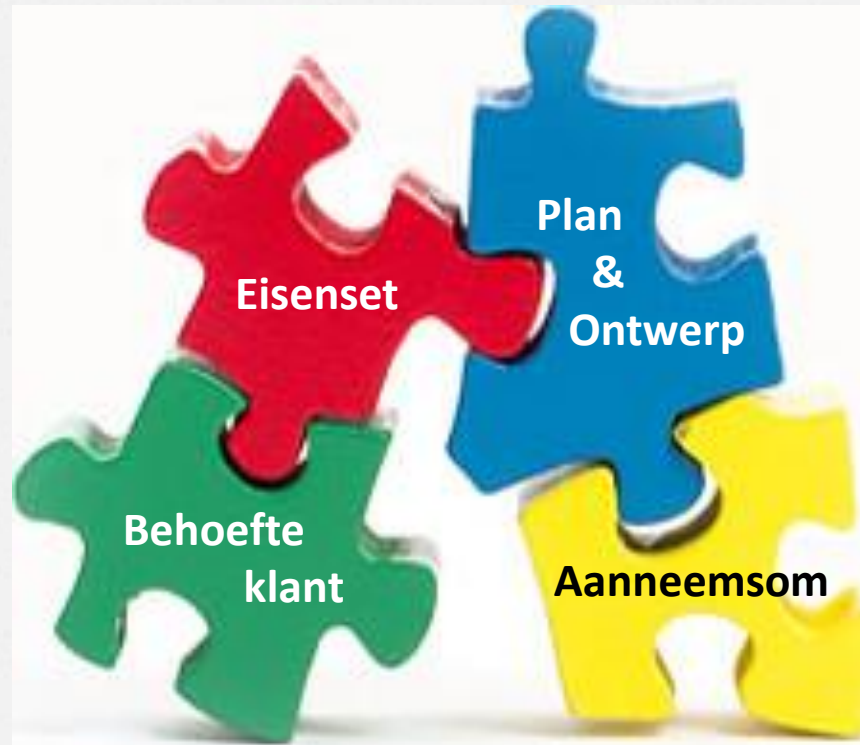

② Aanbesteding

Wat is de eerste
aankomst van
aanbesteding?
- hoe?

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Publiek P.p.

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

In aanbesteding

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

② Aanbesteding

Wat is de eerste
aankomst van
aanbesteding?
- hoe?

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Publiek P.p.

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

In aanbesteding

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar

Aanbesteding
- openbaar aanbesteding
- openbaar



Klankborden

- Fase 1
 - Selectie criteria
 - Visie document
- Fase 2
 - Assessment samenwerking
- Fase 3
 - Producten
 - Prijs
- Fase 4

