

MARKTCONSULTATIE

Waterschap NOORDERZIJLVEST



Organisatie ligt bij:

Hans Schuiling, Contractmanager

Dagvoorzitter:

Hans de Vries, Omgevingsmanager

dd. 8-5-2019



Uit de Cobouw van 7 mei 2019:

nieuws

Grote Bouw Enquête: 'Opdrachtgevers snappen niets van de bouw en willen altijd de laagste prijs'

bouwbreed 1287



Programma

8.45	uur	Ontvangst
9.00	uur	Opening
9.10	uur	Het project rwzi Westerkwartier
9.20	uur	Contract- en Aanbestedingsvisie
9.30	uur	Discussie, in twee rondes (2 x 25 min)
10.00	uur	tafelwissel
10.30	uur	Terugkoppeling
10.50	uur	Hoe gaan we hiermee verder
10.55	uur	Afronding / Sluiting

(door Fred Klein Woolthuis)

(door Klaas Vleems)

(door Hans Schuiling)




Projectdoel

Het doel van het project is het ontwerpen en realiseren van een toekomstbestendige afvalwatersysteem in het Groningse Westerkwartier voor de rwzi's Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken en de bijbehorende afvalwatertransportsystemen. Zodat de emissies van effluentlozingen door rwzi's op watersystemen gaan voldoen aan de normering volgens de Kader Richtlijn Water (KRW).






Aanwezig, aantallen per categorie noemen




Wie is van een: Leverancier van technologie



Wie is van een: Aannemingsbedrijf

Wie is van een: Adviesbureau

RWZI Westerkwartier

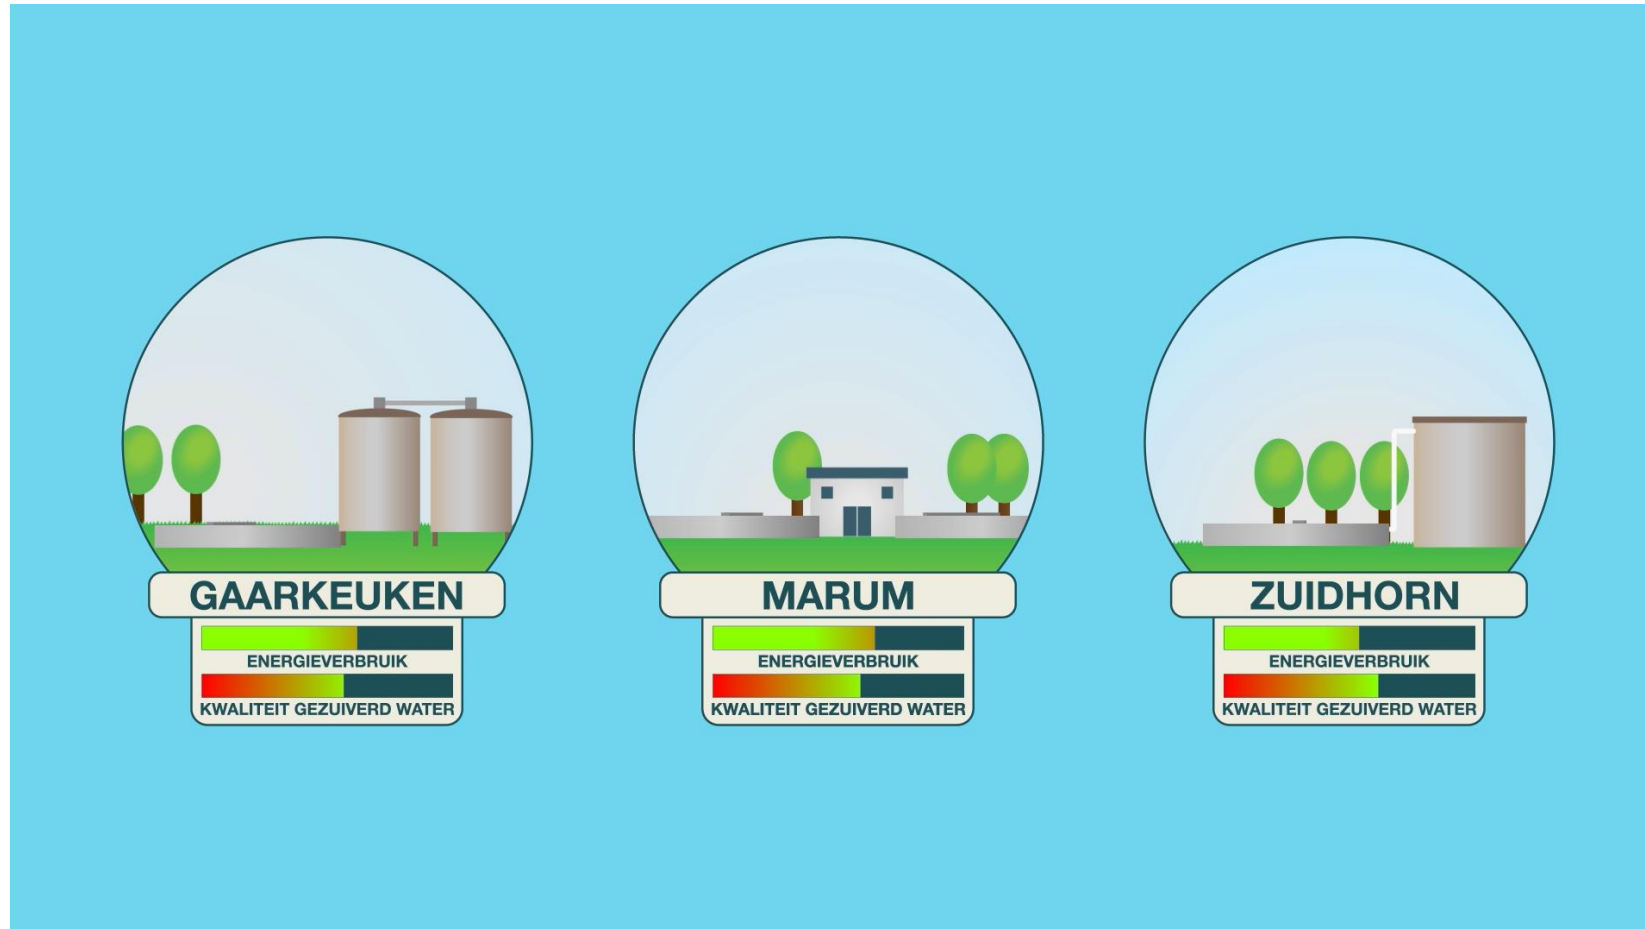


[filmpje](#)

Fred Klein Woolthuis, Manager Afvalwaterketen

IPM-team RWZI Westerkwartier

Klaas Vleems	Projectmanager
Hans Schuiling	Contractmanager
Jan Glazenburg	Manager Projectbeheersing
Hans de Vries	Omgevingsmanager
Daphne Jansen	Projectondersteuning
<vacature>	Technisch Manager

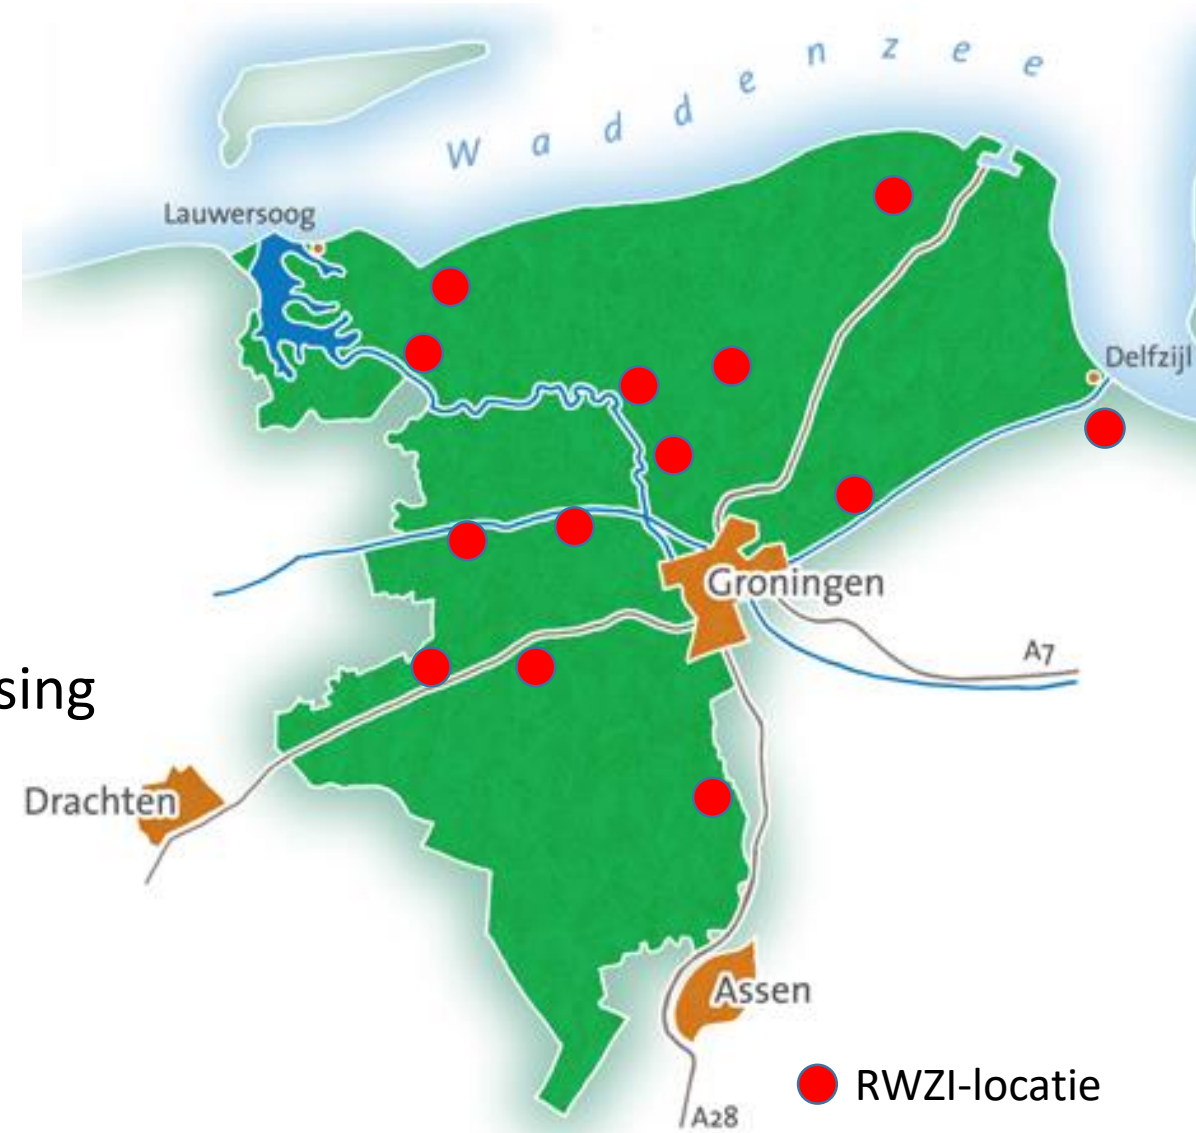



De 5 leidende principes van de Marktvisie

1

Mensenwerk: Human Factors

We kijken met trots en plezier naar de gezamenlijke opgave en dragen dat ook uit

2

Tenderen als fundament

De aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave

3

EMVI 2.0

De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen





De 5 leidende principes van de Marktvisie

4

Risico's

We kennen en erkennen elkaars belangen en risico's en handelen daar ook naar

5

Prijsvorming

De financiële totstandkomingen afwikkeling van de opgave is doelmatig, rendabel en financieerbaar voor alle betrokkenen







Situatie afvalwaterketen Westerkwartier

Situatie afvalwaterketen Westerkwartier

Bestaand

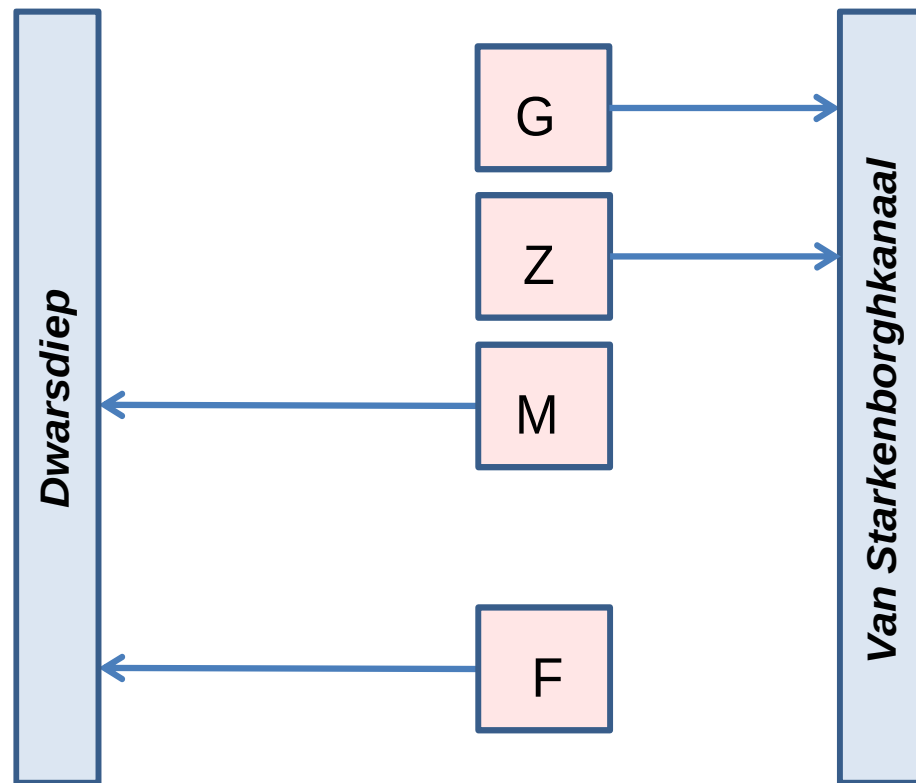


Nieuw

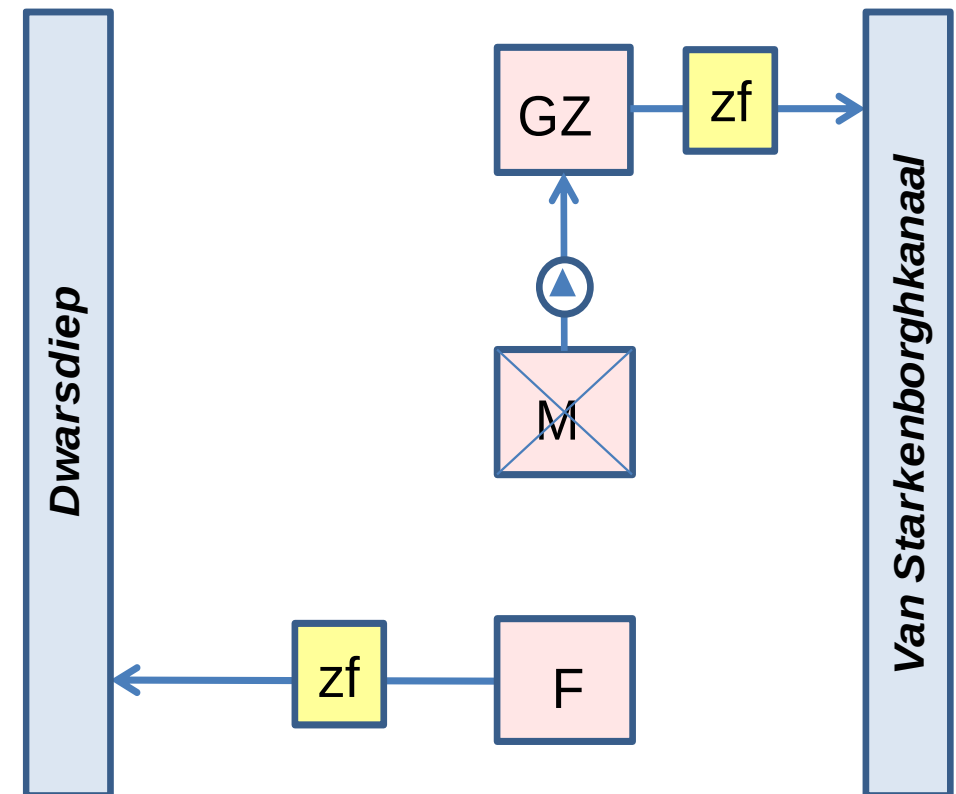




Decompositie

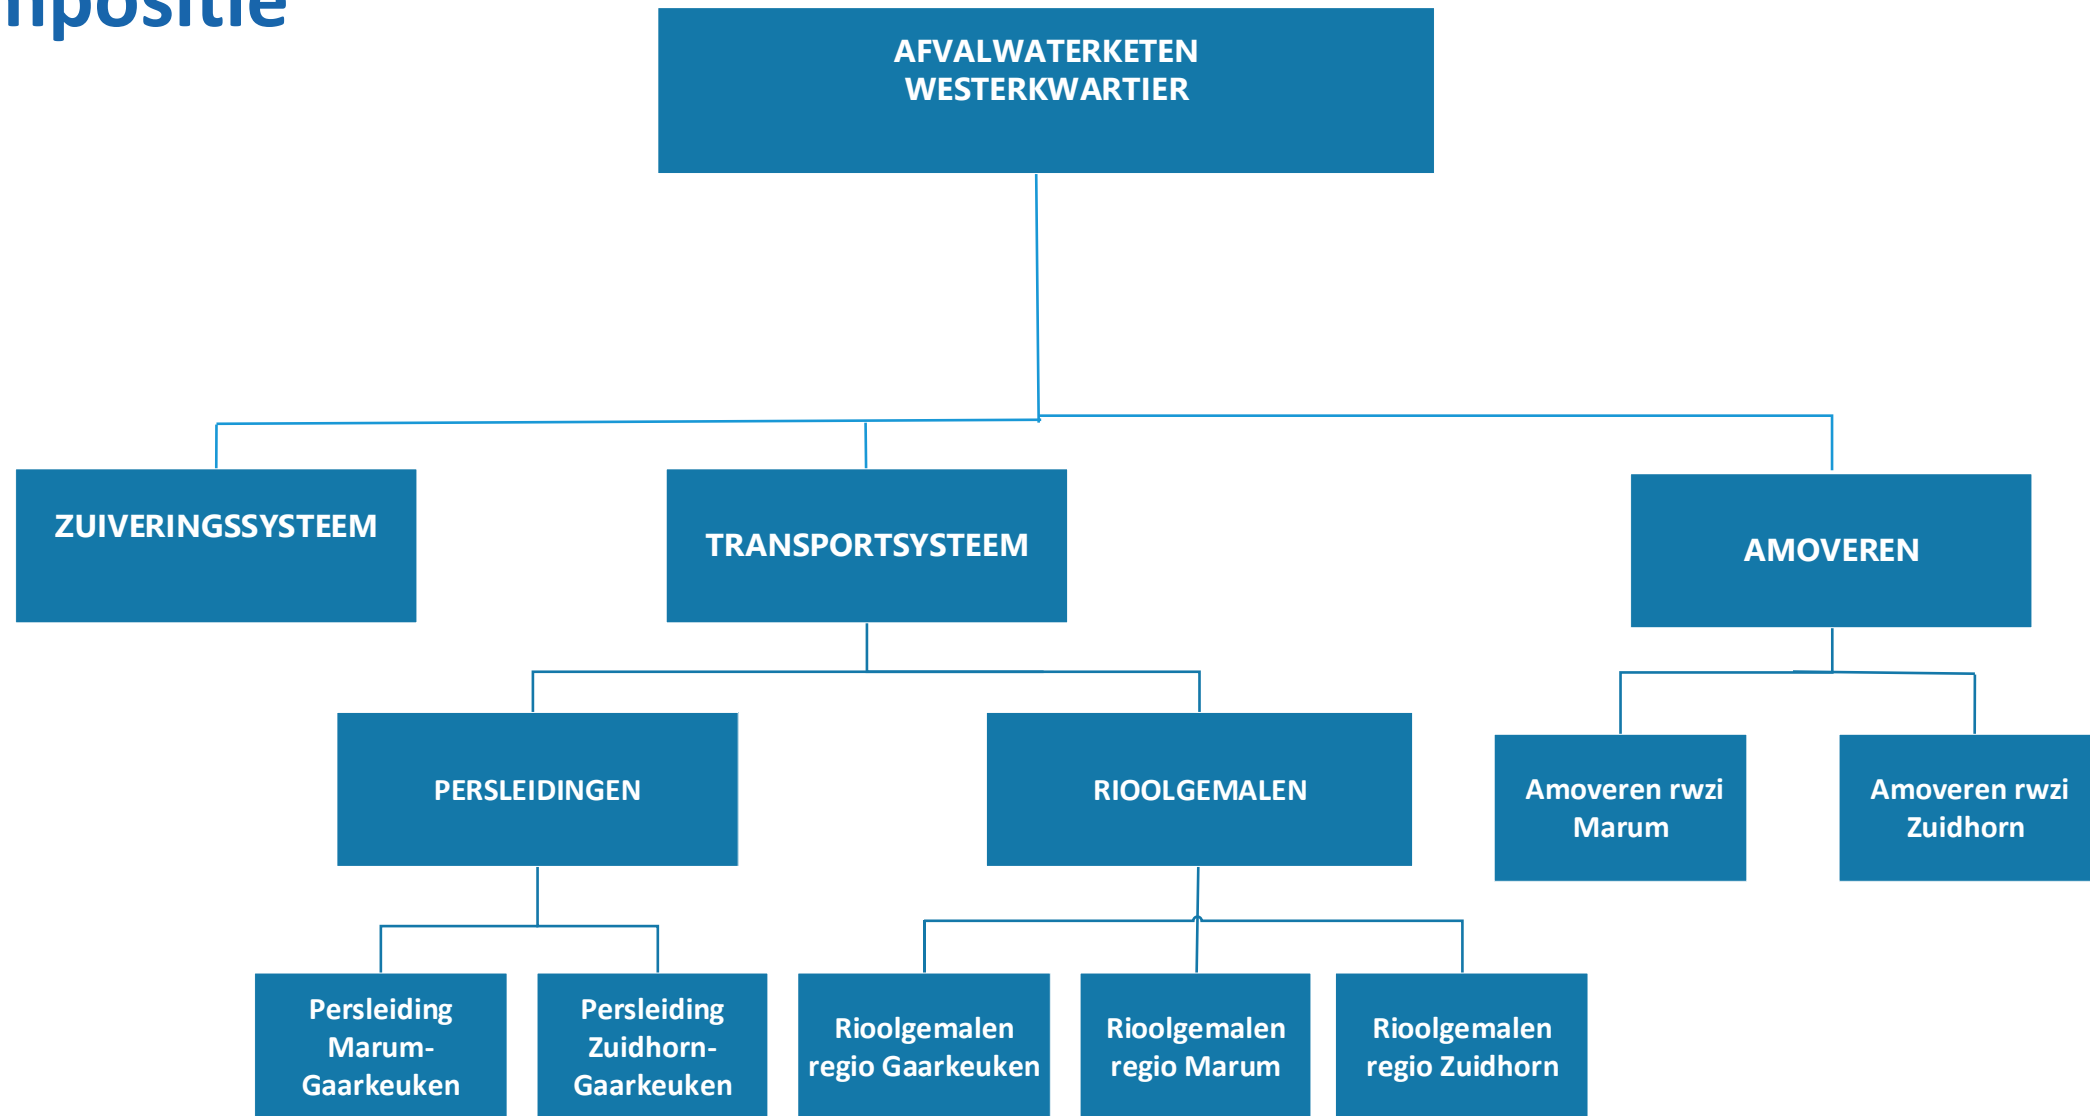



Decompositie

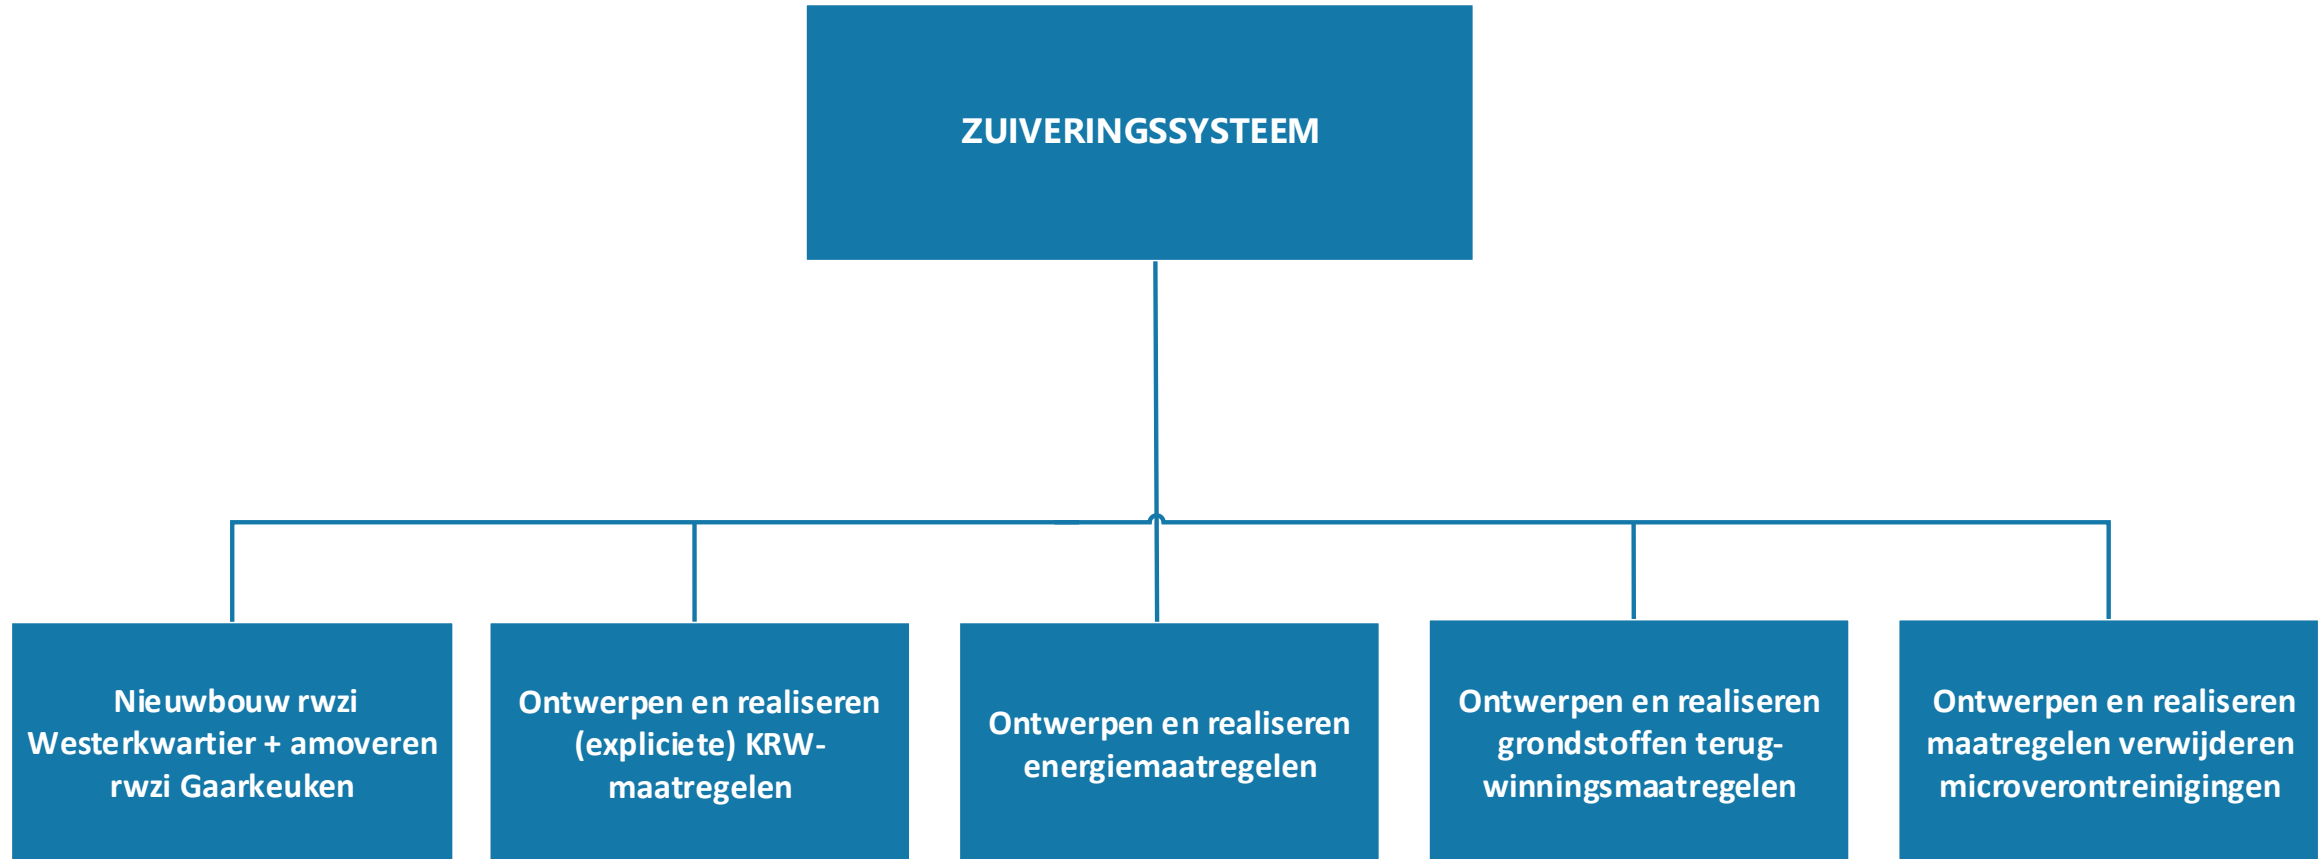



Contract- & aanbestedingsvisie

Contractvormen

Deelproject	RAW (UAV)	E&C (UAV-gc)	D&C (UAV-gc)	DB(F)M (UAV-gc)
Ontwerpen en realiseren nieuwbouw rwzi Westerkwartier (BBT-norm) en het amoveren rwzi Gaarkeuken			X	
Ontwerp en realiseren persleiding Marum-Gaarkeuken			X	
Ontwerp en realiseren persleiding Zuidhorn Gaarkeuken			X	
Ontwerp & realiseren nieuwbouw en renovatie rioolgemaal		X		

X = voorkeur waterschap



Contract- & aanbestedingsvisie

Samenwerkingsvormen

Deelproject	Bouw- team	Best Value	Alliantie	SCB	D&T
Ontwerpen en realiseren nieuwbouw rwzi Westerkwartier (BBT-norm) en het amoveren rwzi Gaarkeuken		X			
Ontwerp en realiseren persleiding Marum-Gaarkeuken		X			
Ontwerp en realiseren persleiding Zuidhorn Gaarkeuken		X			
Ontwerp & realiseren nieuwbouw en renovatie rioolgemaal		X			

X = voorkeur waterschap



Contract- & aanbestedingsvisie

Aanbestedingsvormen

Deelproject	MVO	Open- baar met BPKV	Niet open- baar met BPKV	Conc.ger. dialogoog
Ontwerpen en realiseren nieuwbouw rwzi Westerkwartier (BBT-norm) en het amoveren rwzi Gaarkeuken			X	
Ontwerp en realiseren persleiding Marum-Gaarkeuken			X	
Ontwerp en realiseren persleiding Zuidhorn Gaarkeuken			X	
Ontwerp & realiseren nieuwbouw en renovatie rioolgemalen			X	

X = voorkeur waterschap

Discussies, in 2 rondes





Stellingen, 2 per tafel

Ronde 1


- | | |
|------------|---|
| Stelling 1 | Het opknippen naar deelprojecten is de beste oplossing voor deze complexe opdracht. |
| Stelling 2 | De huidige planning is haalbaar en realistisch |

Ronde 2

- | | |
|------------|---|
| Stelling 1 | Welke samenwerkingsvorm leidt tot een maximaal projectdoel en projectresultaat en beheersing van risico's en kansen |
| Stelling 2 | Welke contractvorm past hier bij? |



Discussie, in 2 rondes

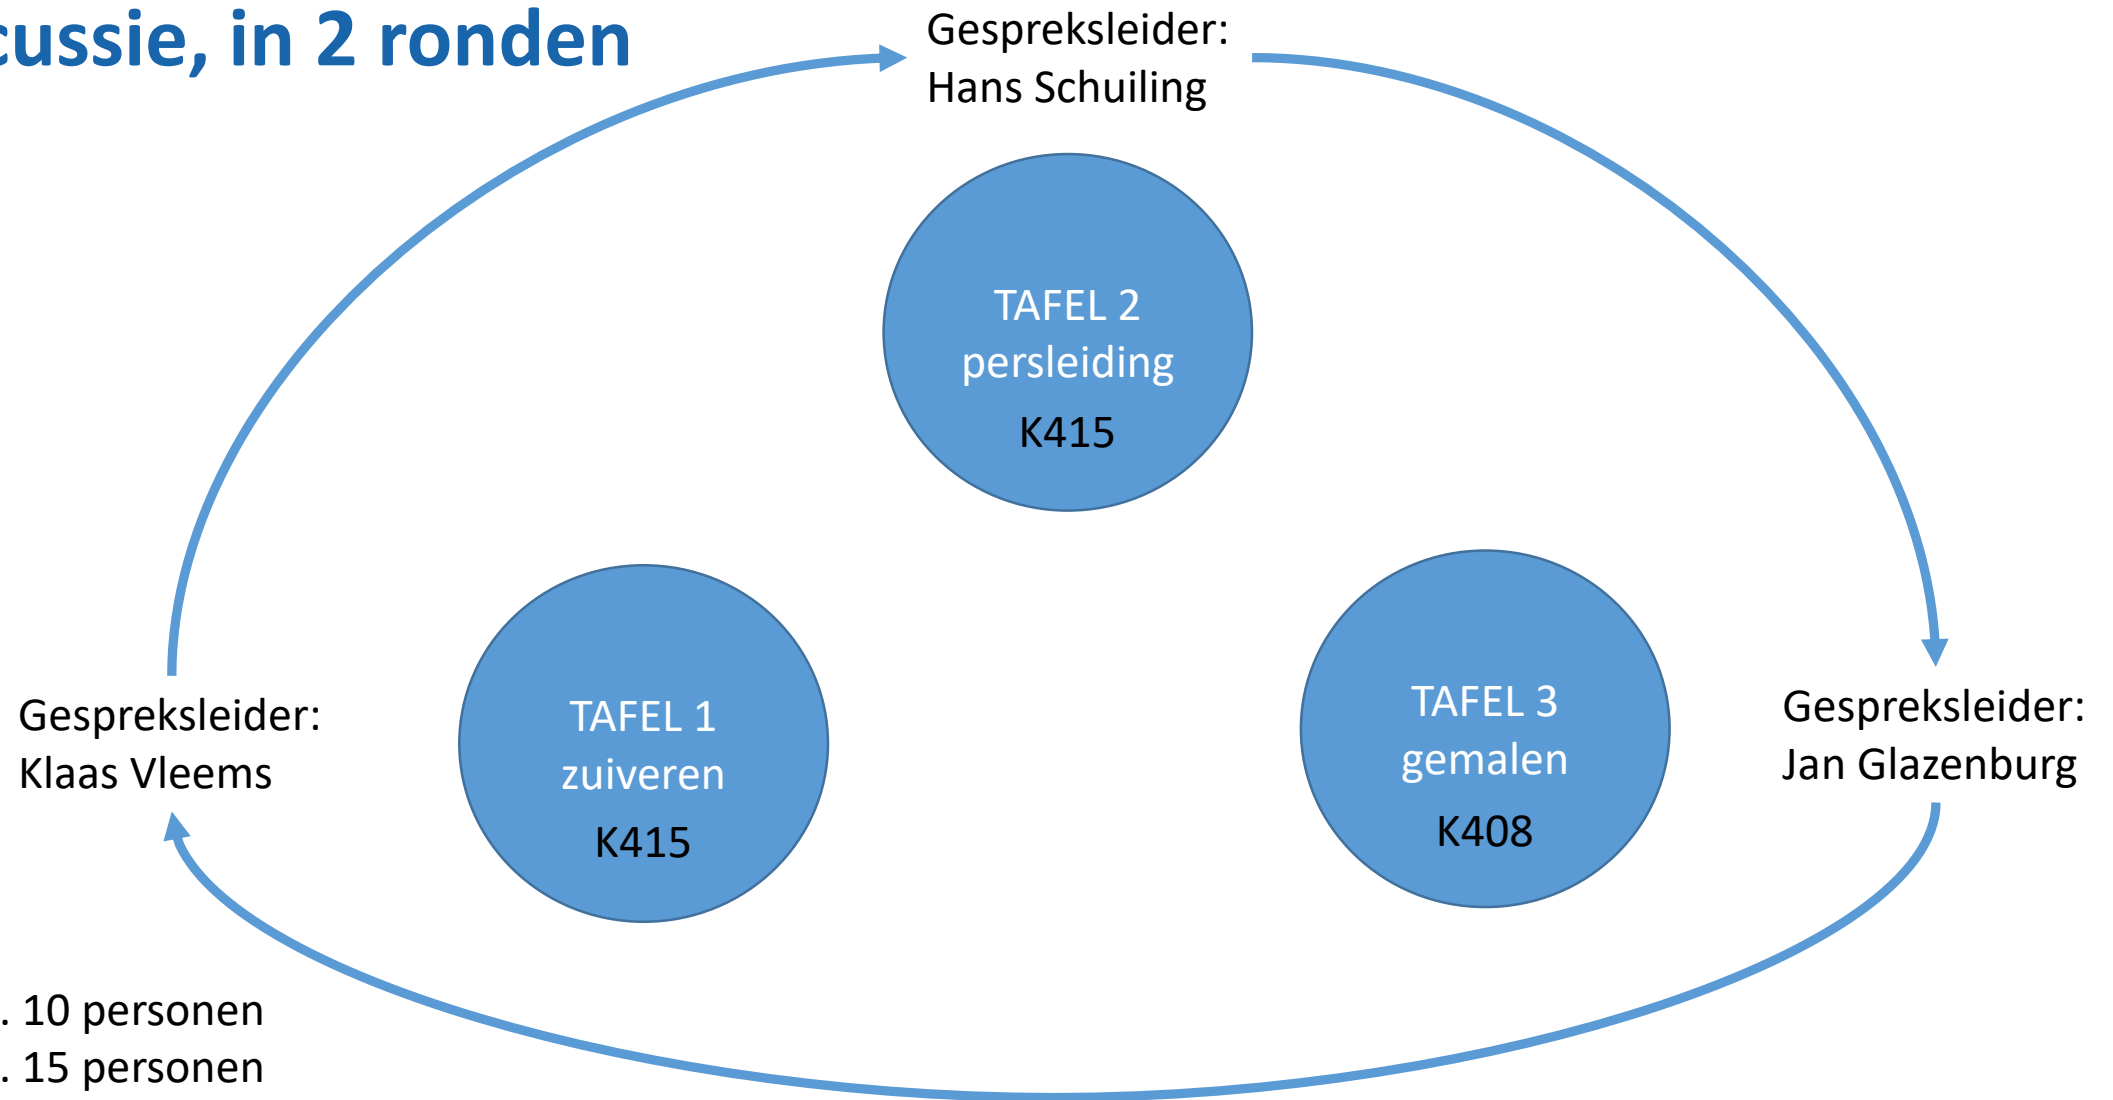

Terugkoppeling, per tafel



Hoe gaan we verder



Afronding



Sluiting





Meer informatie

Lees meer over het project op de website: www.noorderzijlvest.nl/rwziwesterkwartier

Contactpersonen

Hans Schuiling

Functie in het project: Contractmanager

T: 06-25158821

E: h.schuiling@noorderzijlvest.nl

Klaas Vleems

Functie in het project: Projectmanager

T: 06-20616354

E: k.vleems@noorderzijlvest.nl
