




PROVINCIE ■■ UTRECHT

INFORMATIEBIJEENKOMST REALISATIE NIEUWEGEIN CITY 14-12-2020

Provincie Utrecht
Mobiliteit-Trambedrijf

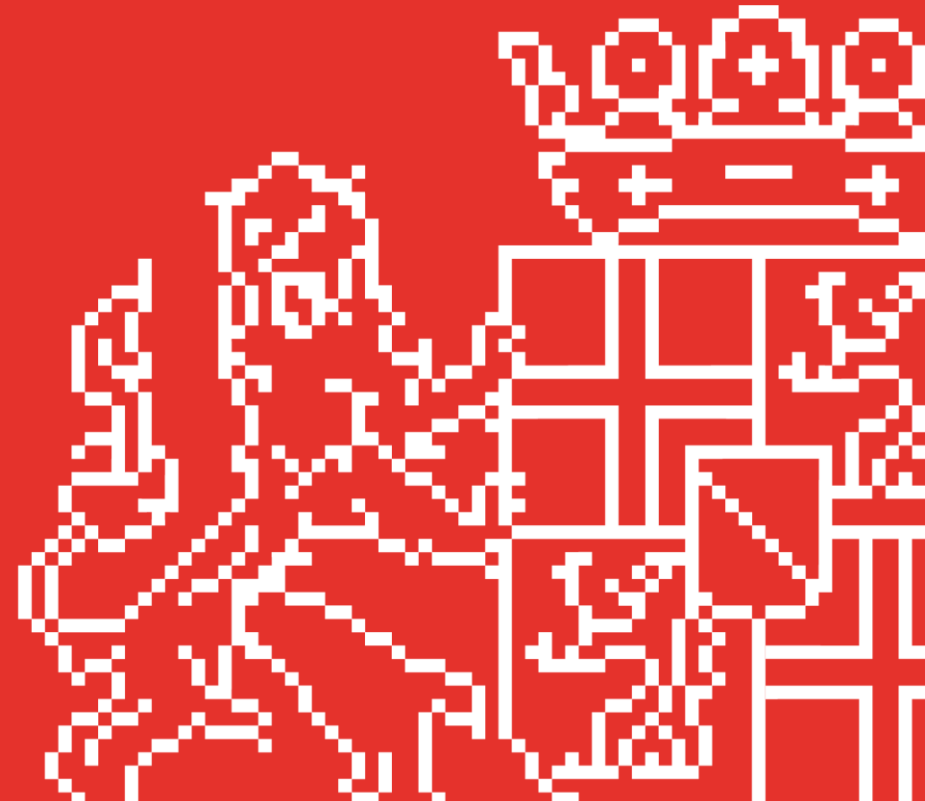



AGENDA

- Welkom en voorstellen
- Werkafspraken
- Projectteam PU
- Toelichting aanbesteding
- Toelichting project
- Toelichting contract
- Toelichting schouw
- Afsluiting/vragen



WELKOM EN VOORSTELLEN



WERKAFSPRAKEN

INFORMATIEBIJEENKOMST

- Gelieve microfoon tijdens presentatie uit te zetten.
- Gelieve mobiel tijdens presentatie uit te zetten.
- Na 45 minuten een onderbreking van 10 minuten.
- Presentatie wordt gedeeld via TenderNed, er wordt geen verslag opgesteld.
- Bij vragen handje opsteken of aan einde stellen.
- Vragen die worden gesteld ook via de Nota indienen, indien dit noodzakelijk is voor formele beantwoording.



PROJECTTEAM PU

- Projectmanager: Felix Paleari
- Technisch manager: Herman Treurniet
- Manager projectbeheersing: Kyra Wouters
- Omgevingsmanager: Silvia Burger
- Contractmanager: Jorick Straatman
- Safety manager: vacant
- Inkoopadviseur: Louis Pothof
- Ingenieursbureau back-office: RHDHV



AANBESTEDING

- Inkoopstrategie
- Publicatie op TenderNed
- EMVI-criteria
- Aanbestedingsplanning
- Corona



EMVI-CRITERIA

Gunningscriterium	Doelstelling	Maximale kwaliteitswaarde (€)
K1. Integrale planning	K1.1 Beheersing van de planning	400.000
	K1.2 Kortere buitendienststelling	400.000
K2. Visie op samenwerking met OG en Nevenopdrachtnemers	Visie van Opdrachtnemer op samenwerking met Opdrachtgever en op welke wijze Opdrachtnemer de coördinatieverplichting gaat invullen richting de directieleveranties (Nevenopdrachtnemers).	800.000
K3. Management van BLVC en beperken omgevingshinder	Het managen van BLVC en het minimaliseren van de hinderbeleving van de omgeving waaronder gebruikers van de aanpalende gebouwen, weggebruikers, voetgangers, openbaar vervoerreizigers en andere belanghebbenden.	800.000
K4. Risicobeheersing	Inventariseren van de vijf belangrijkste “externe” risico's en het verkrijgen van effectieve en efficiënte beheersmaatregelen.	600.000
K5. Interview	Mate waarin de geïnterviewde sleutelpersonen duidelijk hebben kunnen maken dat zij de Opdracht (de uitvoering van de Opdracht) en de Inschrijving goed hebben doorgrond en in staat zijn de Opdracht te allen tijde binnen zijn/haar functie goed kunnen managen.	500.000
	TOTAAL	3.500.000



Fase	Activiteit	Periode/datum/tijdstip
Uitnodigingsfase	Gepubliceerd op TenderNed	2 december 2020
Inschrijvingsfase	Informatiebijeenkomst en schouw	14 december 2020 van 10:00 t/m 14:00 uur
	Gelegenheid tot stellen van schriftelijke vragen	11 januari voor 2021 13.00u
	Verzending 1 ^{ste} Nota van Inlichtingen	20 januari 2021
	Gelegenheid tot stellen van schriftelijke vragen	27 januari 2021
	Verzending 2 ^{de} Nota van Inlichtingen	2 februari 2021
	Gelegenheid tot stellen van (individuele) vragen	5 februari 2021 voor 13.00u
	Verzending 3 ^{de} Nota van Inlichtingen	9 februari 2021
	Indiening Inschrijvingen	22 februari 2021 voor 9:00 uur
Beoordelingsfase	Beoordeling Plan van Aanpak	23 februari t/m 12 maart 2021
	Interview	22 maart 2021
	Interview (optioneel)	23 maart 2021
	Vaststelling Proces-verbaal van aanbesteding	26 maart 2021
Gunningsfase	Mededeling Gunningsbeslissing	26 maart 2021
	Definitieve gunning	16 april 2021
Uitvoeringsfase	Ingangsdatum Overeenkomst	19 april 2021

CORONA

- Tot moment van inschrijving.
- Tussen ontvangst inschrijving en gunning.
- Na gunning



TOELICHTING PROJECT

- Project van provincie Utrecht – afdeling Mobiliteit
- Project VRT
- Toelichting projectscope



PROVINCIE UTRECHT – AFDELING MOBILITEIT

- Doel: Verbetering bereikbaarheid
- Uitbreiding: bijvoorbeeld Uithoflijn
- Verbetering: programma VRT
- Toekomst: Verdere Uitbreiding & Verdichting

PROJECT VRT



- Reeds gedaan:
 - Opstelsporen
- 2020:
 - Aanpassing Sunij
 - Extra CAFs
- 2022:
 - Nieuwegein Centrum
- Op de planning:
 - Koppeling SUNIJ en UHL



UITVOERING 2020


- **SUNIJ**
 - Overall haltes verlengd en verlaagd
 - Tracédelen ten zuiden van Nieuwegein Centrum:
 - Gehele baan en bovenleiding vernieuwd
- **CAF**
 - Aanschaf 41-meter tramvoertuigen
 - Gekoppeld met 33 totaal 75 meter
- Actuele stand: Proefbedrijf



TOELICHTING PROJECTSCOPE

- **Achtergrond**
 - Verlegging halte (i.v.m. rechtstand) en gemeente wil centrum herontwikkelen.
- **Samenwerkingsovereenkomst (SOK)** gesloten tussen provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein.
- **Opdrachtgever** van deze aanbesteding is de provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein is een stakeholder.

CENTRUMGEBIED & ONTWIKKELING

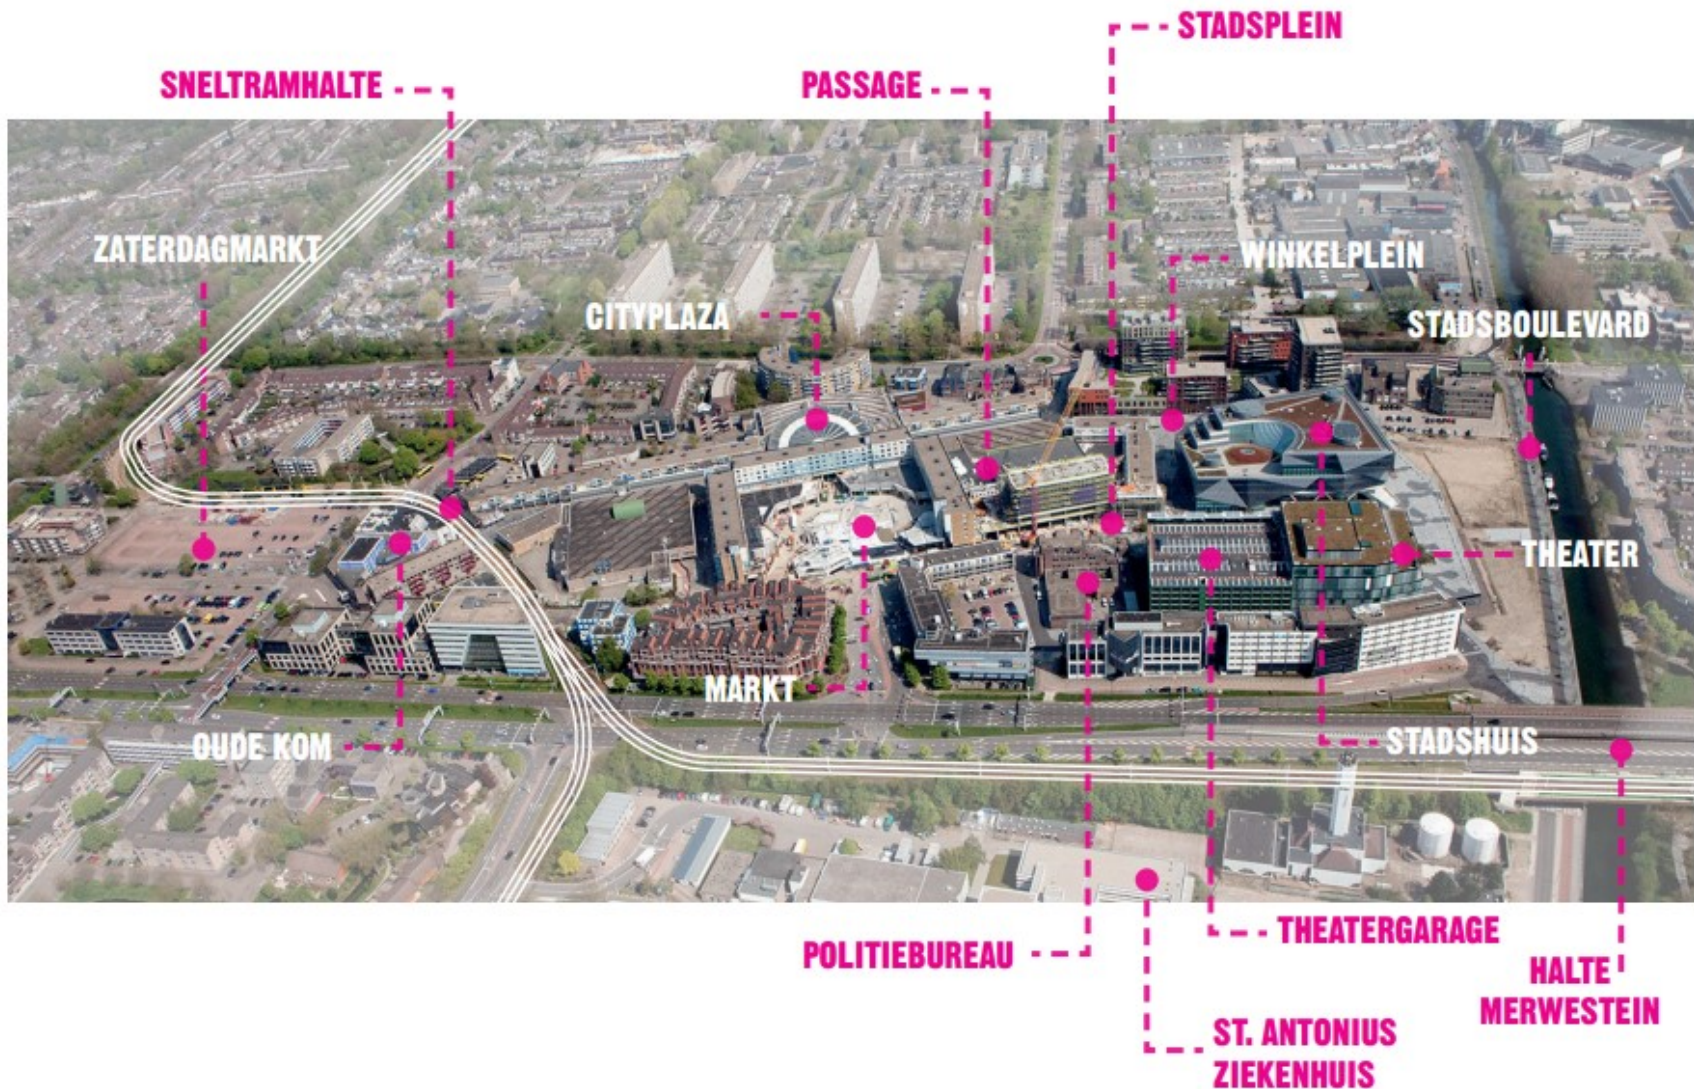



FILMPJE



OVERZICHTSTEKENING

- Zie D_00169 - BH1423-DR-BS-3237
Overzichtstekening Nieuwegein
Stadscentrum d1.0.



HALTETEKENING

- Zie D_00167 - BH1423-DR-ST-5022 -
Halteontwerp Nieuwgein Stadscentrum
d1.0.



TOELICHTING CONTRACT

- Engineering & Construct (E&C) op basis van UAV-GC 2005.
- Contract bestaat uit:
 - Basisovereenkomst
 - VS0 - Algemeen
 - VS1 - Technische Eisen (incl. bijlagen)
 - VS2 - Proceseisen
 - Annexen



CONTRACTUELE MIJLPALEN

- Ingangsdatum Overeenkomst: 19 april 2021;
- Indienen Definitief Ontwerp (DO): twaalf weken na opdrachtverlening;
- Indienen safety case Uitvoeringsontwerp (UO): 3 december 2021;
- Start buitendienststelling: 26 februari 2022;
- Testbedrijf afgerond: 8 april 2022;
- Opleverdossier 1: 15 april 2022;
- Start Proefbedrijf: 25 april 2022;
- Opleverdossier 2: 27 mei 2022;
- Aanvaarding Werk: 1 juli 2022.



TOELICHTING SCHOUW

- 13.00u verzamelen bij de parkeerplaats aan de Spoorstede (perron tijdelijke halte) → navigeren naar Hagestede.
- We zijn met een groep, dus mondkapjes op en afstand bewaren.
- Op de trambaan wordt Proefbedrijf gereden:
 - Geen PBM's dragen.
- Telefoonnummer Jorick Straatman:
 - 06-46994738.



AFSLUITING/VRAGEN
