

Toelichtingbijeenkomst

Project N270.16 Deurne – Limburgse grens

Provincie Noord-Brabant

21 juni 2021


Agenda

- Introductie
- Organisatie
- Toelichting project N270.16
- Procedure
- Afsluiting

Spelregels


- Vragen digitaal indienen
- Alleen papier is rechtsgeldig
- Geen verslag wel de presentatie
- Vragen aub na afloop van de presentatie

Projectorganisatie Provincie

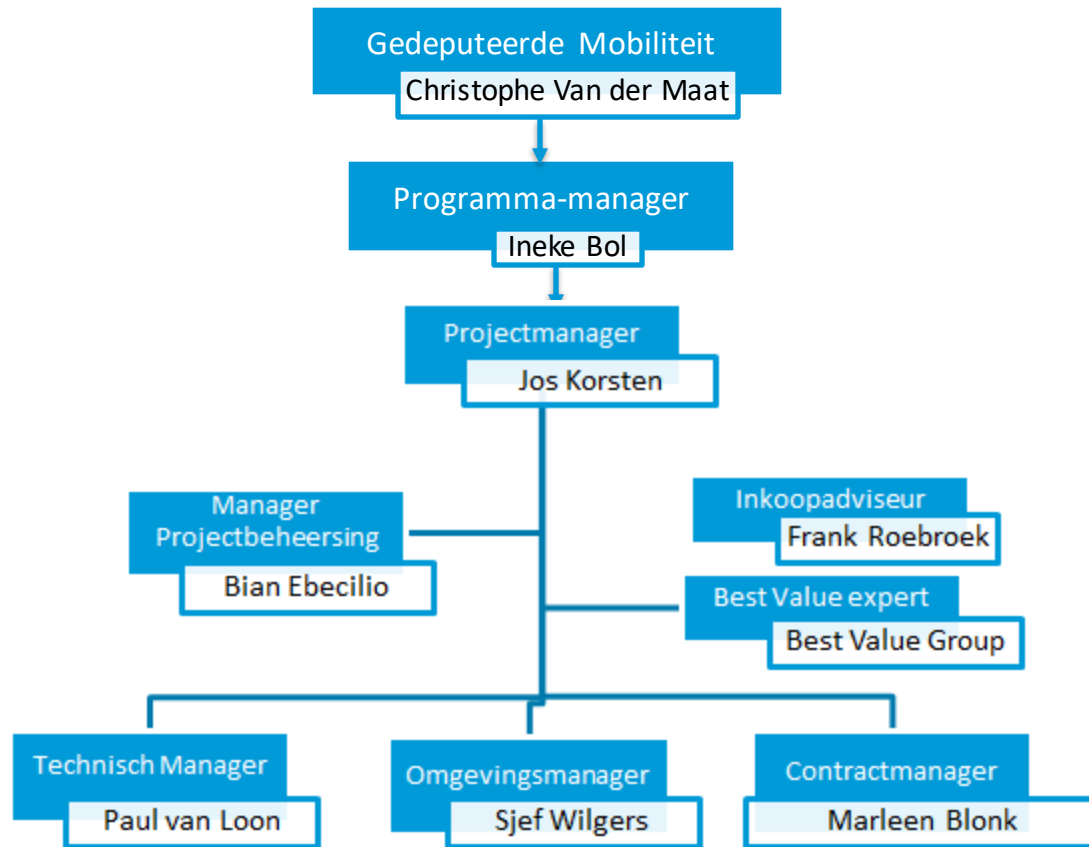

Project

- Historie van het project
- Bestaande situatie
- Doelstellingen
- Gewenste situatie (en ontwerpvrijheid)
- Aandachtspunten



Historie van het project

Aanleiding project, onder meer:

- Verkeersonveiligheid door hoge aantallen zijwegen, erfaansluitingen en slecht zicht (bochten en bomen)
- Onderhoud aan de weg
- EHK ontbreken
- Geluidshinder voor aanwonenden
- Landbouwverkeer op de hoofdrijbaan

Bestemmingsplan 2016-2018


Beroepen RvSt maart 2021

Doelstellingen


De doelstellingen van het project zijn (verkort):

- Maximaliseren verkeersveiligheid N270, parallelwegen en fietspaden
- Minimaliseren omgevingshinder
- Minimaliseren CO2-footprint
- Behouden en waar mogelijk vergroten draagvlak omgeving

Gewenste situatie

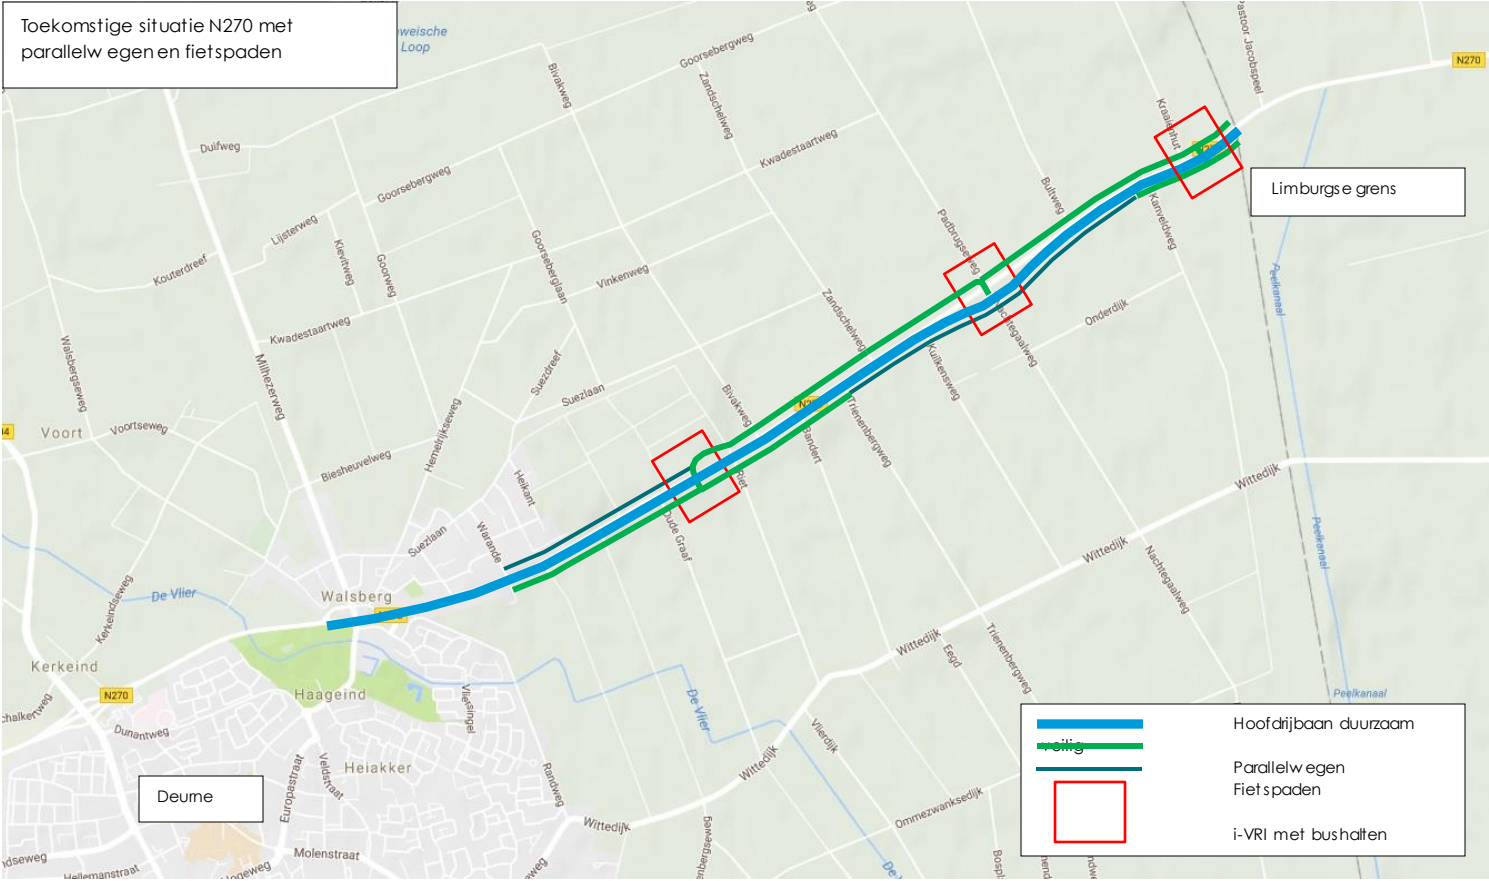


Gewenste situatie – DV-profiel provincie

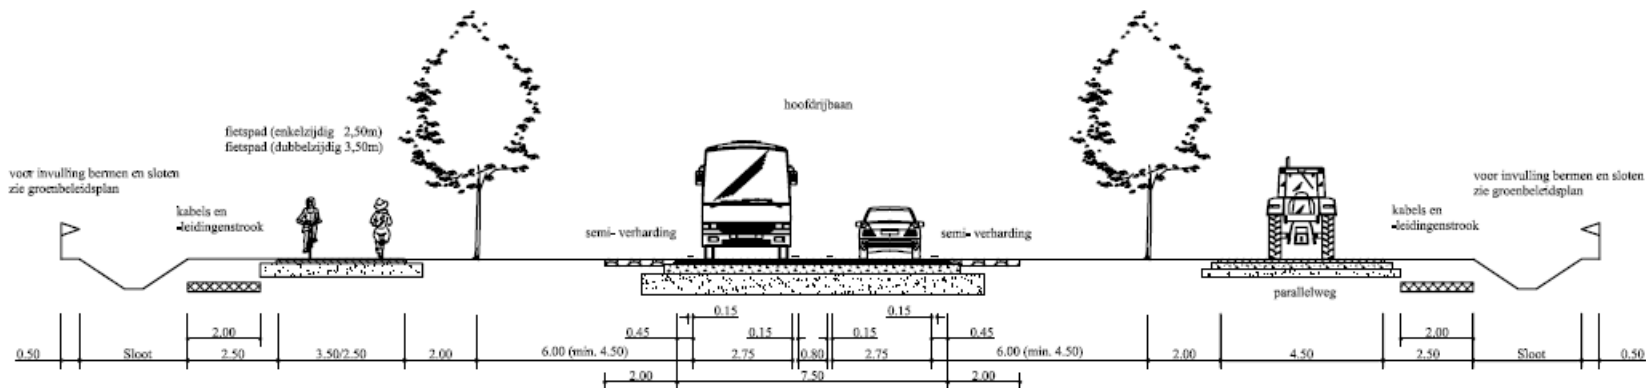



GEBIEDSONTSLUITINGSWEG
schaal 1:200

**Gewenste Duurzaam Veilig
profiel is niet haalbaar**


Gewenste situatie – N270 profiel A

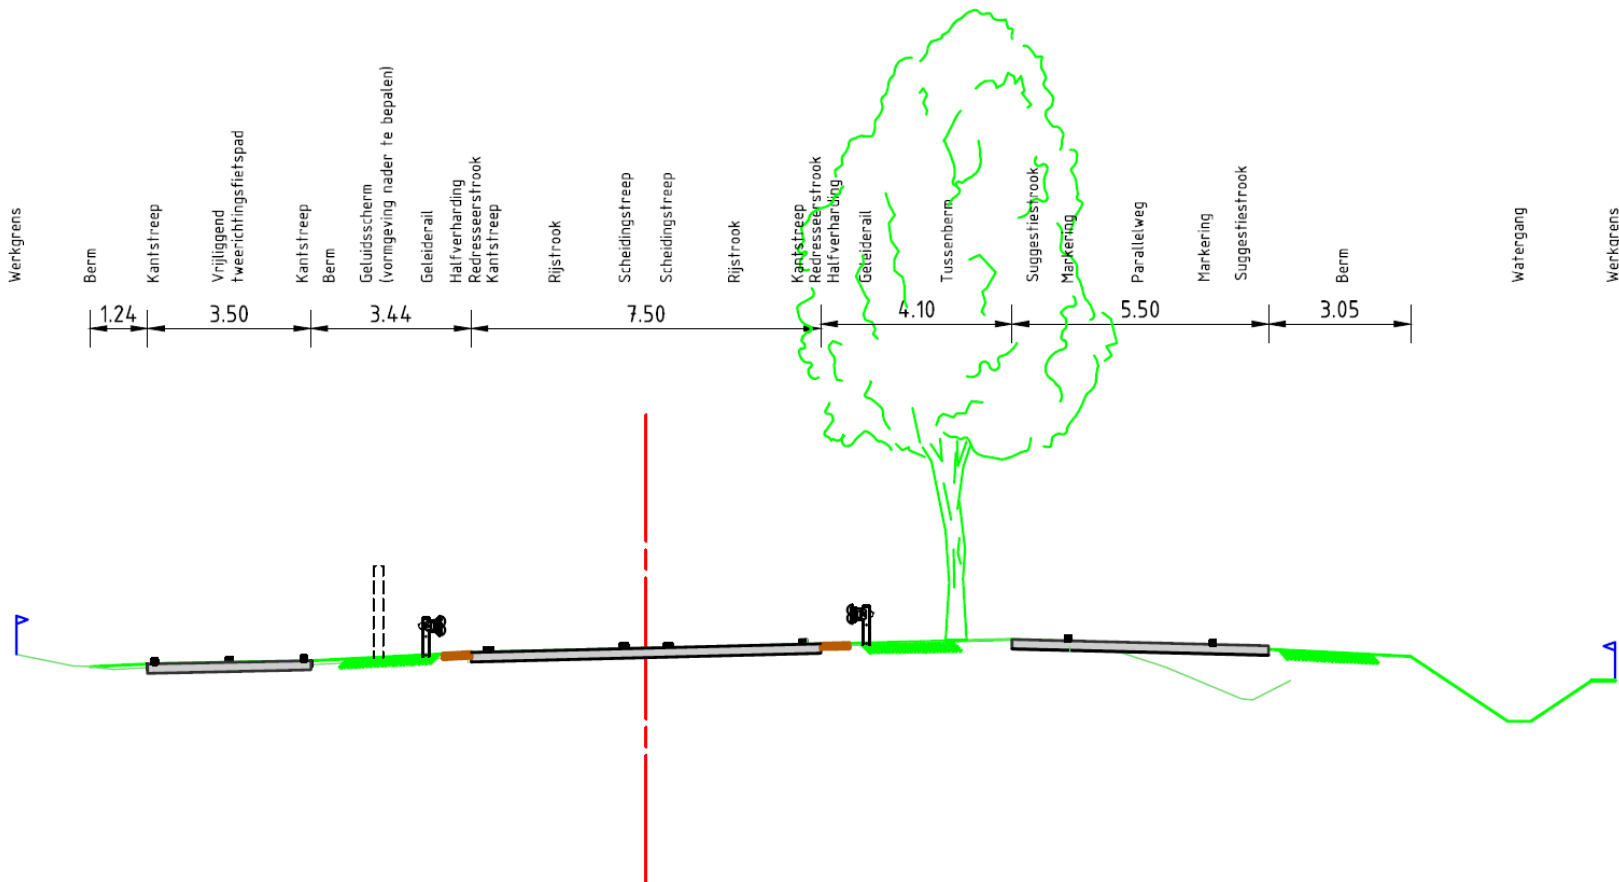

Gewenste situatie – N270 profiel C

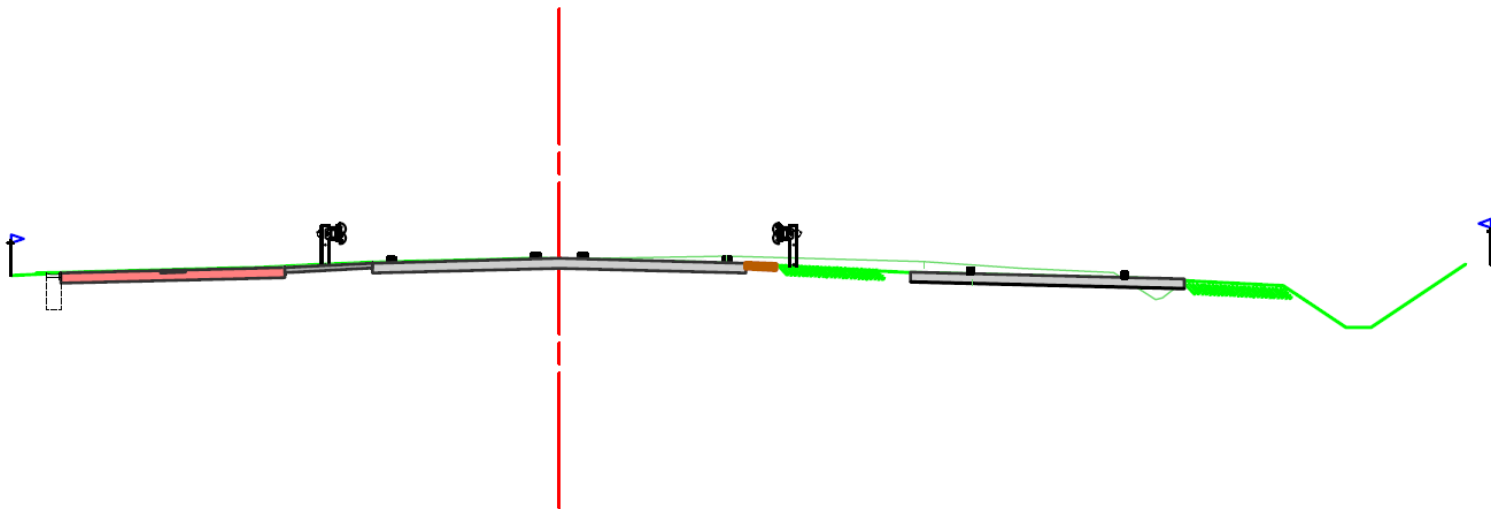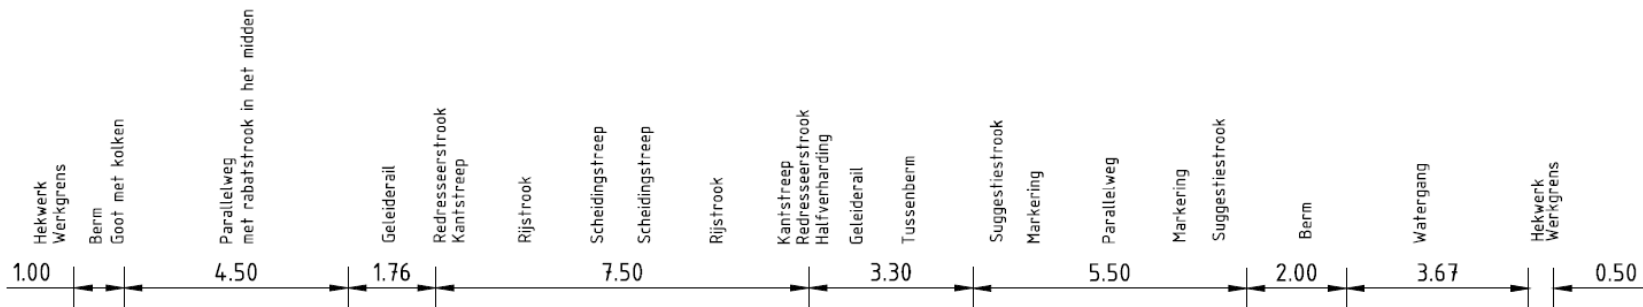

Gewenste situatie – N270 profiel F

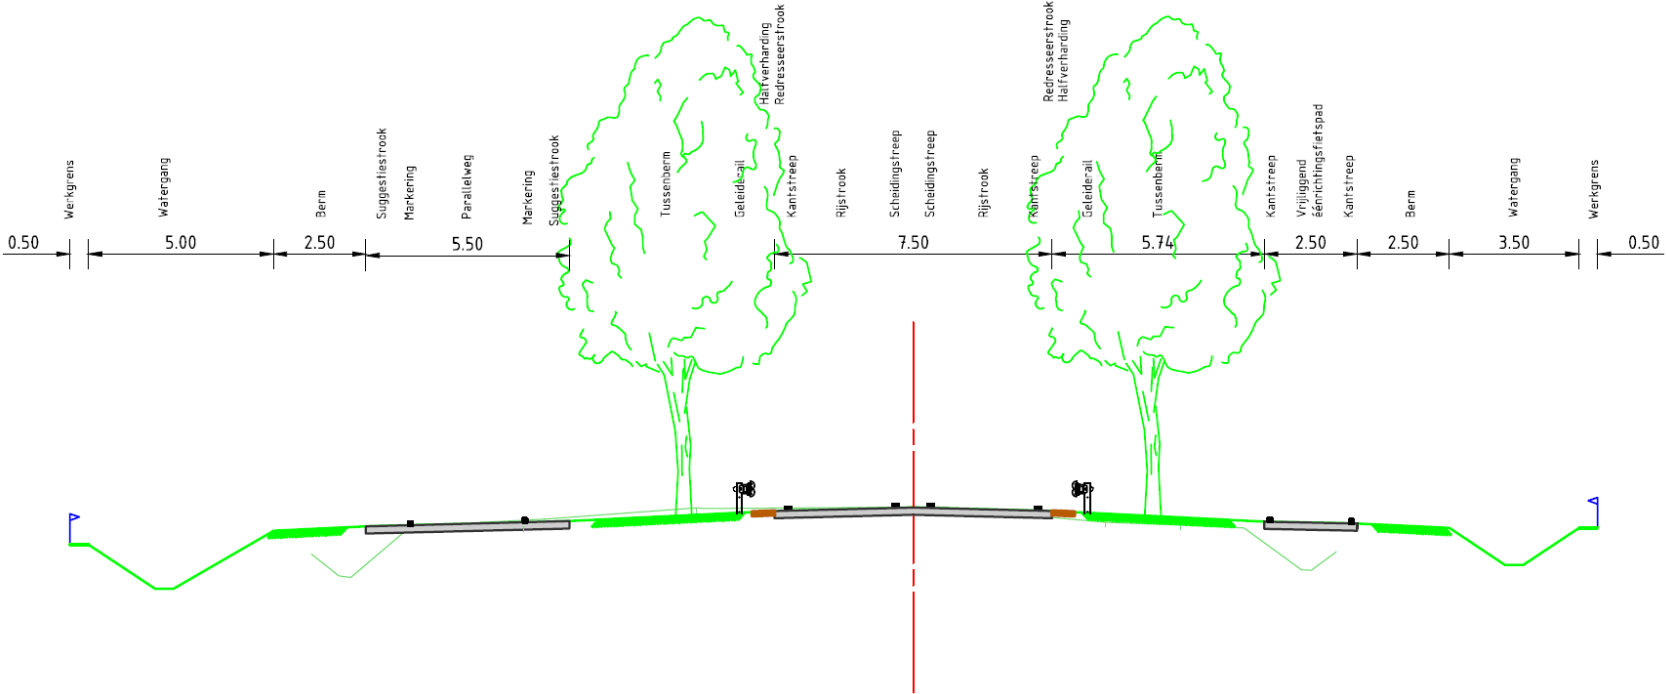

Gewenste situatie – ontwerpvrijheden

De ontwerpvrijheden in het project zijn onder meer:

- Materialisatie
- Fasering uitvoering
- Vormgeving geluidschermen
- Invulling watercompensatie
- Aanvullende voorzieningen leefbaarheid
- Vormgeving particuliere inritten
- Ontwerp bushaltes

Waar **niet** van afgeweken mag worden:

- Geometrie N270
- Vormgeving en inrichting parallelwegen

Aandachtspunten


De volgende aandachtspunten zijn van belang:

- Verleggingen kabels en leidingen door beheerders
- Grondverwerving en onteigening
- Planning \ fasering
- Stikstofdepositie

Toelichting Omgevingsmanagement

Belangrijkste facetten:

- Bestemmingsplan onherroepelijk.
- Grondverwerving.
- Toekomstig beheer bij provincie en gemeente.
- Detailontwerp o.a. geluidschermen en inritten in afstemming met aanwonenden.



Toelichting OM - grondverwerving

- Nog 8 percelen geen eigendom. (grondplannr. 31, 34, 38, 57, 64, 65, 82 en 83, zie annex XIII, bijlage B0402)
- Onteigeningsprocedure voor 7 hiervan:
 - Koninklijk besluit (KB) verwacht - juli 21;
 - Minnelijke verwerving – tm okt 21;
 - Gerechtelijke procedure – tm okt 22
- Voor niet verworven percelen tijdelijke inrichting maken of anderszins. - [kaart tonen]
- Voor verworven percelen een aantal specifieke afspraken. Zie verplichtingenoverzicht.

Toelichting OM – Toekomstig beheer

Afspraak is gemaakt volgens het principe:

Provincie:

- Hoofdrijbaan tot 1 m van parallelweg.
- Fietspaden (incl. berm en watergang)
- iVRI's.
- Geluidsscherm.

Bij gemeente:

- Parallelweg (incl. berm en watergang).

Toelichting OM – Detailontwerp (1/2)

- Geluidsschermen:
 - Samen met aanwonenden richting bepaald.
 - Resultaat zie rapport IPV Delft.
 - Ook samen met aanwonenden uitwerken.



- Inritten
 - Samen met aanwonenden vormgeven.

Best Value Aanpak (1/2)

Aanleiding: ruimte bieden voor expertise aannemer, met name op het vlak van: planning, fasering, uitvoering, raakvlakken.

Hoe ga je de N270.16 slim realiseren?! Maximale beheersing van risico's en maximale benutting van kansen.

Stappen in de beoordeling:

- Stap 1: controle inschrijvingsvereisten
- Stap 2: beoordeling kwalitatieve documenten
- Stap 3: beoordelen bijdrage aan deliverable en projectdoelstellingen door sleutelfunctionarissen
- Stap 4: kwantitatieve beoordeling
- Stap 5: bepalen BPKV

Beslissing beoogd opdrachtnemer (25 nov) & concretiseringsfase

Best Value Aanpak (2/2)

Kwaliteits-criterium	Doelstelling	Aandachtspunten	Maximale fictieve aftrek in €
Prestatieonder-bouwing	Optimaal realiseren van het beoogd eindresultaat en optimaal bijdragen aan de opdracht doelstellingen / projectdoelstellingen.	Beschrijving belangrijkste prestaties SMART geformuleerd Onderbouwd met dominante informatie	€ 3.500.000,-
Risicodossier opdrachtgever	Beheersing van risico's die gealloceerd zijn bij de Opdrachtgever die het beoogde eindresultaat en/of de opdracht doelstellingen / projectdoelstellingen bedreigen.	Beschrijving belangrijkste risico's Beschrijving beheersmaatregelen en hun effectiviteit SMART geformuleerd* Onderbouwd met dominante informatie	€ 2.000.000,-
Kansendossier	Extra bijdragen aan de opdracht doelstellingen / projectdoelstellingen	Beschrijving belangrijkste, kosteneffectieve kansen SMART geformuleerd* Onderbouwd met dominante informatie	€ 2.000.000,-
Bijdrage aan deliverable en opdracht doelstellingen/projectdoelstellingen door sleutelfunctionarissen	Sleutelfunctionarissen dragen optimaal bij aan de realisatie van de deliverable en aan de projectdoelstellingen	Doorgroning van het project SMART geformuleerd* Onderbouwd met dominante informatie	€ 2.500.000
Maximale totale fictieve aftrek			€ 10.000.000,-

Aanbestedingsprocedure

Belangrijke momenten (zie volledige planning inschrijvingsleidraad):

Fase	Activiteit	Datum / tijdstip
Inlichtingen	Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder)	21 juni
	NvI 1	25 juni 10.00 uur
	Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	9 juli
	NvI2	30 juli 10.00 uur
	Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	8 september
Inschrijving en beoordeling	Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	4 oktober 12:00
	Proces-verbaal van opening publiceren	5 oktober
	Gesprekken bijdrage aan deliverable en projectdoelstellingen door sleutelfunctionarissen	18 tot 21 oktober
	Vaststellen EMVI (Beste Prijs-Kwaliteitverhouding)	19 november
	Verzenden beslissing beoogd Opdrachtnemer en uitnodiging tot deelname concretiseringsfase.	25-november
Concretiseringsfase	Startbijeenkomst concretiseringsfase	6 januari 2022
	Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning)	21 februari 2022
Gunning	Beoogde ingangsdatum overeenkomst/ start uitvoeringsfase	22 maart 2022

Vragen en afsluiting



Toevoeging stvz grondverwerving



Legenda

Aankoop N270

- Negatief
- Neutraal
- Overeenkomst gesloten
- Positief




Toevoeging stvz grondverwerving

Details **Toevoegen** ▾ Bewerken Basiskaart Analyse Opslaan ▾ Delen Afdrucken ▾ Routebeschrijving Meten Bladwijzers Adres of plaats zoeken



Toevoeging stvz grondverwerving

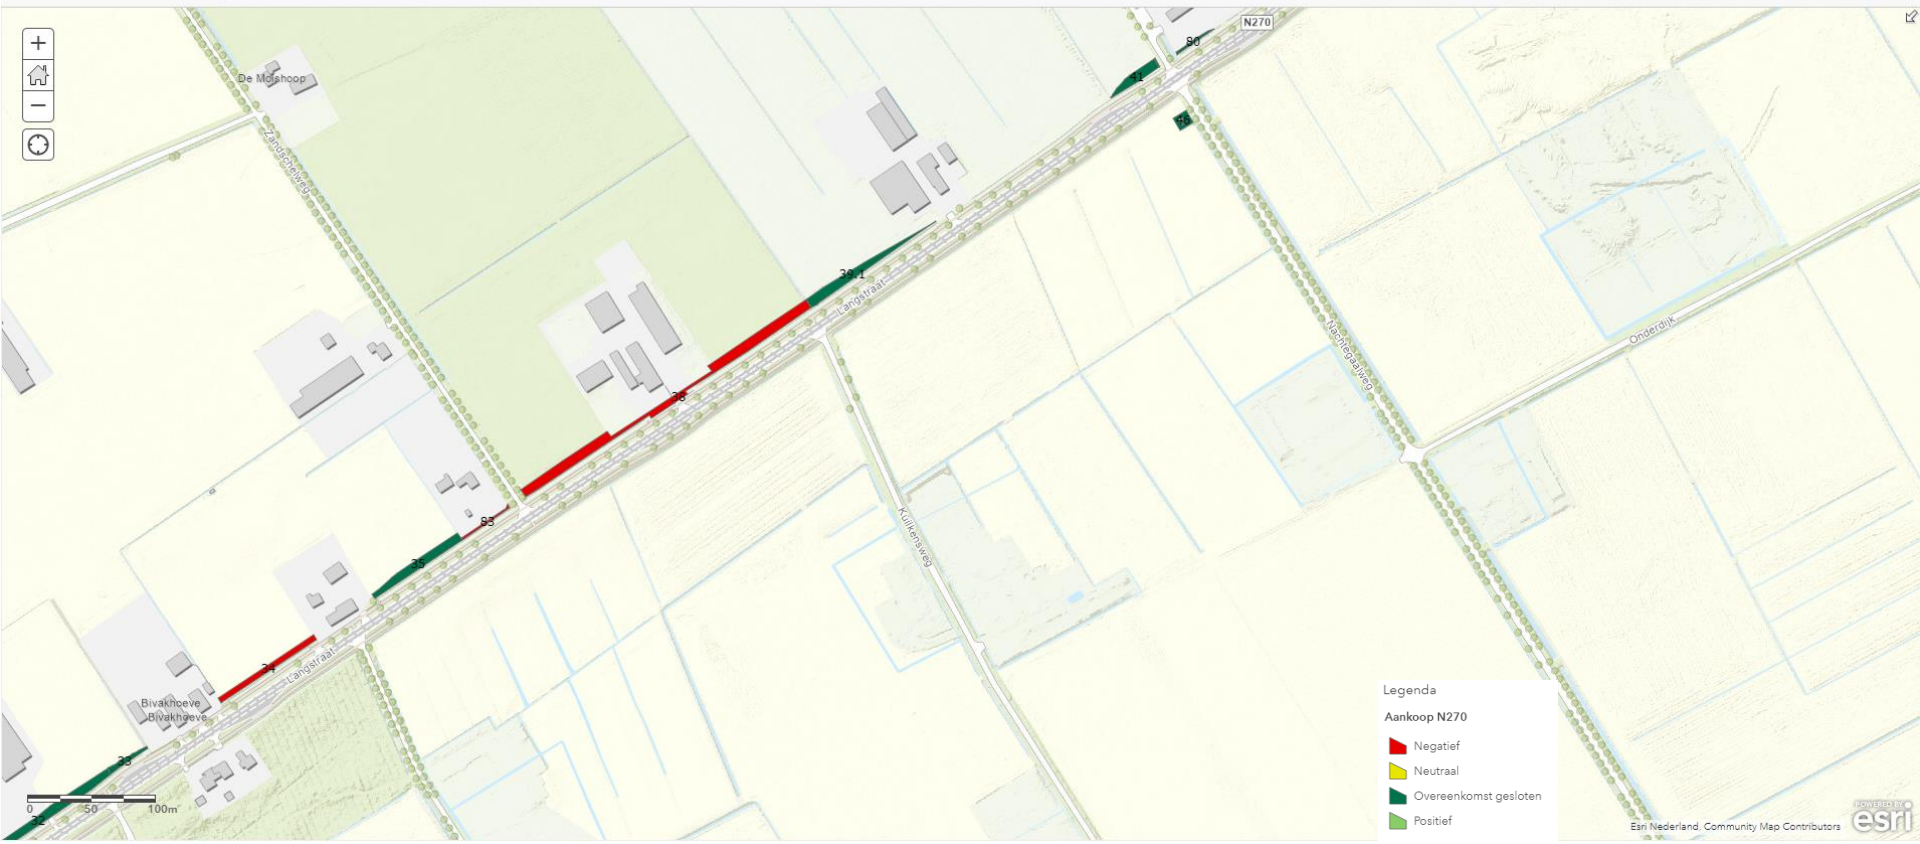

Legenda


Aankoop N270

- Negatief
- Neutraal
- Overeenkomst gesloten
- Positief

Toevoeging stvz grondverwerving

Details + Toevoegen Bewerken Basiskaart Analyse

Opslaan Delen Afdrukken Routebeschrijving Meten Bladzijzers Adres of plaats zoeken

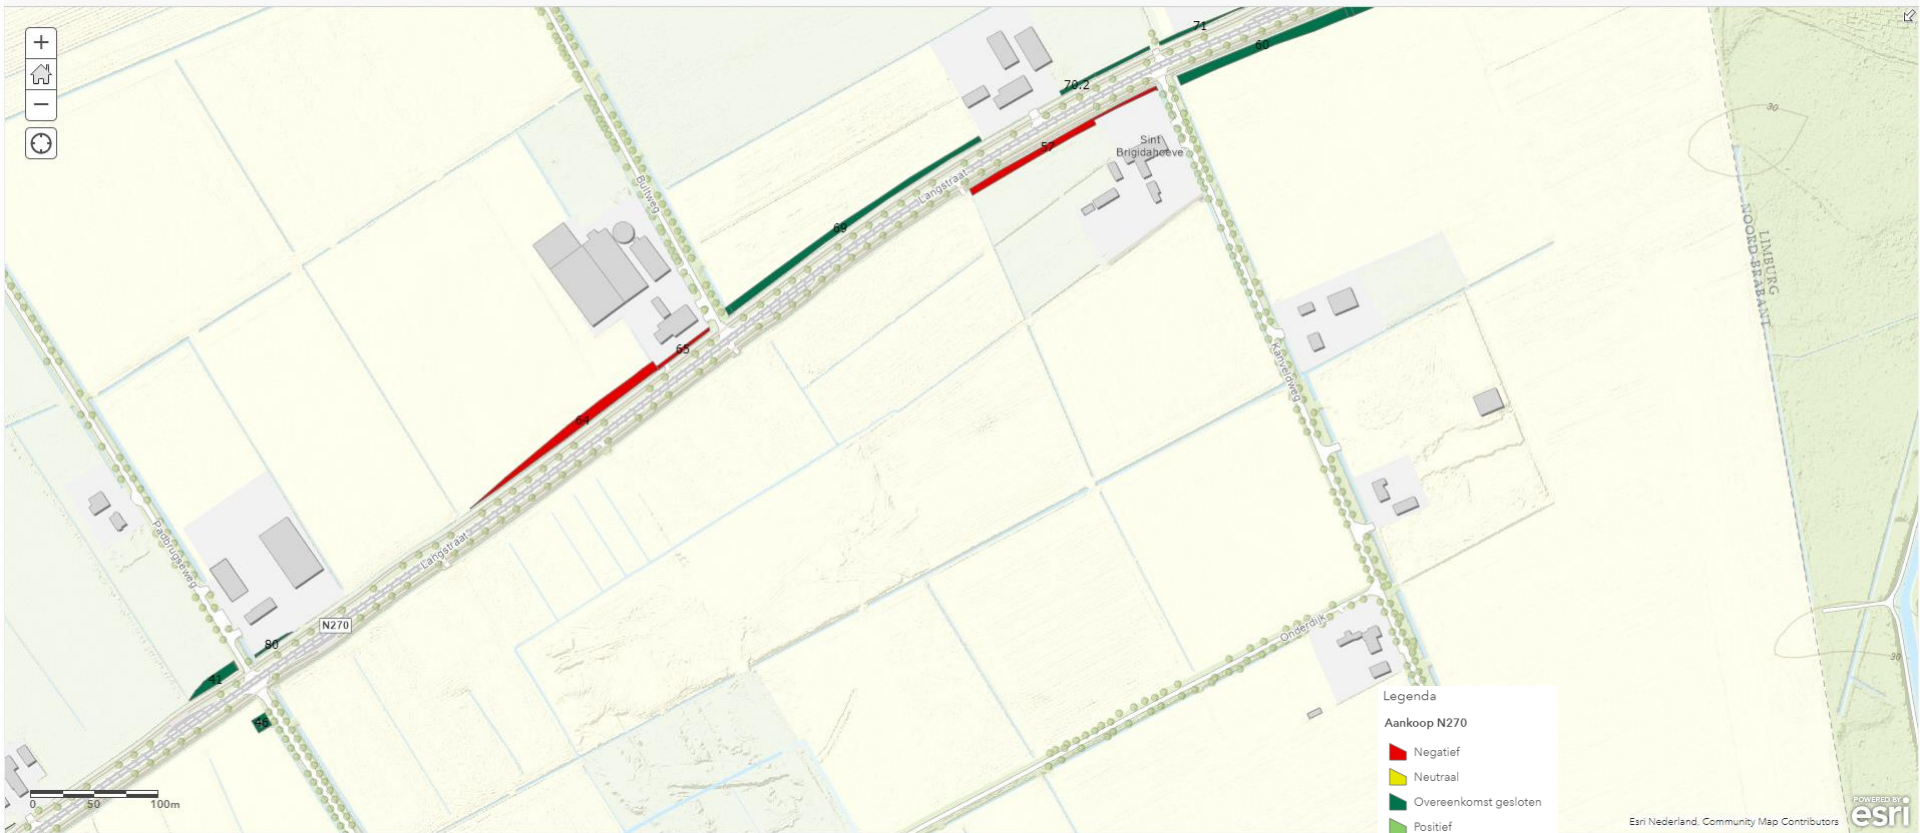

Legenda

Aankoop N270

- Negatief
- Neutraal
- Overeenkomst gesloten
- Positief



Toevoeging stvz grondverwerving

