

Bijlage 2SD Voorlopige Projectscoop

Overbruggen Bloemendal

Dit betreft een voorlopige projectscoop om gegadigden op hoofdlijnen inzicht te geven van de opdracht.

Er kunnen derhalve aan deze voorlopige projectscoop geen rechten worden ontleend.

De opdrachtgever behoudt het recht aanvullingen en wijzigingen aan te brengen.

Bij de start van fase 2 van de aanbesteding wordt dit document definitief gemaakt.

Versie	1.0
Datum	10-11-2021
Besteknummer	WW-800043-BO1
Zaaknummer	1178745

Inhoudsopgave

1	Bouwteam.....	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Taakverdeling en verwachtingen (verantwoordelijkheid)	4
1.3	Organisatie bouwteam.....	5
2	Projectscope	7
2.1	Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht	7
2.2	Projectresultaat.....	7
2.3	Projectafbakening	8
2.3.1	Projectgebied.....	8
2.3.2	Scope.....	8
2.3.3	Afbakening.....	9
2.3.4	Raakvlakken met andere (ruimtelijke) objecten	9
2.3.5	Beschikbare informatie	10
2.4	Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)	10
2.4.1	Geld	10
2.4.2	Tijd	10
2.4.3	Kwaliteit.....	11
3	Contractvormen	12
3.1	Bouwteamovereenkomst	12
3.2	Aannemingsovereenkomst	12
	Bijlage 2SD-1. Concept bouwteamovereenkomst.....	13
	Bijlage 2SD-2. Schetsontwerp	14

1 **Bouwteam**

1.1 **Inleiding**

Vanaf april 2021 is de gemeente Barneveld begonnen met het ontwikkelen van uitbreidingswijk “Bloemendal”. Momenteel wordt het eerste deelplan bouwrijp gemaakt waarna verschillende ontwikkelaars, eind december 2021, zullen starten met het bouwen van de woningen en appartementencomplexen. Dit deelplan wordt aan de oostzijde begrenst door de zijtak van de Trammelant beek.

In het kader van de bouwrijp werkzaamheden krijgt deze waterloop-/gang een nieuw, breder profiel voorzien van retentiegebieden voor het bergen van regenwater dat vanuit de nieuwbouwwijk afstroomt naar deze gebieden.

Op basis van het huidige masterplan met daarin de toekomstige ontsluitingstructuur voor het gehele uitbreidingsplan is reeds bekend dat er een aantal ongelijkvloerse kruisingen (lees: *bruggen*) gemaakt moeten worden voor zowel langzaamverkeer als gemotoriseerd verkeer over het nieuwe profiel van de zijtak Trammelantbeek.

Tevens is een globale planning gemaakt met de momenten waarop de verschillende bruggen gereed moeten zijn. Dit is gebaseerd op de verkeerstromen die gaan ontstaan door het ontwikkelen van de projectlocatie.

Binnen de gemeente Barneveld is er onvoldoende kennis en expertise voor het doorontwerpen, nader detailleren en constructief uitwerken van de schetsontwerpen. (visualisatie esthetische vormgeving) Dit moet binnen de daarvoor gestelde kaders van het **beeldkwaliteitsplan** en **programma van eisen** plaatsvinden, zodanig dat de realisatiekosten voor alle kunstwerken tezamen passen binnen het daarvoor beschikbare taakstellende uitvoeringsbudget.

Om bovengenoemde redenen wil de opdrachtgever voor deze opdracht een bouwteam formeren. De verwachting is – en dit is tevens het doel – dat door samen te werken:

- alle werkzaamheden effectiever en met zo min mogelijk stremming en overlast worden uitgevoerd en/of gerealiseerd;
- stakeholders zo optimaal mogelijk worden betrokken en bediend;
- kennis en kunde worden samengevoegd hetgeen leidt tot slimmer/innovatief en/of effectiever ontwerpen, planningen en uitvoering;
- risico's beter worden beheerst en faalkosten geminimaliseerd;
- investeringskosten worden gereduceerd;
- bij de realisatie van de bruggen de vormgeving zoals verbeeld in de (schets)ontwerpen zoveel als mogelijk worden benaderd, binnen het daarvoor vastgestelde plafonbedrag.

De belangrijkste stakeholders zijn vooralsnog de volgende partijen.

1. De gemeente Barneveld, als opdrachtgever (verschillende disciplines);
2. Een aannemer, als opdrachtnemer (verschillende disciplines)

Daarnaast zijn er sub stakeholders, op afroep benodigd, zoals:

3. Waterschap Vallei en Veluwe;
4. Provincie Gelderland (ecologie)
5. Hulpdiensten;
6. Vakdisciplines binnen ambtelijke organisatie
7. Nuts- en telecombedrijven;
8. IPV Delft (Ontwerpbureau);

9. Advies- en onderzoeksbureaus;
10. Technische specialisten;
11. Overige adviseurs.

Voortschrijdend inzicht bij opdrachtgever dan wel opdrachtnemer kunnen uiteraard zorgen voor wijzigingen en/of aanvullingen hierin.

1.2 Taakverdeling en verwachtingen (verantwoordelijkheid)

Opdrachtgever en opdrachtnemer nemen samen deel aan het bouwteam.

Namens de opdrachtgever nemen de volgende disciplines deel aan het kernteam van het bouwteam:

- Projectleider RO (budgethouder);
- Contractbeheerder;
- Adviseur kunstwerken (BOR);
- Vormgever/landschapsarchitect;
- *Kostendeskundige* (optioneel).

In het bouwteam worden gezamenlijk het ontwerp, de constructieve uitwerking, planning en fasering opgesteld. Wanneer de ontwerpen definitief zijn, wordt gezamenlijk een uitvoeringscontract (aannemingsovereenkomst) opgesteld. Deze heeft als basis een RAW-bestek (2020).

De opdrachtgever stelt de delen 1 en 3 van het RAW-bestek op en de opdrachtnemer deel 2.

Wanneer de inhoud hiervan door alle partijen akkoord is bevonden, stelt de opdrachtnemer een definitieve aanbieding op voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wordt besproken en indien deze akkoord is voor beide partijen, krijgt de opdrachtnemer opdracht voor het uitvoeren van het werk.

De aanneemsom is daarbij een fixed price waarbij **geen** meer- en/of minderwerk wordt verrekend behalve als er, **op verzoek van de opdrachtgever**, significante scopewijzigingen plaatsvinden ten opzichte van de vastgestelde ontwerpen.

De opdrachtgever is hoofdverantwoordelijk voor:

- Aanleveren schetsontwerpen, bijbehorend beeldkwaliteitsplan en programma van eisen;
- Aanleveren inrichtingsplan Bloemendal (boven- en ondergronds);
- Toetsen en controleren aangeboden ontwerpen (5st.);
- Toetsen en controleren constructieve uitwerking en bijbehorende constructieberekeningen;
- Opstellen deel 1 en 3 voor RAW-bestek t.b.v. realiseren kunstwerken;
- Beheren uitvoeringsbudget;
- Aanvragen omgevingsvergunning(en) (*indien van toepassing*);
- Overleggen en afstemmen met in- en externe stakeholders.

Van de opdrachtgever mag worden verwacht:

- Actief betrokken te zijn bij het maken, bijwerken en vaststellen van de planning en fasering en hierbij haar kennis en kunde inbrengt;
- Actief betrokken te zijn tijdens de uitvoeringsfase en hierop toezicht zal houden;
- Actief betrokken te zijn bij communicatie tijdens de uitvoeringsfase;
- Actief betrokken te zijn bij het onderhoud en de overdracht van de kunstwerken;
- Kansen en Risico's signaleert, inbrengt en voorstellen doet m.b.t. beperkende maatregelen.

De opdrachtnemer is hoofdverantwoordelijk voor:

- Bewaken van het proces in het bouwteam;
- Overzichtelijke planning met duidelijke mijlpalen voor het gehele werk (zowel ontwerp, voorbereiding als uitvoering) waarin belangrijke contactmomenten (bijvoorbeeld: beslismomenten) met de opdrachtgever zijn opgenomen;
- Opstellen/uitwerken fasering;

- Opstellen/uitwerken (detail)ontwerpen;
- Opstellen/uitwerken constructietekeningen en berekeningen;
- Opstellen/uitwerken uitvoeringstekeningen;
- Opstellen van deel 2 van het RAW bestek voor de werkzaamheden (op basis van de uitvoeringstekeningen);
- Uitbrengen aanbieding voor het realiseren van het werk;
- Communicatie en coördinatie tijdens de uitvoeringsfase;
- Uitvoering van het werk, inclusief verkrijgen bijbehorende vergunningen;
- Overdracht van het werk naar de opdrachtgever (overdrachtdossier).

Van de opdrachtnemer mag worden verwacht:

- Actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van de ontwerpen en bestek: door het inbreng van kennis van uitvoering, materialen, gebied, markt, planning, fasering etc.;
- Actief betrokken te zijn bij de afstemming met stakeholders en daarbij zijn kennis en kunde inbrengt;
- Actief betrokken blijft bij het bewaken van het uitvoeringsbudget en bijdraagt aan het creëren van een optimale investering en eventueel reductie van de kosten; (kosten/kwaliteitverhouding);
- Kansen en Risico's signaleert, inbrengt en voorstellen doet m.b.t. beperkende maatregelen;
- Gevraagd en ongevraagd adviseert over alle aspecten aangaande het project in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase;
- Eigenaarschap voelt en uitdraagt in relatie tot de PR van de gemeente Barneveld.

In het bouwteam zijn opdrachtnemer en opdrachtgever beide 50% verantwoordelijk voor:

- Onderling afstemmen inhoud en detailniveau van de ontwerpen en het bestek;
- Overleggen en afstemmen met in- en extern stakeholders;
- Coördinatie van raakvlakken met andere projecten, K&L werkzaamheden, werken derden en overige;
- Gezamenlijk opstellen kostenramingen;
- Communicatie ten tijde van de ontwerp- en voorbereidingsfase (tot en met de opdrachtverstrekking voor de realisatie).

1.3 Organisatie bouwteam


Het bouwteam bestaat uit projectleiders, ontwerpers en andere betrokkenen van opdrachtgever en opdrachtnemer. Gezamenlijk stellen zij de ontwerpen, de fasering, alle overige benodigde bescheiden en het uitvoeringscontract op.

Bouwteamvergaderingen

Opdrachtgever is voornemens om met het bouwteam twee (2) à drie (3) wekelijks samen te komen in een bouwteamvergadering. Tijdens deze vergaderingen worden de werkzaamheden die zijn verricht besproken en worden doelen gesteld voor de volgende bespreking.

Dit wordt gedaan door te werken met een agenda, een actielijst bij te houden en afspraken vast te leggen. Deze documenten worden door de opdrachtnemer opgesteld, bijgehouden en verspreidt onder de leden van het bouwteam.

Bouwteam “Overbruggen”

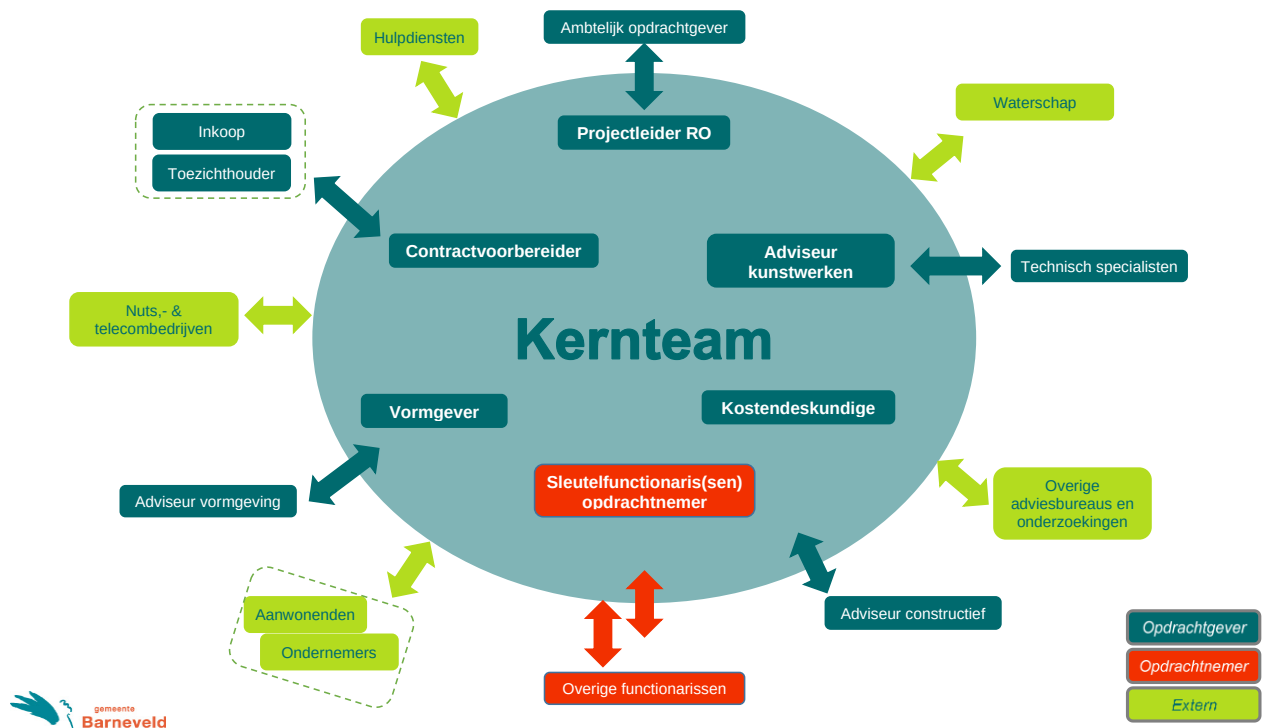

Afbeelding: inrichting bouwteam “Overbruggen Bloemendaal”

Binnen het bouwteam wordt er vanuit gegaan dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar taak/taken. Er wordt daarbij op een gelijkwaardige wijze tot een gezamenlijk gedragen beeld en besluit van een bepaald onderwerp gekomen.

Alle onderwerpen doorlopen de volgende viertal rondes:

1. **Beeldvormingsronde:**
Toelichting op het onderwerp. Eventuele vragen beantwoorden.
2. **Meningsvormingsronde:**
Geef je mening. Iedereen komt aan de beurt. Luister naar elkaar. Stel eventueel vragen ter verduidelijking.
3. **Verdiepende ronde:**
Een ronde om het onderwerp te verdieping. Niets toe te voegen? → Geef je beurt door. Ga door tot alles is gezegd.
4. **Besluitvormingsronde:**
Formuleer voorstel. Vraag toestemming. Bezwaar? → Beargumenteer en kom met een nieuw voorstel.

Een besluit komt tot stand met instemming van de bouwteamleden onder het mom van “ik ben het er mee eens of heb geen overwegend bezwaar”. Dat is iets anders dan ‘consensus’, waarbij iedereen het eens moet zijn.

2 Projectscope

2.1 Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht

De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

1. Het algemene samenwerkingsdoel van het bouwteam, zie paragraaf 1.1, worden waargemaakt;
2. Bij en door de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd.
De opdrachtgever wordt hier in meegenomen. Aan de aspecten duurzaamheid en circulariteit worden in alle fasen van de opdracht zichtbaar vorm gegeven;
3. Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen/minimale overlast als gevolg van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht;
4. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de gehele looptijd van de opdracht op alle fronten een proactieve houding en bijbehorend gedrag;
Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel. Op alle fronten acteert opdrachtnemer zodanig dat alle doelstellingen in ruime mate worden behaald;
5. In het verlengde van de proactiviteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en uitgevoerde werkzaamheden;
6. Voorkomen van faalkosten als gevolg van handelen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer;
7. Tijdens de uitvoering van enige werkzaamheden voortvloeiend uit deze opdracht staat veiligheid voorop, van wie ook;
8. Voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna;
9. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen tijdens de gehele opdracht is te allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer.

De volgende randvoorwaarden, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van belang:

1. Het uitvoeren van werkzaamheden op zon- en feestdagen is **uitdrukkelijk** verboden;
2. Alle werkzaamheden moeten onder/binnen het uitvoeringsbudget worden gerealiseerd; m.u.v. de kosten voor het uitvoeren van benodigde (voor)onderzoeken.
3. De stikstofproblematiek levert geen probleem op in de uitvoering;
4. De veiligheid van passanten staat voorop en wordt geborgd;
5. Voorkomen van gevolgschade, welke ook, gedurende de uitvoering;
6. Een lager onderhoudsbudget vraagt om een duurzamere oplossing (en dus een hogere investering).
7. De (constructieve) uitwerking van de verschillende kunstwerken moeten voldoen aan de gestelde eisen uit het Programma van Eisen "Civiele Kunstwerken Bloemendal"

2.2 Projectresultaat

Het doel van het bouwteam is het van het ontwerpen, realiseren en tijdig opleveren van 5 duurzame, kwalitatief hoogwaardige, toekomstbestendige en onderhoudsarme bruggen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget welke voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en het programma van eisen van de opdrachtgever.

Deze vijf kunstwerken zijn:

1. Twee (2) losse (gebogen) leuningen aan weerszijden van zondagspad ter hoogte van de bestaande kokerduiker.
2. Een (1) tweelingbrug: dit betreft een (1) brug voor gemotoriseerd verkeer (50km/uur) met daar naastgelegen een (1) separate brug voor langzaamverkeer (voetgangers en fietsers) welke tezamen één ruimtelijke eenheid vormen middels het schakelen van de leuningen;

3. Een (1) getoogde brug voorzien van een 'balkon' voorzien van zitelement ten behoeve van langzaamverkeer (voetgangers en fietsers);
4. Een (1) brug voorzien van een horizontaal en verticaal alignement ten behoeve van langzaamverkeer (voetgangers en fietsers).

2.3 Projectafbakening

2.3.1 Projectgebied

Alle hierboven benoemde kunstwerken bevinden langs de oostelijke begrenzing van het eerste deelplan van uitbreidingswijk "Bloemendal" te Barneveld. Voor de exacte positionering van de individuele kunstwerken, zie Bijlage 2SD-2. (tekening BAR.09.SO.TEK.00 van IPV Delft d.d. 22-01-2021)

2.3.2 Scope

Het project "Overbruggen" omvat de volgende fasen waarbinnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk de volgende activiteiten/producten gaan uitvoeren/opstellen ten behoeve van het realiseren van de, onder paragraaf 2.2, beschreven projectresultaten.

Ontwerpfase

In deze fase van het project worden de schetsontwerpen van de individuele kunstwerken nader gedetailleerd en verder uitgewerkt tot **definitieve ontwerpen** die voldoen aan de volgende eisen:

- de esthetische vormgeving van het basisontwerp (SO) is overgenomen;
- de individuele kunstwerken zijn als één (1) familie vormgeven;
- de vormgeving voldoet aan de gestelde eisen/verbeelding uit het beeldkwaliteitsplan;
- de ontwerpen voldoen aan randvoorwaarden, wensen en eisen uit het programma van eisen;
- de totaal geraamde realisatiekosten overschrijden het uitvoeringsbudget niet.

Ook wordt gedurende deze fase in onderling overleg bepaald welke onderzoeken noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw/-gesteldheid en geohydrologische gegevens van de ondergrond.

Producten

De volgende bescheiden worden opgesteld en ter besluitvorming aangeboden:

- definitieve ontwerpen (5st.);
- kostenramingen realisatiekosten, per kunstwerken.

Vorbereidingsfase

Tijdens deze fase worden de definitieve ontwerpen van alle kunstwerken constructief uitgewerkt en gedimensioneerd tot Uitvoeringsontwerpen en wordt het RAW-bestek (2020) opgesteld voor het leveren en aanbrengen van alle kunstwerken.

Producten

De volgende bescheiden worden opgesteld en ter besluitvorming aangeboden:

- uitvoeringstekeningen;
- constructietekeningen;
- detailtekeningen;
- constructie- en funderingsberekeningen;
- RAW-bestek (2020);
- directieraming;
- aanvragen omgevingsvergunning.

Realisatiefase

Deze fase omvat het fabriceren, transporteren, construeren en realiseren van de individuele kunstwerken door de opdrachtnemer.

Product

De volgende bescheiden worden opgesteld en ter besluitvorming aangeboden:

- Proces verbaal van oplevering
- Overdrachtdossier.

Nazorg

De onderhoudsperiode voor elk individueel kunstwerk bedraagt 1 jaar.

2.3.3 Afbakening

De volgende werkzaamheden of activiteiten maken **geen** onderdeel uit van de scope van deze overeenkomst:

- het aanbrengen van nutsvoorzieningen;
- het aanbrengen van de wegverharding, op aansluitende infrastructuur;
- het aanbrengen van houtrillen in de laagte (mitigerende maatregelen);
- het aanbrengen van de groenvoorziening;
- het aanbrengen van openbare verlichting.

2.3.4 Raakvlakken met andere (ruimtelijke) objecten

Nabij de locaties van een aantal kunstwerken bevinden zich andere ruimtelijke objecten en/of (ondergrondse) obstakels waarmee rekening moet worden gehouden bij de nadere uitwerking van de ontwerpen en constructieve uitwerking van deze kunstwerken. Hieronder volgt per kunstwerk, van zuid naar noord, een opsomming van deze raakvlakken per ruimtelijk object.

1. Leuningenkokerduiker

- Zondagspad
 - fundering;
 - verharding.
- Kokerduiker
 - - ligging.

2. Tweeling brug

- Zondagspad
 - fundering;
 - verharding, sluit aan op oostzijde landhoofd.
- Gebiedsontsluitingsweg (50km/uur)
 - aanbrengen deklaag;
 - middengeleider ter hoogte van kruising met Zondagspad.

3. langzaamverkeersbrug met balkon

- Zondagspad
 - fundering;
 - verharding, sluit aan op oostzijde landhoofd.
- Persleiding
 - tracé nabij westelijk landhoofd/vleugelwand.

4. langzaamverkeersbrug met horizontaal en verticaal alignement

- Zondagspad
 - fundering;
 - verharding, sluit aan op oostzijde landhoofd.
- Zwaluwwand
 - landhoofd en/of vleugelwand (grondricht) aansluiten op deze grondkerende

- constructie.
- Transportleiding (GVK) Waterschap
 - Ligging/tracé ter plaatse van toekomstig westelijk landhoofd, vleugelwand
 - en/of paalfundering.

2.3.5 Beschikbare informatie

Beschikbare informatie, van belang om in te kunnen schrijven, is in de volgende bijlagen opgenomen:

Wordt verstrekt in fase 2 van de aanbesteding

1. Schetsontwerpen (5 st.);
2. Beeldkwaliteitsplan;
3. Programma van eisen "Civiele Kunstwerken Bloemendal"

Daarnaast stelt de opdrachtgever onderstaande informatie, na opdracht, beschikbaar:

- Nog nader te bepalen

2.4 Beheersaspecten (Geld, Tijd en Kwaliteit)

2.4.1 Geld

2.4.1.1 Uitvoeringsbudget

Nog nader te bepalen.

2.4.1.2 Bouwteamvergoeding

Nog nader te bepalen.

2.4.2 Tijd

Voor het project is de volgende voorlopige faseplanning van toepassing:

Fase	Einddata
Ingang bouwteamovereenkomst	Direct na aanbesteding
Ontwerpfase SO/VO/DO	4 maanden
Vorbereidingsfase RAW-Bestek	3 maanden
Realisatiefase Het belangrijke uitgangspunt voor de fasering, doorlooptijden en planning zijn de momenten waarop de verschillende kunstwerken gereed moeten zijn in verband met de verschillende verkeersstromen die ontstaan door de voortdurende ontwikkeling van de projectlocatie. Met het oog op efficiëntie en kostenbesparing mogen de bruggen ook allemaal tegelijk of achter elkaar worden gerealiseerd mits wordt voldaan aan de uiterste opleveringsdatum.	
Leuning kokerduiker	Na voltooiing tweeling brug
langzaamverkeersbrug met horizontaal en verticaal alignement	Juni 2023
langzaamverkeersbrug met balkon	september 2023
Tweeling brug	Na bovenstaande kunstwerk
Nazorgfase	1 jaar na oplevering

2.4.3 Kwaliteit

Het project moet voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten:

1. Doelstelling/uitgangspunten/beheersaspecten zoals genoemd in de aanbestedingsdocumenten;
2. Wettelijke eisen;
3. Programma van eisen “Civiele Kunstwerken Bloemendal”
4. Beeldkwaliteitsplan (IPV Delft)
5. De nog vast te stellen (kleinschalige) wensen/eisen vanuit stakeholders worden in bijeenkomsten met de betrokkenen verder uitgewerkt en gaan in overleg met de opdrachtgever.

3 Contractvormen

3.1 Bouwteamovereenkomst

De opdrachtgever wil voor dit project een “bouwteamovereenkomst” aangaan. Zie voor het concept de losse Bijlage 2SD-1.

3.2 Aannemingsovereenkomst

De opdrachtnemer dient het door het bouwteam opgestelde ontwerp te realiseren met inbegrip van het door opdrachtnemer zelf gerealiseerde ontwerp t.b.v. uitvoeringsconstructies en hulpconstructies evenals uitvoering van risicomanagement. Als basis voor de aannemingsovereenkomst zal door de opdrachtnemer een RAW-bestek, conform de Standaard RAW Bepalingen 2020 worden gemaakt. Omdat de opdrachtnemer betrokken is geweest bij het ontwerp zullen er geen verrekeningen plaatsvinden, anders dan de afgesproken vaste prijs. Risico's en kansen dienen hierbij afgeprijsd te worden en kunnen alleen bij het optreden ervan verrekend worden. In onderling overleg en na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever kan hier (op onderdelen) van worden afgeweken.

De opdrachtgever is gerechtigd om voor haar moverende redenen de aannemingsovereenkomst niet aan te gaan of uit te stellen (zal vooral gaan om zaken buiten de invloedssfeer van de opdrachtgever). De kosten die gemaakt zijn in de bouwteamfase worden vergoed volgens § 2.4.1.2. Indien opdrachtnemer kan aantonen dat er door opdrachtnemer kosten zijn gemaakt die niet vergoed worden door de bouwteamovereenkomst zal opdrachtgever deze kosten in redelijkheid en billijkheid alsnog vergoeden. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat kosten onderdeel zijn van de aannemingsovereenkomst.

In alle gevallen beslist de opdrachtgever of en in welke mate het project en de opdracht doorgang vindt.

Bijlage 2SD-1. Concept bouwteamovereenkomst

Nog nader te bepalen.

Bijlage 2SD-2. Schetsontwerp

Deze bijlage is als aparte bijlage toegevoegd onder de naam:

"Bijlage 2SD-2 Schetsontwerpen bruggen Bloemendal (concept).pdf"
