



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Project Vervanging en Renovatie Corridorcentrale Nijmegen (CCN)

Marktconsultatie project CCN

CCN-team
06-07-2022



Programma

- Huishoudelijke regels
- Voorstellen
- Aanleiding van de marktconsultatie
- De huidige situatie verkeerscentrale Nijmegen
- Activiteiten project CCN
- (Inkoop) bundeling activiteiten
- Vragen aan de markt
- Vervolg marktconsultatie
- Evaluatie en afsluiting



Huishoudelijke regels m.b.t. marktconsultatie

- het gesprek wordt opgenomen
- de presentatie wordt toegezonden
- verzoek het geluid uit te zetten
- voor 'tussentijdse' vragen, graag 'digitale hand' opsteken
- geluid en beeld aanzetten wanneer u het woord krijgt



EVEN
voorstellen?





Aanleiding van deze marktconsultatie


- Marktkennis verdiepen
- Voorgenomen bundeling van in te kopen activiteiten
- Haalbaarheid (projectscope/doelen/eisen etc.) toetsen





De huidige situatie

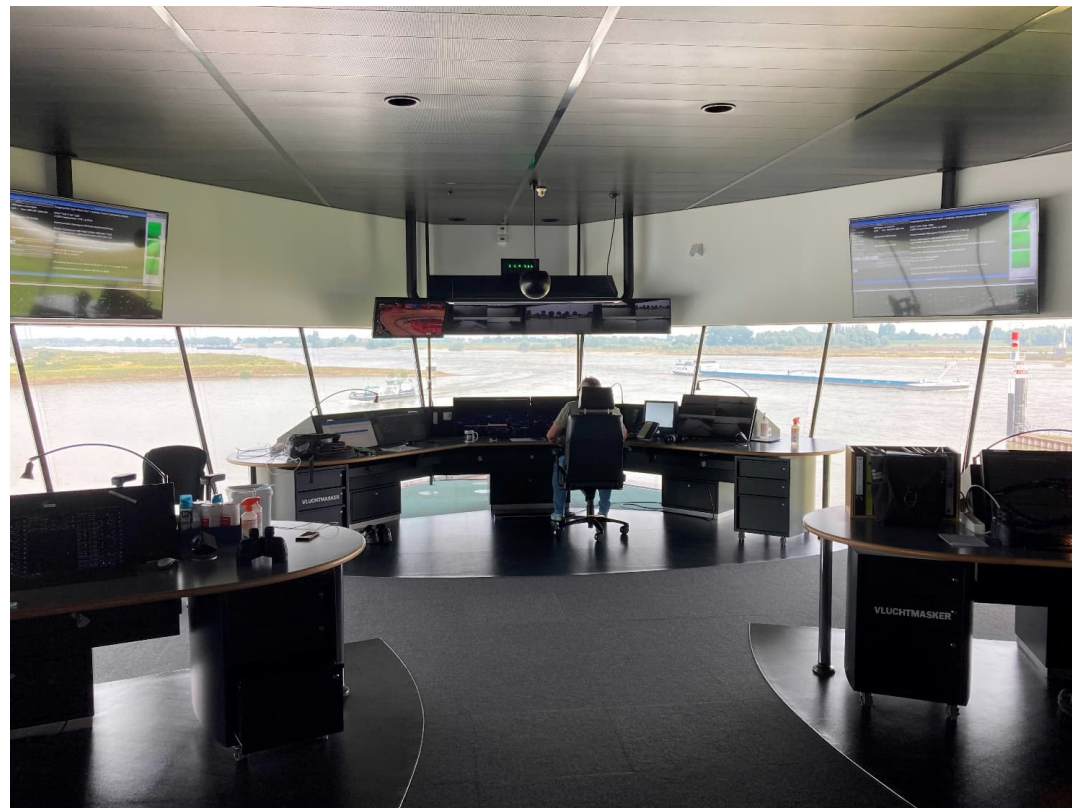

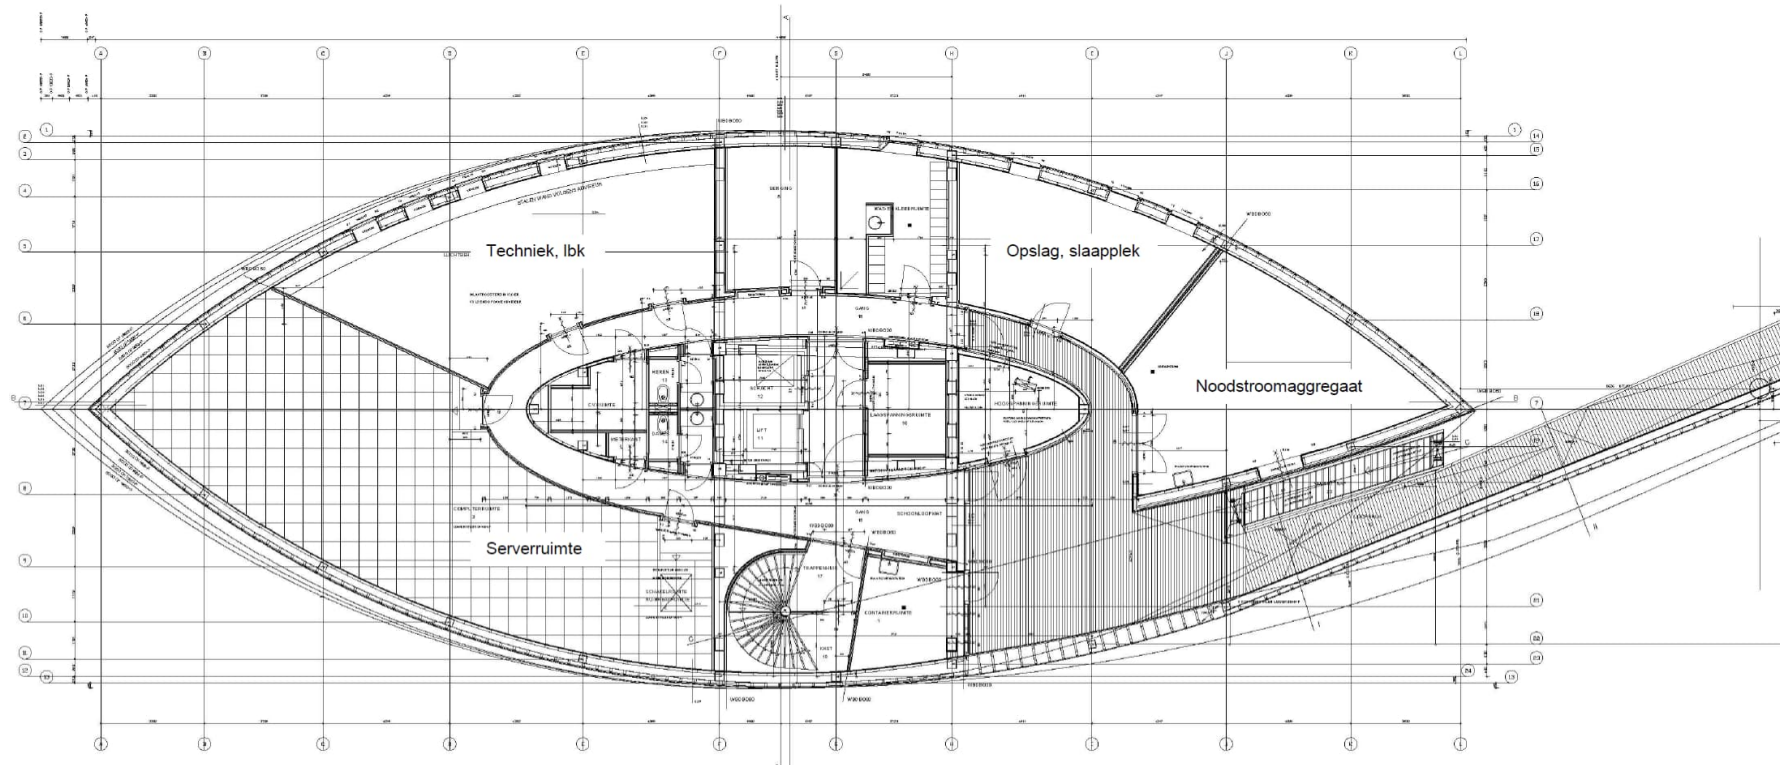

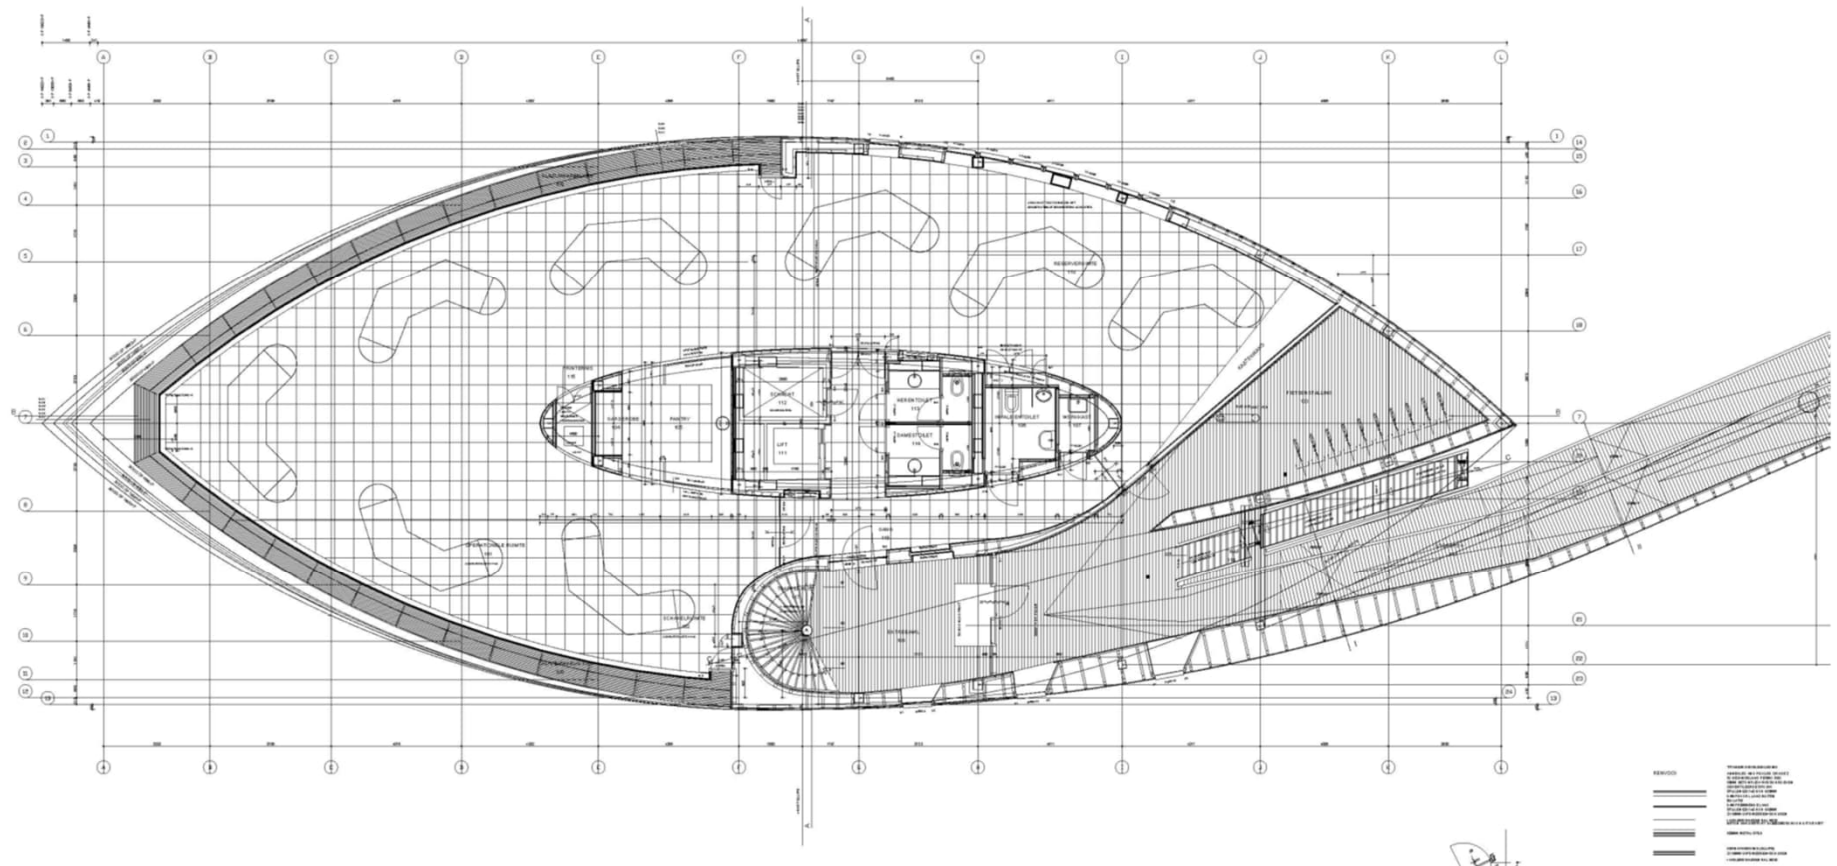

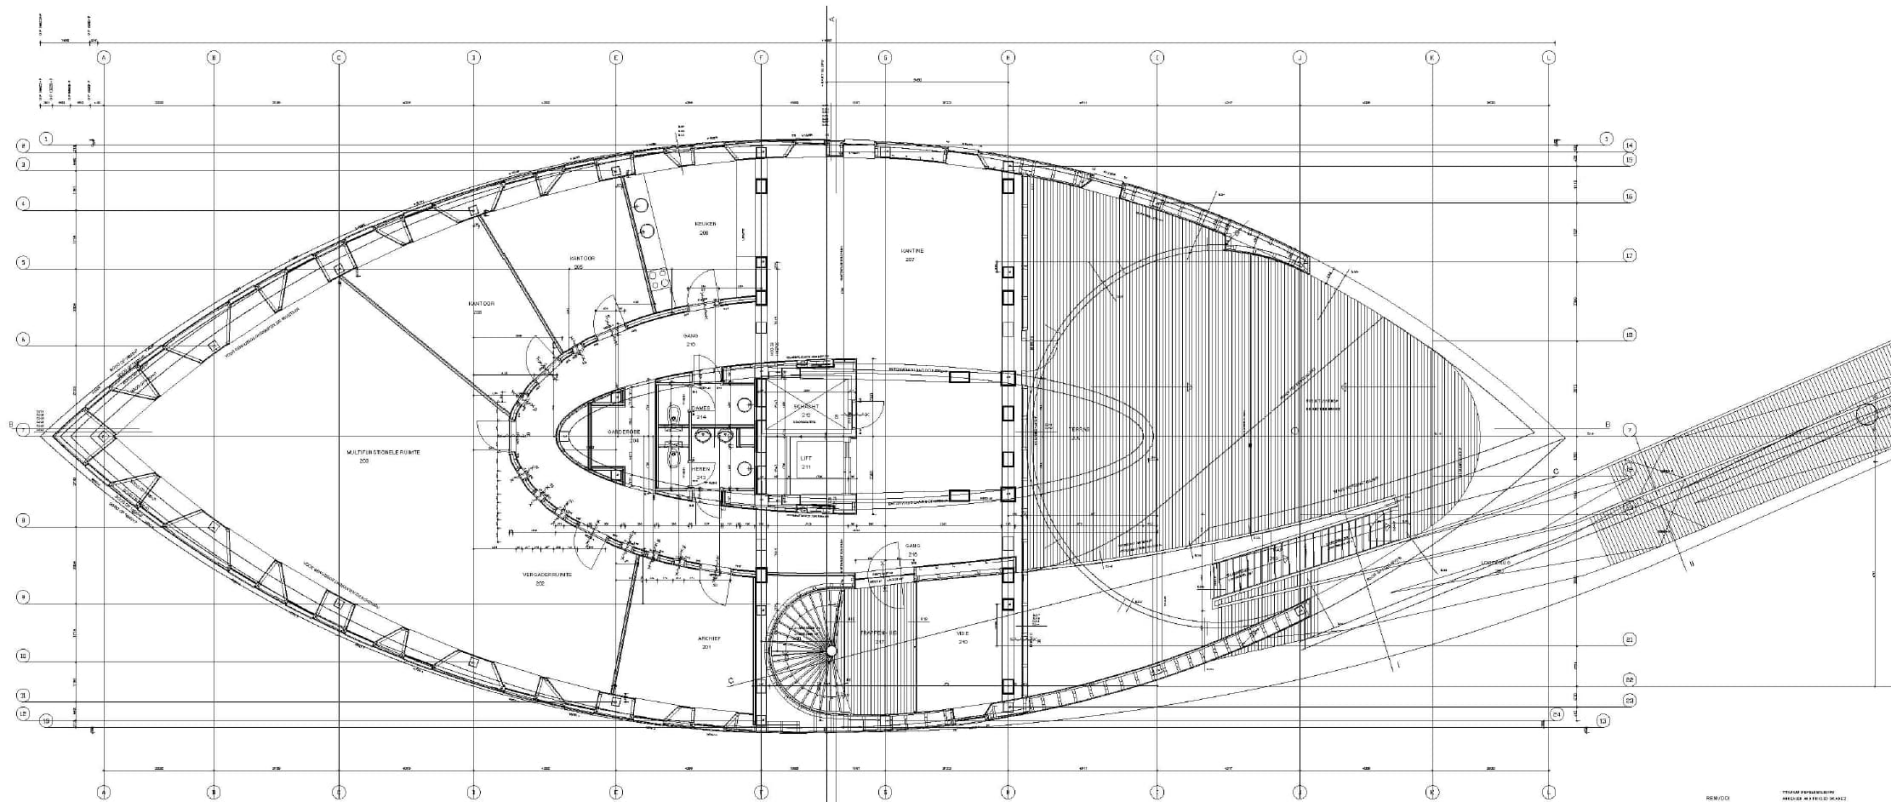

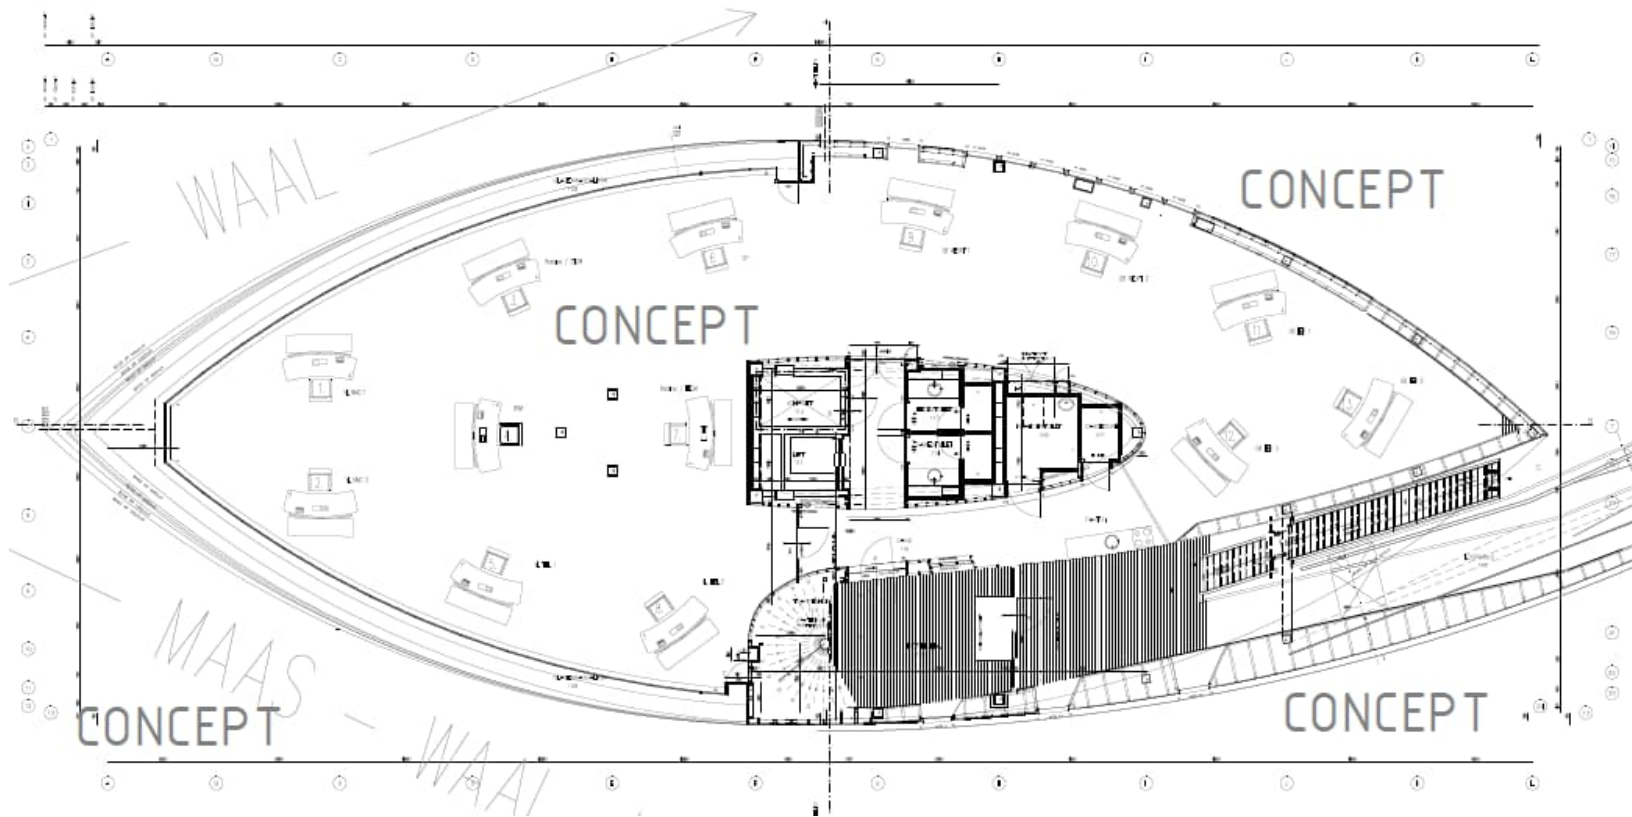





Activiteiten project CCN

- Voorbereiden van de verbouwing
- Realisatie tijdelijke voorziening
- Verbouwen Verkeerspost
- Verkeerscentrale uitrusten met VTS systemen
- Verkeerscentrale afbouwen en afronding



Vorbereiden verbouwing

- Vergunningsaanvragen
- Plannen opstellen (PMP, bouwplaatsmanagement, planning, V&V, areaalgegevens e.d.)
- Ontwerpen
 - Voorontwerp
 - Definitief ontwerp
 - Uitvoeringsontwerp
 - Testplannen
- Dossiervorming t.b.v. oplevering





Realisatie tijdelijke voorziening

- Realiseren portacabines (semi-permanent gebouw) inclusief nuts
- Inrichten van portacabines met werkomgeving voor VTS (technische ruimte, consoles transporteren/renoveren, bekabeling, algemene voorzieningen)
- Ondersteuning bij werkzaamheden door CD, CIV en VTS leveranciers
- Verhuizing (fysiek) van bestaande Verkeerspost naar de tijdelijke voorziening



Verbouwen Verkeerspost

- Inrichten werkterrein
- Nader onderzoek bestaande situatie (t.b.v. uitwerken ontwerpen)
- Werkvoorbereiding
- Bouwkundige werkzaamheden
- GGI werkzaamheden



Verkeerscentrale uitrusten met VTS

- Aanleg van netwerk/data/glasvezel/voeding voorzieningen
- Inrichting van operationele ruimte
- Uitrusten systeemruimte (systeemkasten vullen)
- Realiseren aanpassingen VTS systemen door VTS leveranciers



Verkeerscentrale afbouwen en afronding

- Realiseren leveringen derden (CIV/CD)
- Opleveren en opleverdossiers
- Verhuizen (fysiek) naar Verkeerscentrale
- Demontage tijdelijke voorziening/herstel terrein



Uitvoerende partijen

- Realisatie opdrachtnemer
- CIV (netwerk/ICT voorzieningen, nieuwe consoles)
- CD (meubilair en inrichting, advies voor beveiliging)
- VTS syteemleveranciers:
Radar (SAAB), CCTV (Dylniq), Marifoon (KPN CC)

Integratie/
coördinatie



Omgevingsmanagement

- Locatie tijdelijke huisvesting
- Parkeren
- Verkeersstromen
- Hulp en nooddiensten
- Globale inrichting werkterrein
- Bouwveiligheid en bouwbesluit
- Bouwcommunicatie (in afstemming met RWS)

- Uitgevoerde onderzoeken



(Inkoop) bundeling activiteiten

Betreft	VOORLOPIGE bundeling hoe in te kopen
Bouwkunde/installatietechniek/realiseren van een tijdelijke huisvesting/ Architectonische ondersteuning	Gebundeld in 1 contract (E&C/D&C)?
Coördinatie van de systeemintegratie van de VTS systemen	Afzonderlijke inkoop?
Aanpassingen aan bestaande VTS-apparatuur	Middels bestaande VTS-leveranciers
Werkplekken (bouwblokken)	Middels CIV



Vragen aan de markt

- Welke markt sluit het beste aan bij de realisatie van het project?
- Is kennis van verkeerscentrales noodzakelijk?
- Is de wijze waarop RWS de in te kopen activiteiten bundelt/splitst optimaal?
- Wat zijn de (on)mogelijkheden van de marktpartijen v.w.b. de realisatie van dit project?
- Is de aanbestedingsvorm: Concurrentie Gerichte Dialoog (light) en contractvorm: D&C-contract passend?



Vervolg marktconsultatie

- Ontvangen lijst met vragen, s.v.p. beantwoorden
- Eventuele aanvullende vragen n.a.v. presentatie kunnen nog via TenderNed worden gesteld
- Op basis antwoorden wordt bekeken of er aanknopingspunten zijn om de "marktwens" in het inkooptraject op te nemen en om via eventuele individuele gesprekken deze gedachtegang te "challengen"
- Het Marktconsultatieverslag wordt op TenderNed gepubliceerd

Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst	13-07-2022 tot 15.00 uur
Data voor eventuele mondelinge toelichtende gesprekken	21-07-2022 tot en met 28-07-2022
Afronding en publiceren resultaten	01-08-2022





Dank voor deelname en we zien de
antwoorden tegemoet.
