



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Marktconsultatiedocument

ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding inzake het project
Bestendig Regelmatig Uitbesteed en Gewaarborgd (B.R.U.G.)

Colofon

Uitgegeven door Informatie	Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud T.A.T. Goossens en J.C. Veldt
Datum	8 september 2022
Status	Definitief
Versienummer	1.0



Inhoud

1	Inleiding—4
1.1	Aanleiding—4
1.2	Projectbeschrijving—4
1.3	Doel van de marktconsultatie—6
1.4	Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen—7
1.5	Doelgroep van de marktconsultatie—7
2	Marktconsultatie—8
2.1	Procedure en vastlegging—8
2.1.1	Planning—8
2.1.2	Informatiebijeenkomst—8
2.1.3	Vragen—8
2.1.4	Indienen reactie vragenlijst—8
2.1.5	Verdiepende gesprekken—9
2.1.6	Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten—9
2.2	Vertrouwelijkheid en overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie—9
3	Vragen—10
3.1	Algemeen—10
3.2	Thema 1: Scoping van de raamovereenkomst—10
3.3	Thema 2: Samenwerken—11
3.4	Thema 3: Lerend vermogen—12
3.5	Thema 4: Aanbesteden van de raamovereenkomst—12
3.6	Thema 5: Veiligheid en duurzaamheid—12
3.7	Thema 6: Reflectie en toekomst—13
4.	Aanbestedingsplanning en marktbenadering—14

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Dit marktconsultatiedocument is door Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud opgesteld ten behoeve van een marktconsultatie voor de aanbesteding van het project **Bestendig Regelmatig Uitbesteed en Gewaarborgd (B.R.U.G.)**. Dit project is voornemens het komende groot onderhoud aan bruggen voor het areaal Oost-Nederland in de komende 10 jaar middels één geïntegreerd contract te vermarkten.

Vanuit portfoliomanagement is de opdracht gegeven om met een oplossing te komen voor enerzijds de spagaat tussen de onderhoudsbehoefte aan bruggen en anderzijds het beperkte en onvoorspelbare budget in relatie tot de BLS problematiek¹. Daarnaast worden de speerpunten duurzaamheid en veiligheid tevens verweven in deze marktconsultatie.


De marktconsultatie is bedoeld om in een vroeg stadium met de markt in contact te treden over een aantal thema's i.r.t. de aanbesteding en het contract. We willen graag met u samen nadenken hoe wij deze het beste kunnen inrichten en zo samen de kansen te benutten.

Onderhoud aan deze bruggen vergt specifieke kennis zowel intern RWS als bij de ontwerpende en uitvoerende marktpartijen. Om deze interne kennis te behouden is in 2013 in PPO Oost-Nederland het team ON B Bruggen opgericht, ook wel bekend als het bruggenteam. Inmiddels zijn ca. 15 bruggen door dit team in onderhoud gebracht, het merendeel is reeds opgeleverd.

1.2 Projectbeschrijving

Het areaal in Oost-Nederland omvat ca. 205 bruggen. Grofweg 70 van deze bruggen is naorlogs en ongeveer de helft van deze 70 behoeven gelijktijdig groot onderhoud en naderen einde levensduur. Benadering van einde levensduur is geen lineair proces hierdoor ontstaat schijnbaar plotseling direct de noodzaak tot (groot) onderhoud. Bijkomend aspect is de toename van het vrachtverkeer waar deze bruggen niet op ontworpen zijn.

¹ Het Baten Lasten Stelsel (BLS) behelst het budgetteringssysteem inzake het onderhoudsbudget voor Rijkswaterstaat. In 2021 is deze budgettering onder druk komen te staan vanwege tekorten op de staatskas. Dit heeft geleid tot het doorschuiven in de tijd van onderhoudsprojecten.

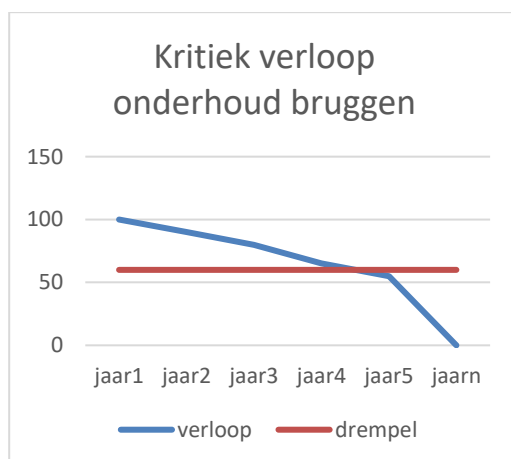

Figuur 1: Versimpelde weergave van verloop onderhoud bruggen

Omdat de budgettering van het onderhoud op gespannen voet is komen te staan met de prioritering als gevolg van het benodigde onderhoud is Rijkswaterstaat voornemens een raamovereenkomst af te sluiten om zo snel urgente opdrachten te kunnen opdragen en op lange(re) termijn opdrachtnemer(s) aan zich te binden.

In elk geval betreft de af te sluiten raamovereenkomst 1 perceel ten behoeve van het areaal bruggen binnen PPO Oost-Nederland. Dit betreft naar verwachting 20-30 bruggen waar de komende 10 jaar groot onderhoud aan wordt verwacht. Opgemerkt zij dat V&R buiten beschouwing van dit project wordt gelaten.

Voor een deel van de bruggen wordt het klein variabel onderhoud middels het prestatiecontract *Kunstwerken Oost-Nederland* met zaaknummer 31149471 uitgevoerd. Voor het resterende groot onderhoud wordt het project B.R.U.G. opgetuigd, het is de bedoeling dat deze parallel in de tijd gaan lopen. De V&R-opgave wordt separaat op de markt gezet vanwege de geheel andersoortige werkzaamheden die hieraan ten grondslag liggen. Tevens zijn er raakvlakken met de op stapel staande onderhoudscontracten voor wegen en kunstwerken. Deze raakvlakken en mogelijke overlappingen worden nog nader in kaart gebracht en zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Uitdagingen

Optimaliseren van de keten Regio – PPO – Markt

Om zo vroegtijdig samenwerking mogelijk te maken wil RWS de opdrachtnemer betrekken bij de initiële projectvorming (POF-proces). Dit is een iteratief proces dat uitmondt in de aan te besteden scope van een project/Nadere Overeenkomst.

Onzekere scope

De frequentie van nieuwe opdrachten binnen de raamovereenkomst blijft onvoorspelbaar. Hoe kan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zorgen voor een redelijke stroom van projecten en bij een onredelijke stroom omgaan met deze onbekendheid in scope en omvang van de scope.

Randvoorwaarden en uitgangspunten

Randvoorwaarden

Samenwerken

Rijkswaterstaat wil graag goed en bestendig gaan samenwerken met de markt en geeft hiermee invulling aan de doelstellingen van *Op weg naar Vitale Infrastructuur*. Hoewel er geen bouwteam of 2-fasen contract wordt toegepast, wil RWS echter wel elementen hiervan toepassen binnen het project B.R.U.G.

Leren

Rijkswaterstaat wil graag de parate kennis over brugonderhoud en het lerend vermogen van de markt en haar eigen organisatie vergroten en bestendigen. Hiertoe stelt RWS voor om leerervaringen van opdrachtnemers breder en met elkaar te delen.

Uitgangspunten

De contractkeuze is gevallen op een raamovereenkomst. De primaire overweging voor deze keuze schuilt in de mogelijkheid om snel urgente opdrachten te kunnen opdragen. De secundaire overweging is de onvoorspelbaarheid en grote discrepantie tussen de verwachte scope en het budget.

Hoewel de contractkeuze binnen de kaders van deze marktconsultatie niet ter discussie wordt gesteld zijn er verschillende facetten hieromtrent welke RWS met de markt wil bespreken.

1.3

Doel van de marktconsultatie

Het primaire doel van de marktconsultatie is het bespreken van de kansen en onzekerheden die samenhangen met deze opgave. De marktconsultatie wordt tevens gehouden om goede contracteisen op te stellen en realistische en effectieve gunningscriteria te kunnen formuleren. Daarom zijn de vragen zowel op project- en contract niveau als op tenderinformatie gericht. Het doel van de marktconsultatie is om een beeld te krijgen van suggesties, ideeën en attitude van marktpartijen ten aanzien van verschillende thema's die in de vragenlijst zijn verwerkt. Daarnaast kan door het houden van een marktconsultatie de samenwerking tussen het projectteam en de marktpartijen gestart worden en begint het projectteam in een vroeg stadium met het overdragen van kennis over het project aan de markt. Dit is in lijn met het transitietraject "Op weg naar een vitale infrasector" waarin (vroegtijdige) samenwerking tussen Rijkswaterstaat en opdrachtnemers wordt benoemd.

Deze marktconsultatie is in 6 thema's gesplitst. De vragenlijst is verdeeld naar deze thema's.

- 1) Scoping van de raamovereenkomst
- 2) Samenwerken
- 3) Lerend vermogen
- 4) Aanbesteden van de raamovereenkomst
- 5) Veiligheid en duurzaamheid
- 6) Reflectie en toekomst



1.4 Aanpak van de marktconsultatie op hoofdlijnen

De marktconsultatie bestaat uit meerdere onderdelen:

- Het marktconsultatiedocument wordt op 8 september gepubliceerd op TenderNed. De vragenmodule zal gelijktijdig worden opengesteld.
- De marktconsultatie trapt met een openbare digitale bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.
- We vragen u mee te doen met een schriftelijke vragenronde. Wanneer u geïnteresseerd bent vragen we u om de onder hoofdstuk 3 opgenomen vragen te beantwoorden en op te sturen (in een Word-bestand).
- Vervolgens zal Rijkswaterstaat een verdiepend gesprek initiëren. De gespreksonderwerpen worden o.b.v. de beantwoorde vragenlijst vastgesteld;
- Ten slotte zal Rijkswaterstaat een verslag van de marktconsultatie publiceren. Hierin zal de beantwoording van gestelde vragen en van de verdiepende gesprekken van marktpartijen als samenvatting zoveel mogelijk generiek en niet herleidbaar naar individuele partijen worden opgenomen.

Alle communicatie alsmede de publicatie van het verslag zal via TenderNed verlopen.

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie

Rijkswaterstaat gaat tijdens de marktconsultatie graag in gesprek met bedrijven of een combinatie van bedrijven werkzaam binnen alle vormen van het bruggenonderhoud. Rijkswaterstaat hecht er waarde aan dat zowel kleine, middel, als grote organisaties aansluiten bij de marktconsultatie.

2 Marktconsultatie

2.1 Procedure en vastlegging

2.1.1 Planning

Rijkswaterstaat hanteert de volgende planning voor de marktconsultatie:

Activiteit	Datum
Publiceren marktconsultatiedocument op TenderNed	8-9-2022
Informatiebijeenkomst	22-9-2022 11:00 – 12:00 uur
Uiterste datum indienen toelichtende vragen op gepubliceerde stukken	29-9-2022
Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst	24-10-2022
Verdiepende gesprekken	Deze vinden plaats in de periode november, december. De exacte data worden via TenderNed gecommuniceerd
Afronding en publiceren resultaten op TenderNed	januari 2023

2.1.2 Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt digitaal plaats op 22 september 2022 van 11:00 uur tot 12:00 uur. Indien deelname gewenst is vernemen wij dit graag uiterlijk 16 september via het email adres BRUG@rws.nl. Graag ontvangen wij uw naam, functie en bedrijfsnaam. Via het genoemde e-mail adres krijgt u de uitnodiging voor de Teams vergadering doorgestuurd. De presentatie wordt na de informatiebijeenkomst aan het dossier op TenderNed toegevoegd. Verdere verslaglegging vindt in dit stadium niet plaats. Mochten zich naar aanleiding van deze sessie vragen voordoen dan wordt verwezen naar paragraaf 2.1.3.

2.1.3 Vragen

Vragen die de informatiebijeenkomst of de gepubliceerde stukken op voorhand oproepen, vernemen wij graag tussen 8 september en 29 september. Let op, deze vragen zullen alle als openbare vragen worden behandeld.

2.1.4 Indienen reactie vragenlijst

Alle deelnemende partijen geven hun visie door middel van het invullen van de vragenlijst die is opgenomen in hoofdstuk 3 van het marktconsultatiedocument. U hoeft in principe alleen uw organisatie en een contactpersoon te vermelden zodat mogelijk een verdiepend gesprek conform 2.1.5 kan worden opgezet. Partijen kunnen de antwoorden op de vragenlijst indienen via TenderNed uiterlijk op de in paragraaf 2.1.1. genoemde 'Uiterste datum voor indienen reactie op vragenlijst'. Hiertoe wordt apart de vragenlijst in word-format bijgevoegd.



2.1.5 *Verdiepende gesprekken*

Partijen die de vragenlijst hebben beantwoord worden allen uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. Het projectteam reserveert hiertoe de periode november - december. De resultaten van deze gesprekken worden samengevat en geanonimiseerd gepubliceerd conform 2.1.6. Hierbij wordt uiteraard bedrijfsgevoelige informatie niet gedeeld en blijft vertrouwelijke informatie binnen het projectteam.

2.1.6 *Afronding marktconsultatie en terugkoppeling resultaten*

Rijkswaterstaat zal de marktconsultatie afronden door een verslag van de marktconsultatie te publiceren op TenderNed. In het verslag zullen de belangrijkste conclusies van de marktconsultatie opgenomen worden. In verband met dit verslag wijst Rijkswaterstaat marktpartijen uitdrukkelijk op het volgende:

1. Het verslag wordt openbaar gepubliceerd. Marktpartijen verlenen middels deelname toestemming aan Rijkswaterstaat om hun beantwoording en andere door hen verstrekte informatie en/of gegevens te gebruiken in dit verslag.
2. De beantwoording en andere informatie en/of gegevens zal/zullen geanonimiseerd en generiek in het verslag worden opgenomen. Het verslag zal een bijlage bevatten waarin alle marktpartijen worden benoemd die hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomst en het vervolg van deze marktconsultatie.

2.2 **Vertrouwelijkheid en overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie**

De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal Rijkswaterstaat zorgen dat de informatie die tijdens de marktconsultatie door Rijkswaterstaat is gedeeld voor alle partijen toegankelijk is tijdens de aanbestedingsprocedure.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft daarom geen consequenties (voor- of nadeel) inzake een latere aanbesteding.

Indien een partij wordt uitgenodigd voor een verdiepend gesprek zal de naam en organisatie worden geregistreerd ten behoeve van de uitnodiging (via TenderNed).

In de terugkoppeling van de resultaten worden de namen van de organisaties opgenomen die hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomst, de vragenlijst hebben beantwoord en hebben deelgenomen aan de verdiepende gesprekken. Dit verslag wordt op TenderNed gepubliceerd.

Voortschrijdend inzicht of veranderende omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van een aanbesteding of contract) wordt verstrekt. Daarom kunnen er aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt geen rechten worden ontleend.

Rijkswaterstaat geeft geen vergoeding voor het deelnemen aan deze marktconsultatie.

3 Vragen

3.1 Algemeen

Hieronder staan een aantal vragen gericht op de aanbesteding, contractering en uitvoering van het project B.R.U.G. Ten eerste staan een aantal algemene vragen centraal, vervolgens wordt op verschillende thema's ingezoomd. Deze zijn:

- 1) Scoping van de raamovereenkomst
- 2) Samenwerken
- 3) Lerend vermogen
- 4) Aanbesteden van de raamovereenkomst
- 5) Veiligheid en duurzaamheid
- 6) Reflectie en toekomst

Deze thema's wil RWS graag vroegtijdig met de markt preciseren om zo optimaal kansen te benutten en de aanbesteding en het contract optimaal in te richten.

Rijkswaterstaat verzoekt u om per antwoord niet meer dan 5 regels toelichting te hanteren, tenzij anders aangegeven.

Rijkswaterstaat heeft de volgende algemene(re) vragen:

1. In welke branche bent u actief en waarom is dit project voor u interessant?
2. Kunt u uw top 3 opdrachtnemersrisico's op basis van dit marktconsultatiedocument aangeven? En hoe kunt u deze voorkomen c.q. beheersen? Kan Rijkswaterstaat hier nog een rol in spelen? Gaarne in maximaal 10 regels toelichten.

3.2 Thema 1: Scoping van de raamovereenkomst

Rijkswaterstaat is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten om zo snel urgente opdrachten te kunnen opdragen en op lange(re) termijn opdrachtnemer(s) aan zich te binden. Bovendien is de scope onvoorspelbaar en kent deze een grote discrepantie tussen de verwachte scope en het budget. Dit heeft mogelijk periodes van droogte en periodes van weelde tot gevolg. RWS zoekt naar manieren om – met de markt – hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. In elk geval betreft de af te sluiten raamovereenkomst 1 perceel ten behoeve van het areaal bruggen binnen PPO Oost-Nederland. Dit betreft naar verwachting circa 30 bruggen waar groot onderhoud aan wordt verwacht. Opgemerkt zij dat V&R buiten beschouwing van dit project wordt gelaten.

3. Ziet u kansen en/of risico's in het omgaan met bovengenoemde discrepantie? Gaarne in maximaal 10 regels toelichten.
4. Heeft u suggesties om de onvoorspelbare scope voorspelbaarder te maken?
5. Welk minimum aan groot onderhoud van bovengenoemde 30 bruggen zou u gegarandeerd willen zien?

In het rapport [Typologie Kunstwerken seriematig aanbesteden](#), gepubliceerd door Platform Bruggen, wordt gesproken over regio-overstijgende aanpak van brugonderhoud waarin samenwerking van kleine en grote beheerders wordt geadviseerd.

6. Hoe denkt u dat dit advies is in te passen in B.R.U.G.?



Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om het kleine onderhoud middels het prestatiecontract Kunstwerken Oost-Nederland uit te laten voeren, het groot onderhoud middels B.R.U.G. en de V&R-opgave separaat op de markt te zetten. Hiervoor is een kunstmatig onderscheid geschept tussen klein en anderzijds groot onderhoud.

7. Is dit kunstmatig onderscheid voor u werkbaar, zo nee ziet u manieren om dit onderscheid concreter c.q. meer afgekaderd te formuleren of ziet u alternatieven?
8. Rijkswaterstaat heeft voor de invulling van de raamovereenkomst een aantal invalshoeken in beeld en wil deze graag aan u toetsen:
 - a. Eén raamovereenkomst voor de gehele scope bruggen PPO Oost-Nederland;
 - b. 3 opdrachtnemers binnen deze raamovereenkomst;
 - c. Elke opdrachtnemer beheerst alle disciplines in alle fases (ontwerp, staal, beton, asfalt, IA, verkeer, voegen, opleggingen, tuinen);
 - d. De looptijd is ca. 8 jaar, dit is aangepast op de resterende looptijd van het prestatiecontract *Kunstwerken Oost-Nederland*;
 - e. Nadere overeenkomsten worden alleen op basis van prijs opgedragen;
 - f. Nadere overeenkomsten worden gerouleerd opgedragen aan de 3 opdrachtnemers.
9. Hoe kan RWS acteren indien geen prijsovereenstemming wordt bereikt bij het opdragen van een Nadere Overeenkomst?

3.3 Thema 2: Samenwerken

Rijkswaterstaat wil graag goed en bestendig gaan samenwerken met de markt en geeft hiermee invulling aan de doelstellingen van *Op weg naar Vitale Infrastructuur*. Om zo vroegtijdig samenwerking mogelijk te maken wil RWS de opdrachtnemer betrekken bij de initiële projectvorming (POF-proces). Dit is een iteratief proces dat uitmondt in de aan te besteden scope van een project/Nadere Overeenkomst.

10. Hoe ziet u idealiter het verschil tussen de dagelijkse en zakelijke afstemming met opdrachtgever?
11. Welke kansen en risico's ziet u aangaande de interne besluitvorming, financiën en mogelijke andere efficiëncyslagen in deze vroegtijdige samenwerkingsvorm?
Gaarne in maximaal 10 regels toelichten.
12. De Nadere Overeenkomsten kennen een complex stakeholderlandschap. Dient de overeenkomst ook efficiëncyslagen te bevatten op het gebied van communicatie en stakeholder management zoals bijvoorbeeld in het kader van het onderliggend wegennet, de regio, het (hoofd)vaarwegennet of de verkeersdoorstroming?
Gaarne beantwoorden met ja/nee.
13. Moet de communicatie hierin worden gestimuleerd en door RWS worden gefaciliteerd?
Gaarne beantwoorden met ja/nee.

3.4 Thema 3: Lerend vermogen

Rijkswaterstaat wil graag de parate kennis over brugonderhoud en het lerend vermogen van de markt en haar eigen organisatie vergroten en bestendigen. Hiertoe stelt RWS voor om leerervaringen van opdrachtnemers breder en met elkaar te delen.

14. Bent u bereid uw leerervaringen te delen? Gaarne beantwoorden met ja/nee.
 - a. Met andere opdrachtnemers van de raamovereenkomst?
 - b. Marktbreed
15. Hoe kan RWS het opdoen van leerervaringen en het verwerven en delen van kennis opnemen in het B.R.U.G. contract?
16. Hoe waarderen jullie de technisch inhoudelijke kennis m.b.t. onderhoud aan bruggen van RWS Oost-Nederland?

3.5 Thema 4: Aanbesteden van de raamovereenkomst

Rijkswaterstaat wil het B.R.U.G. contract gunnen op basis van EMVI-BPKV. De aanbestedingswet schrijft voor dat bij de gunning van een aanbesteding een prijscomponent meegewogen dient te worden.

17. Hoe stelt u voor om de prijscomponent bij het gunnen van deze aanbesteding op te nemen?
18. Hoe stelt u voor om de indexering van de bij inschrijving op de raamovereenkomst opgegeven prijzen in te vullen?
19. Welke kwaliteitscriteria zijn in uw ogen geschikt om toe te passen?
20. Wat zijn uw ervaringen met het gunnen op samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, bijvoorbeeld door het houden van assessments en ziet u hierin meerwaarde voor B.R.U.G.?

3.6 Thema 5: Veiligheid en duurzaamheid

Rijkswaterstaat kijkt ook naar de omgeving van het project, en wil graag inzoomen op de subthema's veiligheid en duurzaamheid. Veiligheid staat buiten kijf; vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Gouvernance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. RWS is een van deze ondertekenaars en heeft zich tot de Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) verplicht. Echter door de specifieke omstandigheden (veelal doorgaand verkeer rondom de werkzaamheden) binnen het project is de vraag hoe de veiligheid aanvullend kan worden vergroot en geborgd.

Ook duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid. Inzetten op een duurzame leefomgeving is onderdeel van de missie van Rijkswaterstaat. Met het opstellen van de Strategie klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten (KCI) heeft Rijkswaterstaat tot doel om in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken en circulair te werken. Hiertoe is o.a. het Transitiepad Kunstwerken ingericht dat zich richt op het duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. Binnen aanbestedingen heeft duurzaamheid middels gebruik van de CO2-ladder en optimaliseren van de MKI-waarde een vaste plaats gevonden.

21. Welke eisen en/of wensen zou RWS aanvullend op de standaard ARBO-bouwplaatsveiligheidseisen en eisen t.a.v. verkeersdoorstroming kunnen stellen binnen het project B.R.U.G.?
22. Hoe kan het aspect duurzaamheid worden meegenomen als kwaliteitscriterium?



23. Welke eisen en/of wensen zou RWS aanvullend op de standaard duurzaamheid eisen kunnen stellen binnen het project B.R.U.G.?

3.7

Thema 6: Reflectie en toekomst

24. Heeft u nog overige opmerkingen, reacties of suggesties ten aanzien van de contract- en aanbestedingsvoorbereiding en/of het project? Gaarne deze in maximaal 10 regels toelichten.

4. Aanbestedingsplanning en marktbenadering

Rijkswaterstaat is voornemens de raamovereenkomst via een concurrentiegericht dialoge te contracteren. Er zal naar 4 partijen getrechterd worden. Gunning vindt plaats via EMVI-BPKV. De aanbesteding wordt naar verwachting in Q3 2023 op TenderNed gepubliceerd. Voor mogelijke mutaties verwijst Rijkswaterstaat naar de reguliere aanbestedingsplanning welke periodiek wordt gepubliceerd.
