

Schouw

Aanbestedingstraject
Vernieuwbouw Lentiz | Groen
van Prinstererlyceum te
Vlaardingen



Even voorstellen

- Sjors van Egmond
- Onyx Vastgoedstrategie
- Projectmanager vernieuwbouw Lentiz | Groen van Prinstererlyceum
- Adjust Amstelveen ondersteuning Europese aanbesteding



Lentiz | V(MBO) Maasland



Lentiz | LIFE College Schiedam

Planning van vandaag

- Toelichting op het project
 - Bouwheerschapp school en sporthal
 - Vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum
 - Nieuwbouw NOC*NSF sporthal
- Planning
- Concretiseringsfase en engineeringsfase
- Rondgang schoolgebouw
- Aanbestedingsprocedure

Toelichting op het project

Bouwheerschap door Lentiz

Vernieuwbouw Groen van Prinstererlyceum

- Renovatie
- Nieuwbouw

Nieuwbouw NOC*NSF Sporthal



Planning

Fase 0

Voorbereiding

1 maart
2025

1 juli
2025

1 nov.
2025

1 maart
2026

1 juli
2026

1 nov.
2026

1 maart
2027

1 juli
2027

1 nov.
2027

Fase 1

Sloop + tijdelijke voorzieningen

Fase 2

Nieuwbouw + vernieuwbouw gymzalen

Fase 2a

Nieuwbouw sporthal

Fase 3

Sloop + strippen rijksmonument

Fase 4

Vernieuwbouw rijksmonument

Fase 5

Sloopwerk gymzaal + afwerken gevel

Schouw 10 juli 2024 - Vlaardingen

Fase 1: juli 2025 tot eind augustus 2025

Sloopwerk bestaand deel gebouw
Tijdelijke voorzieningen bouwkundig werk
Tijdelijke voorzieningen installaties




Bouwterrein



School





Sporthal

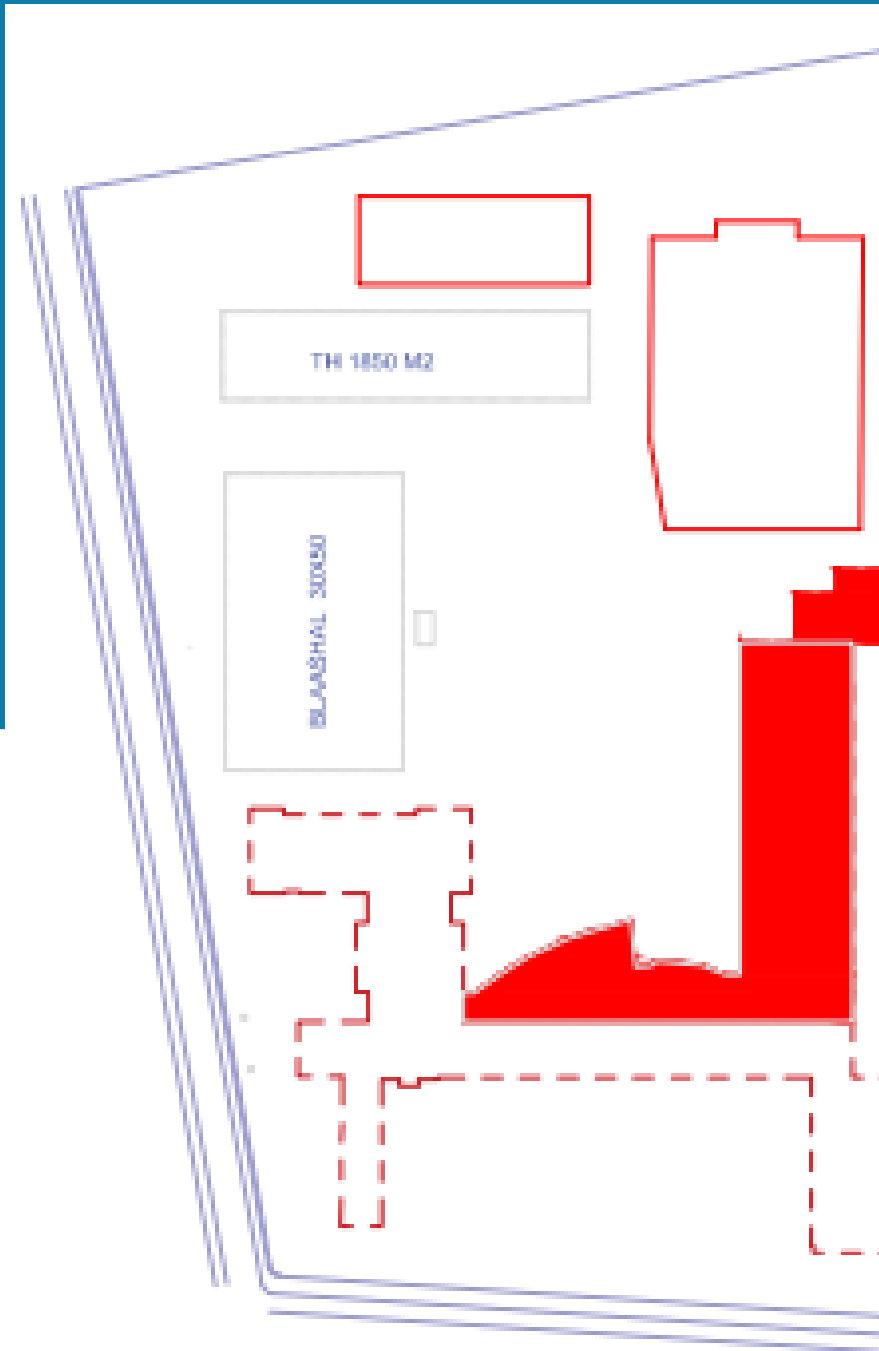

Fase 2: eind augustus 2025 tot juli 2026

Nieuwbouw en vernieuwbouw van
bestaande gymzalen

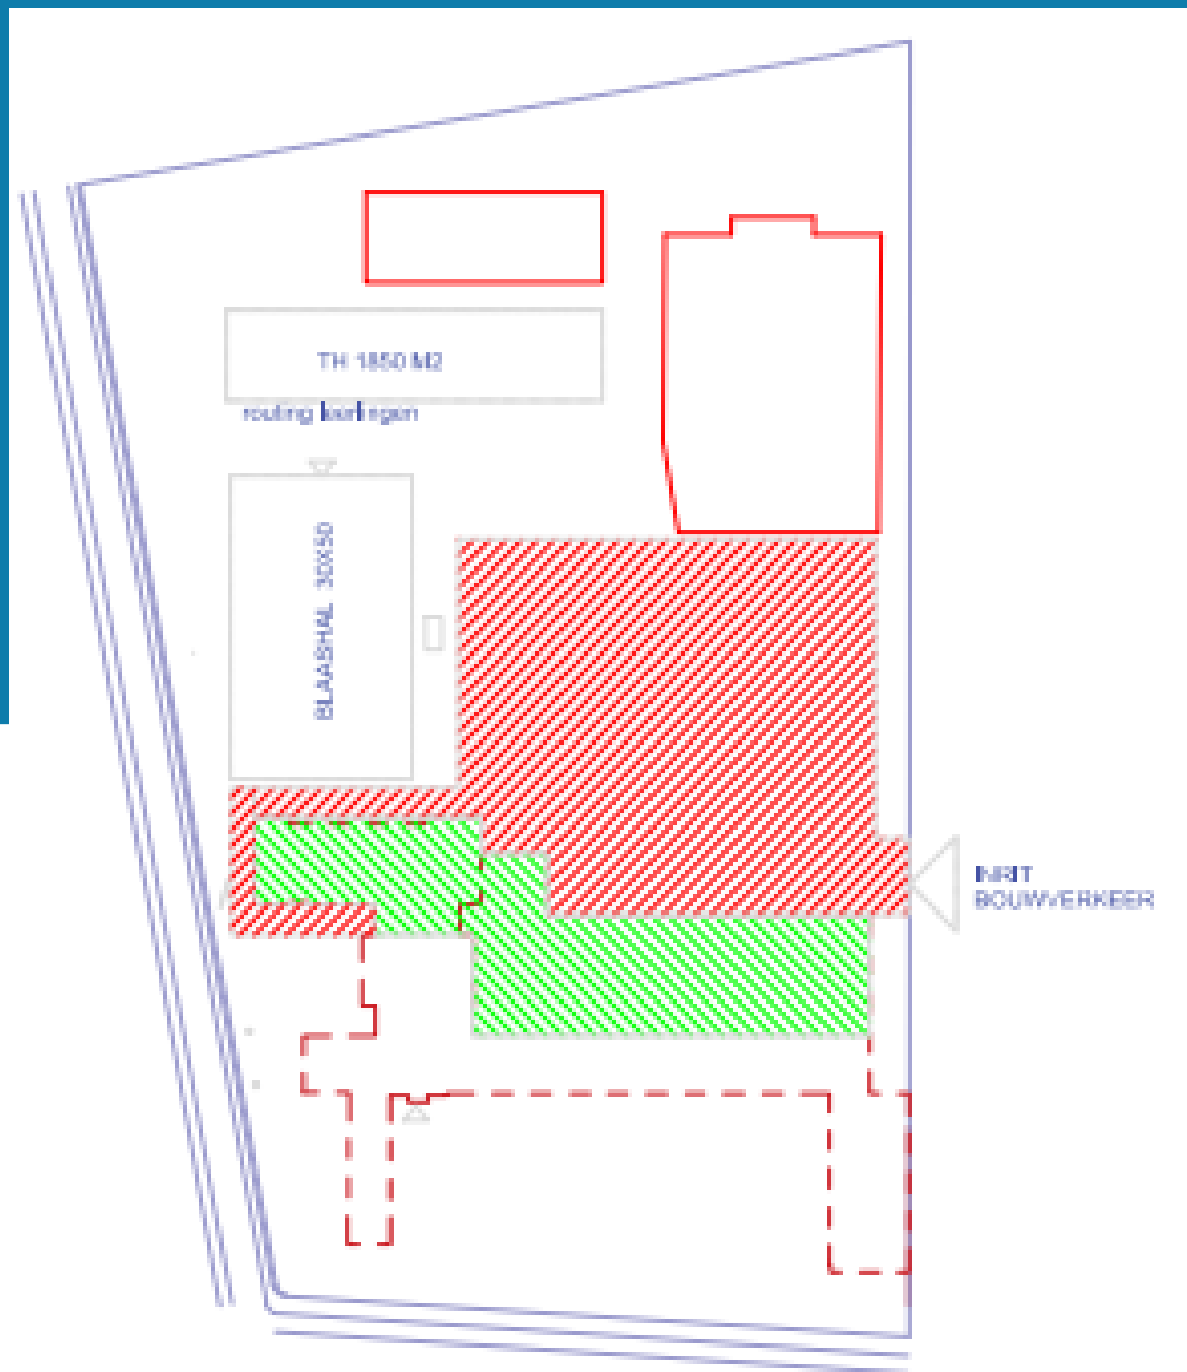

Fase 2a: begin 2026 Eind 2026

Nieuwbouw en vernieuwbouw van
bestaande gymzalen
Nieuwbouw sporthal




Bouwterrein



School



Sporthal

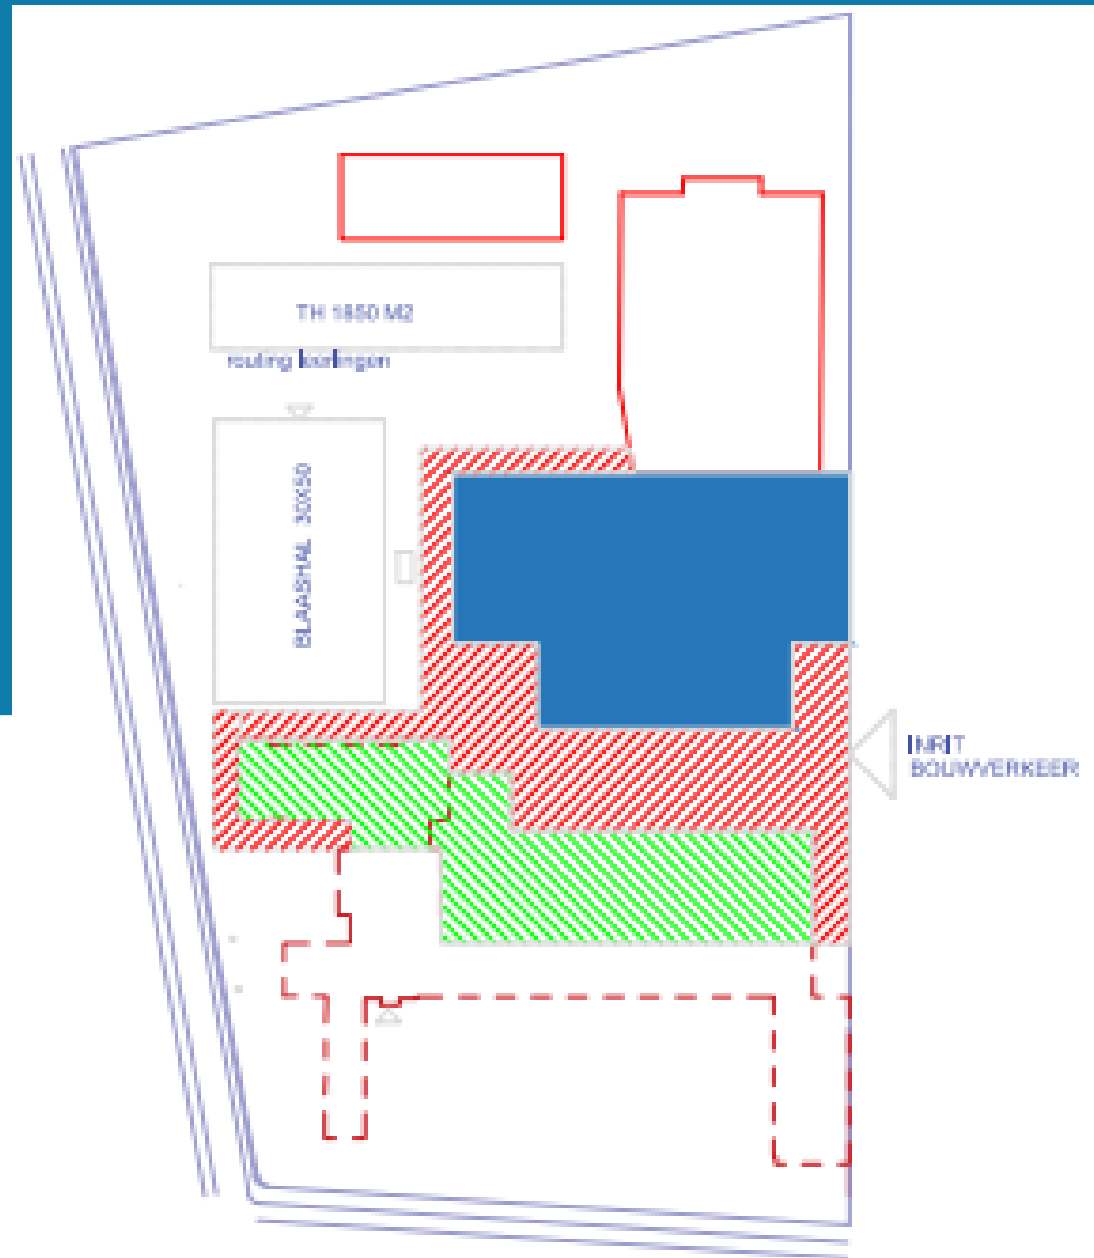

Fase 3: zomer 2026

Strippen rijksmonument en bouw sporthal




Bouwterrein



School




Sporthal

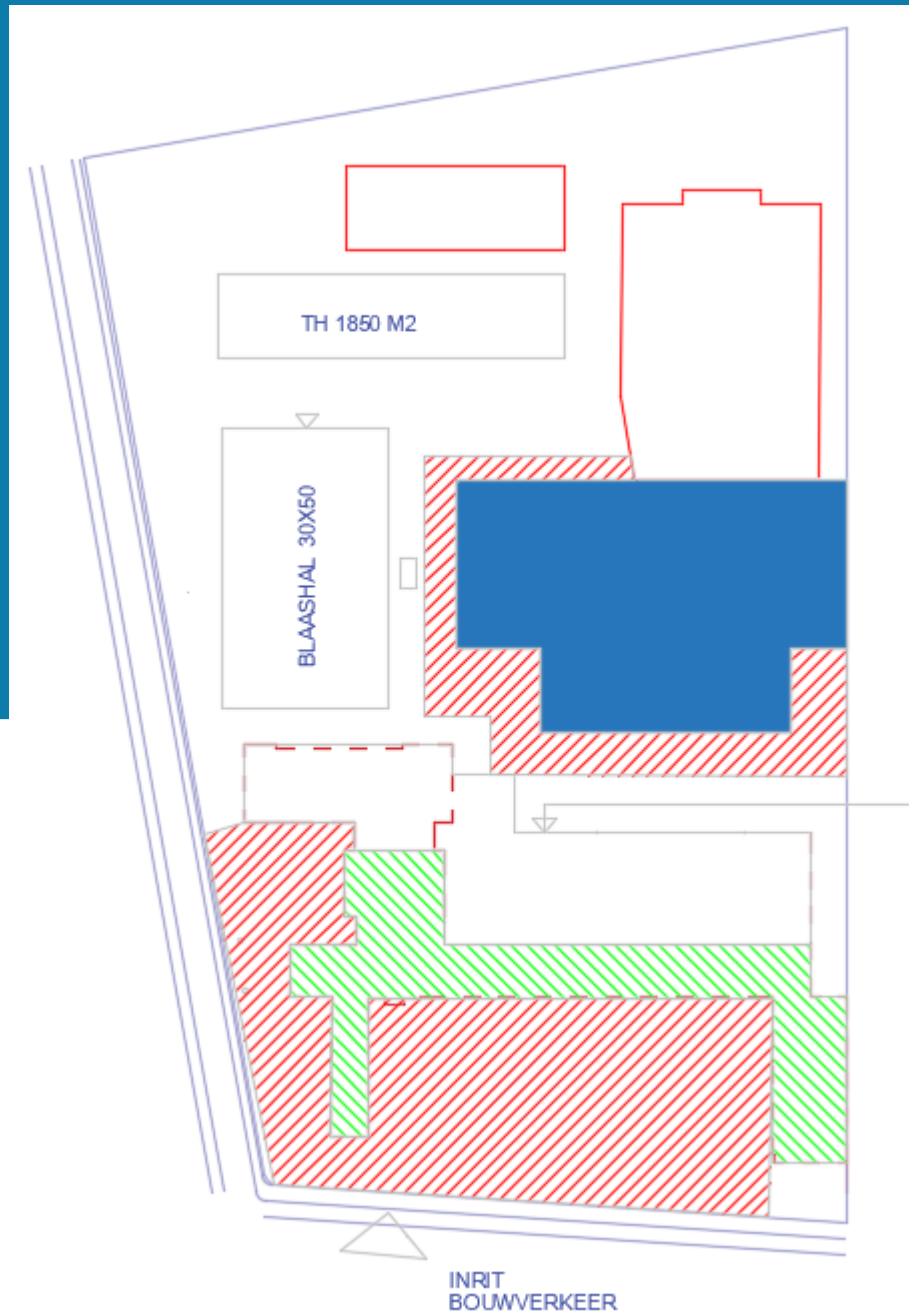

Fase 4: september 2026 tot juli 2027

renovatie rijksmonument en bouw sporthal

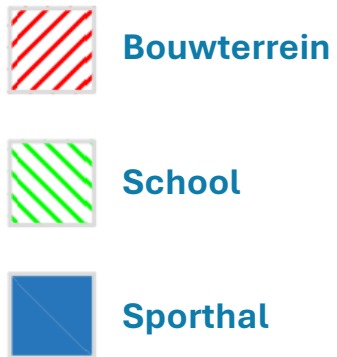

Fase 5: juli 2027 tot september 2027

Sloopwerk bestaande gymzaal
Afwerken geven t.p.v. sloopwerk




Bouwterrein



School



Sporthal

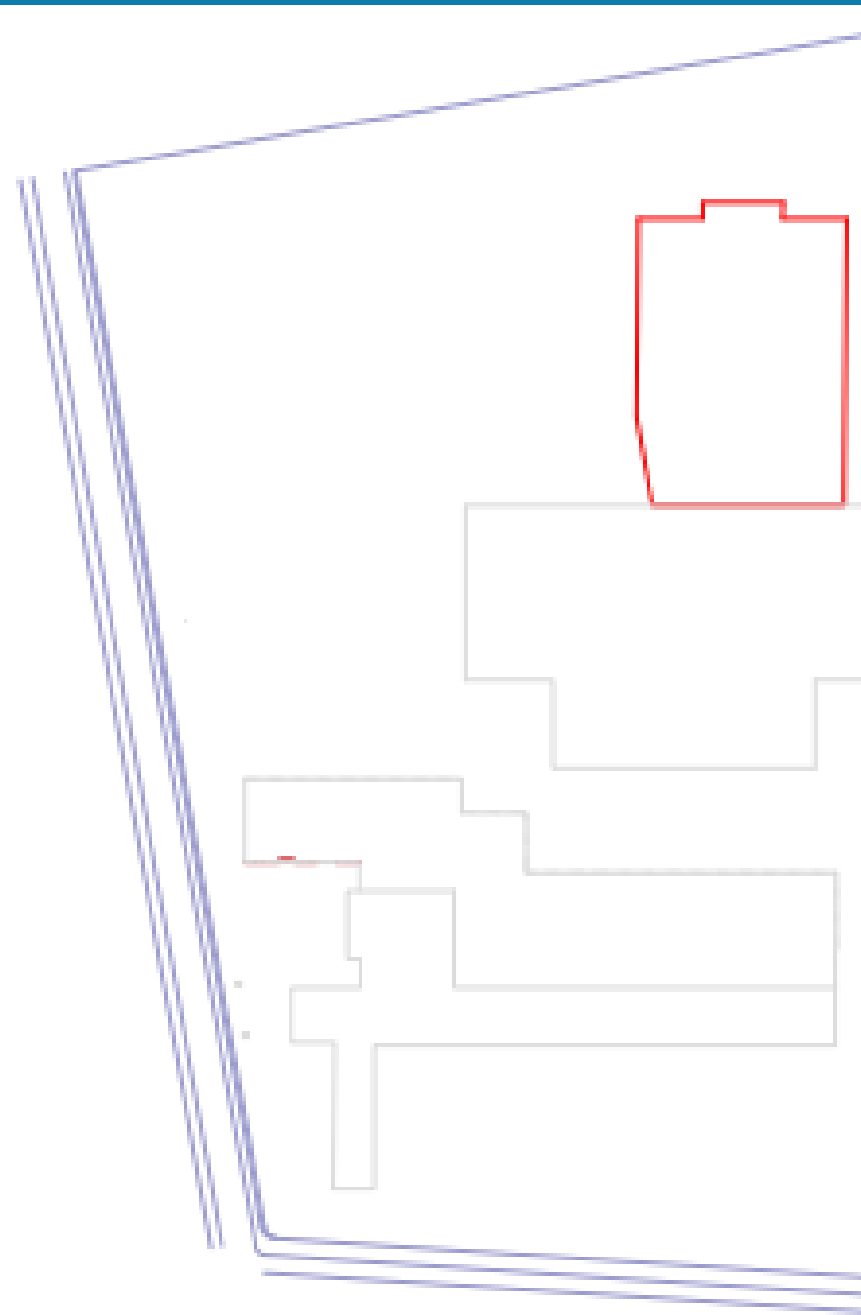

Concretiseringsfase en engineeringfase

- Wat moet opgeleverd worden?
- Onderlinge afspraken



Rondgang door het schoolgebouw
