



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

BPKV en trechtering



informereren



vragen / dilemma's bespreken

Leon Tammes & Kristin Nelis



Overkoepelend BPKV-criteria

- Criteria soortgelijk als bij aanbesteding Noordtunnel
- Voornemen: 3 criteria
- Qua slots: Niet sneller, maar betrouwbaar en voorspelbaar
- Voornemen: duurzaamheid niet in BPKV maar in extra eisen in het contract. MKI niet als BPKV-criterium



Weging prijs/kwaliteit

- Inzetten op kwalitatief goede plannen loont.
- Minimale uitgangspunt: één punt hoger op het belangrijkste kwalitatieve plan maakt het goed ten opzichte van een lagere prijs.



Huidige denkrichting BPKV


- Robuuste aanpak ombouwslots
- Onzekerheden variabel deel minimaliseren gedurende doorgrondingsfase
- Testen en inzet testomgeving

Niet al geprioriteerd of voorzien van een weging



Robuuste aanpak ombouwslots

Ombouwplan en zoekvensters voor hinderslots

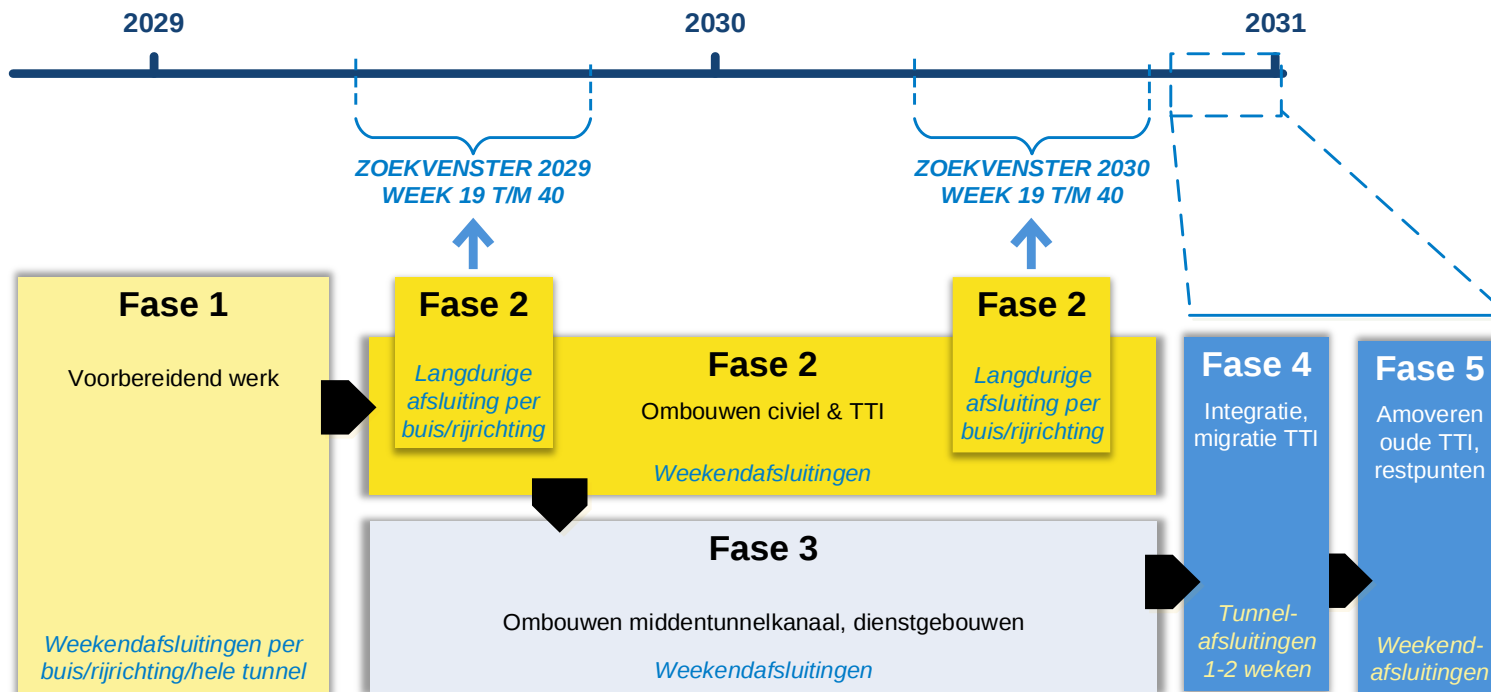

Deze plaat is op hoofdlijnen toegelicht met als doel om het contractueel kader duidelijk te maken, zie hiervoor ook de volgende sheet.



Robuuste aanpak ombouwslots

Contractueel kader (concept)

- Eisen aan slots
- Eisen aan maximaal aantal weekend- en nachtafsluitingen
- Ombouwplan OG wordt niet voorgeschreven. Er zijn wel bindende zaken uit het ombouwplan opgenomen in de Vraagspecificatie.

- Robuuste en efficiënte aanpak voor de afsluitingen.
- Niet sneller maar betrouwbaar, voorspelbaar en efficiënt.
- Maatregelen in periode gunning t/m einde fase 4.


De maatregelen geven blijk van een partij die goed voorbereid aan de slag gaat met een robuust uitvoeringsplan, waarin ruimte is om tegenvallers op te vangen.

De uitdagingen die gepaard gaan met de renovatie van de Drechtunnel zijn goed in beeld en mede vanuit deze uitdagingen worden passende maatregelen genomen om tot een robuuste en efficiënte aanpak van de ombouwslots te komen.



Onzekerheden variabel deel minimaliseren gedurende doorgrondingsfase

- Inschrijver bepaalt zelf, afhankelijk van het risicoprofiel, de verdeling van de beschikbare bandbreedte over de betreffende posten

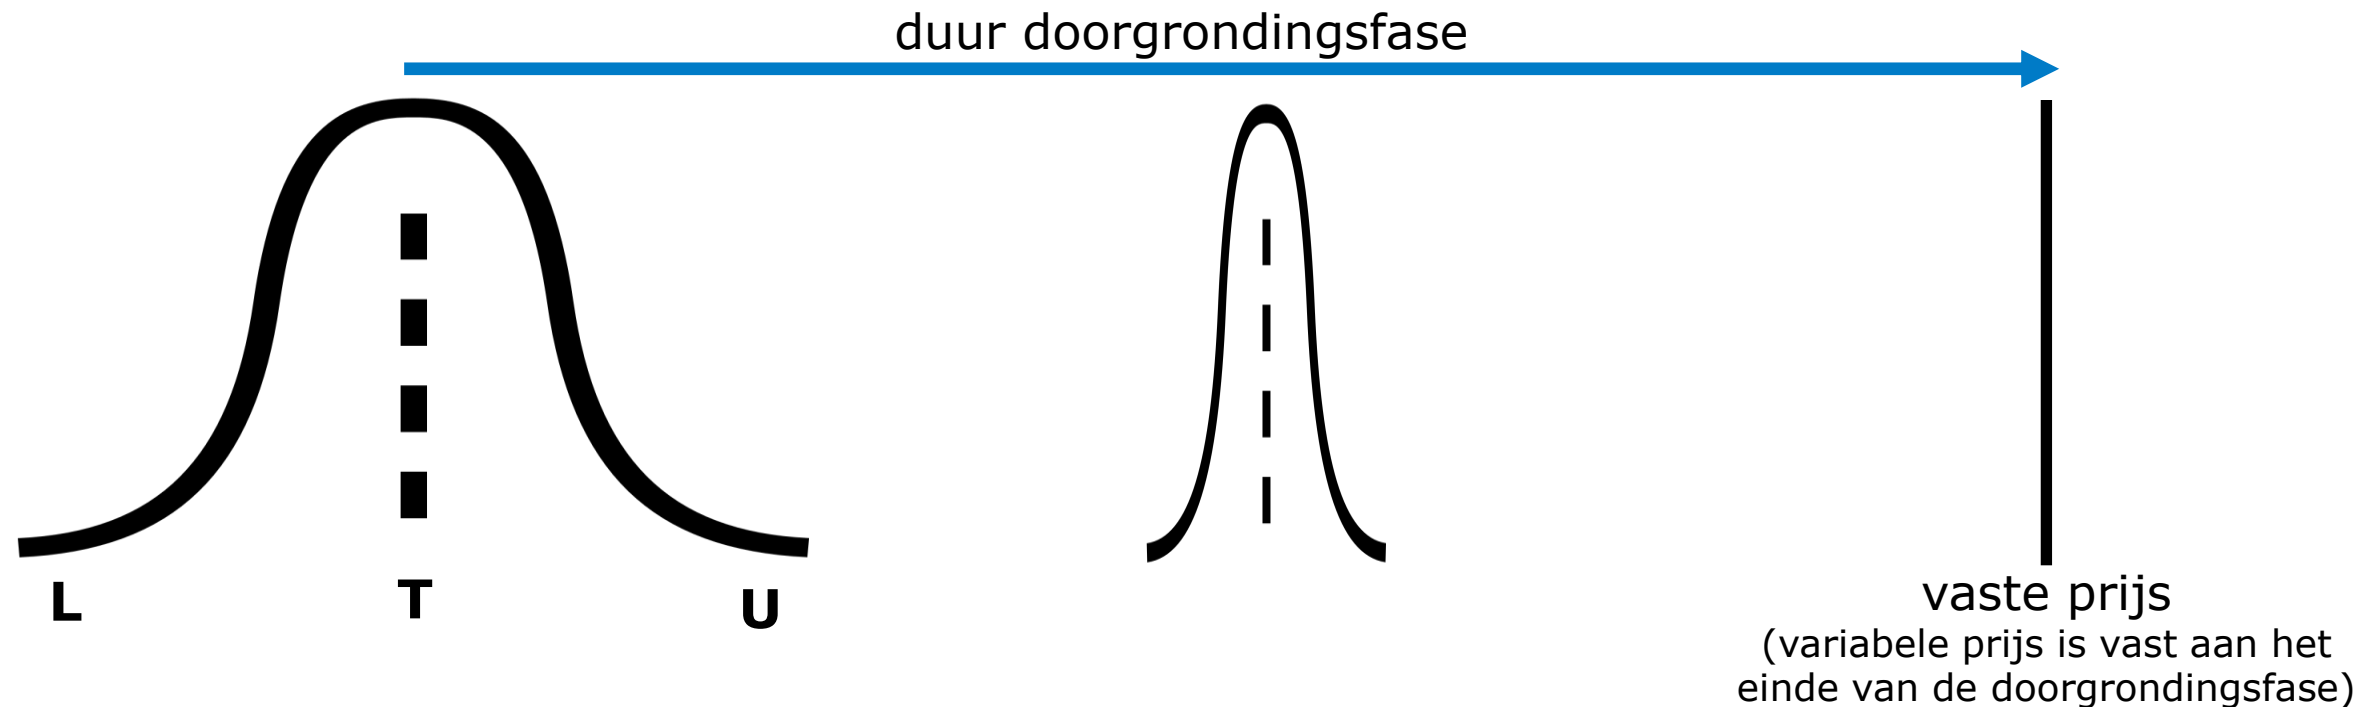



Onzekerheden variabel deel minimaliseren gedurende doorgrondingsfase


- Onzekerheden reduceren zodat de opdracht ten aanzien van het Variabel deel beheersbaar en voorspelbaar wordt.
- Aanpak hoe te komen tot een vaste prijs voor het variabel deel aan het einde van de DGF, aan de hand van inhoudelijke onderwerpen.



Testen en inzet testomgeving

- tijdig, op een gedragen en doorleefde wijze, kwalitatief hoogstaand testen
- De uitdagingen die gepaard gaan met testen en de inrichting van de testomgeving van de Drechtunnel zijn goed in beeld en mede vanuit deze uitdagingen worden passende maatregelen genomen om tijdig, op een gedragen en doorleefde wijze, kwalitatief hoogstaand te testen.

Trechteringsproduct

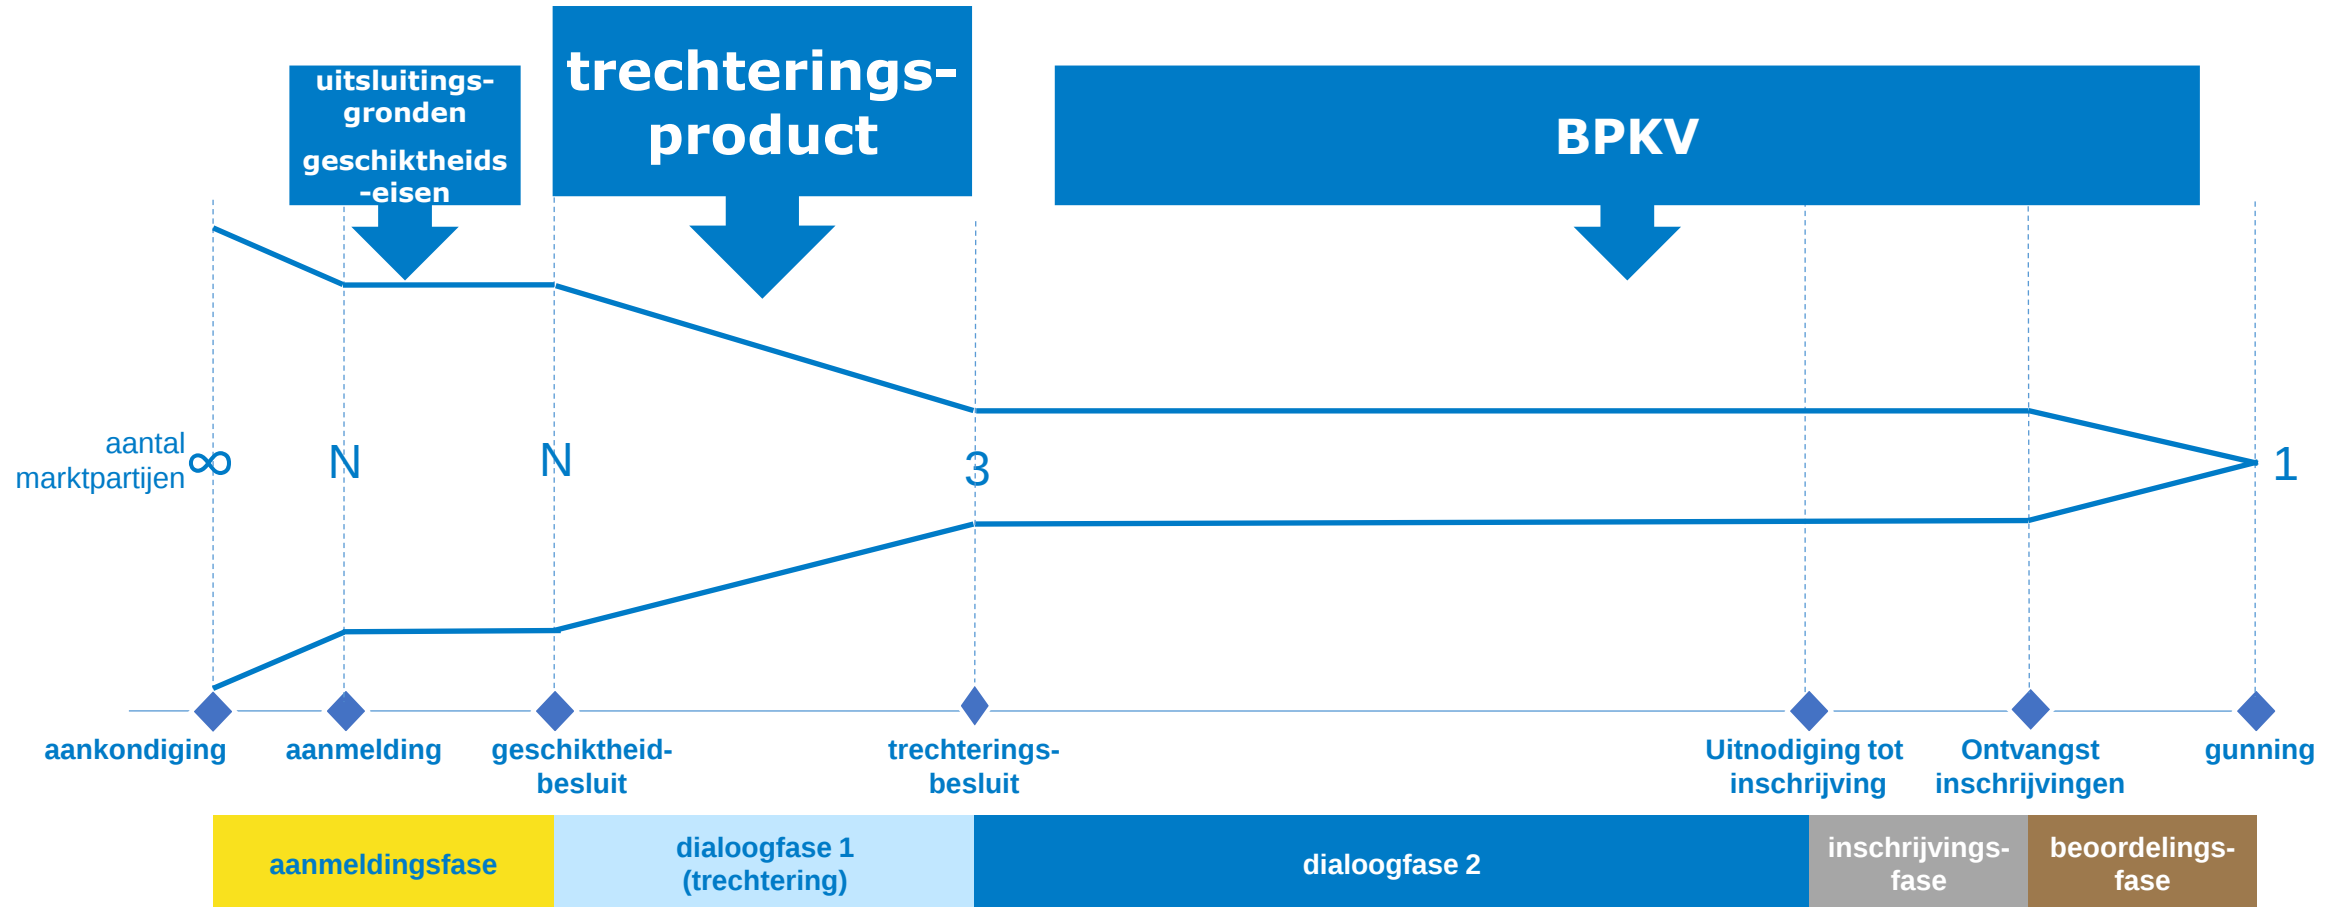

Indien er drie of minder partijen geschikt zijn dan wordt er **niet** getrechterd en wordt er meteen doorgegaan naar dialogofase 2.



Trechteringsproduct

2 belangrijkste kansrijke oplossingsrichtingen voor robuuste aanpak ombouwslots
