



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Deelsessie uitvoeringsplanning

Marktconsultatie PTZ portfolio 2

Jan-Floor Troost, Robin Gerrets, Stijn Muller

9 december 2024






Agenda



Projectplanning



Denkkaders voor uitvoeringsplanning



Ombouwplan en zoekvensters hinderslots




Aan de slag: consultatie





Planning

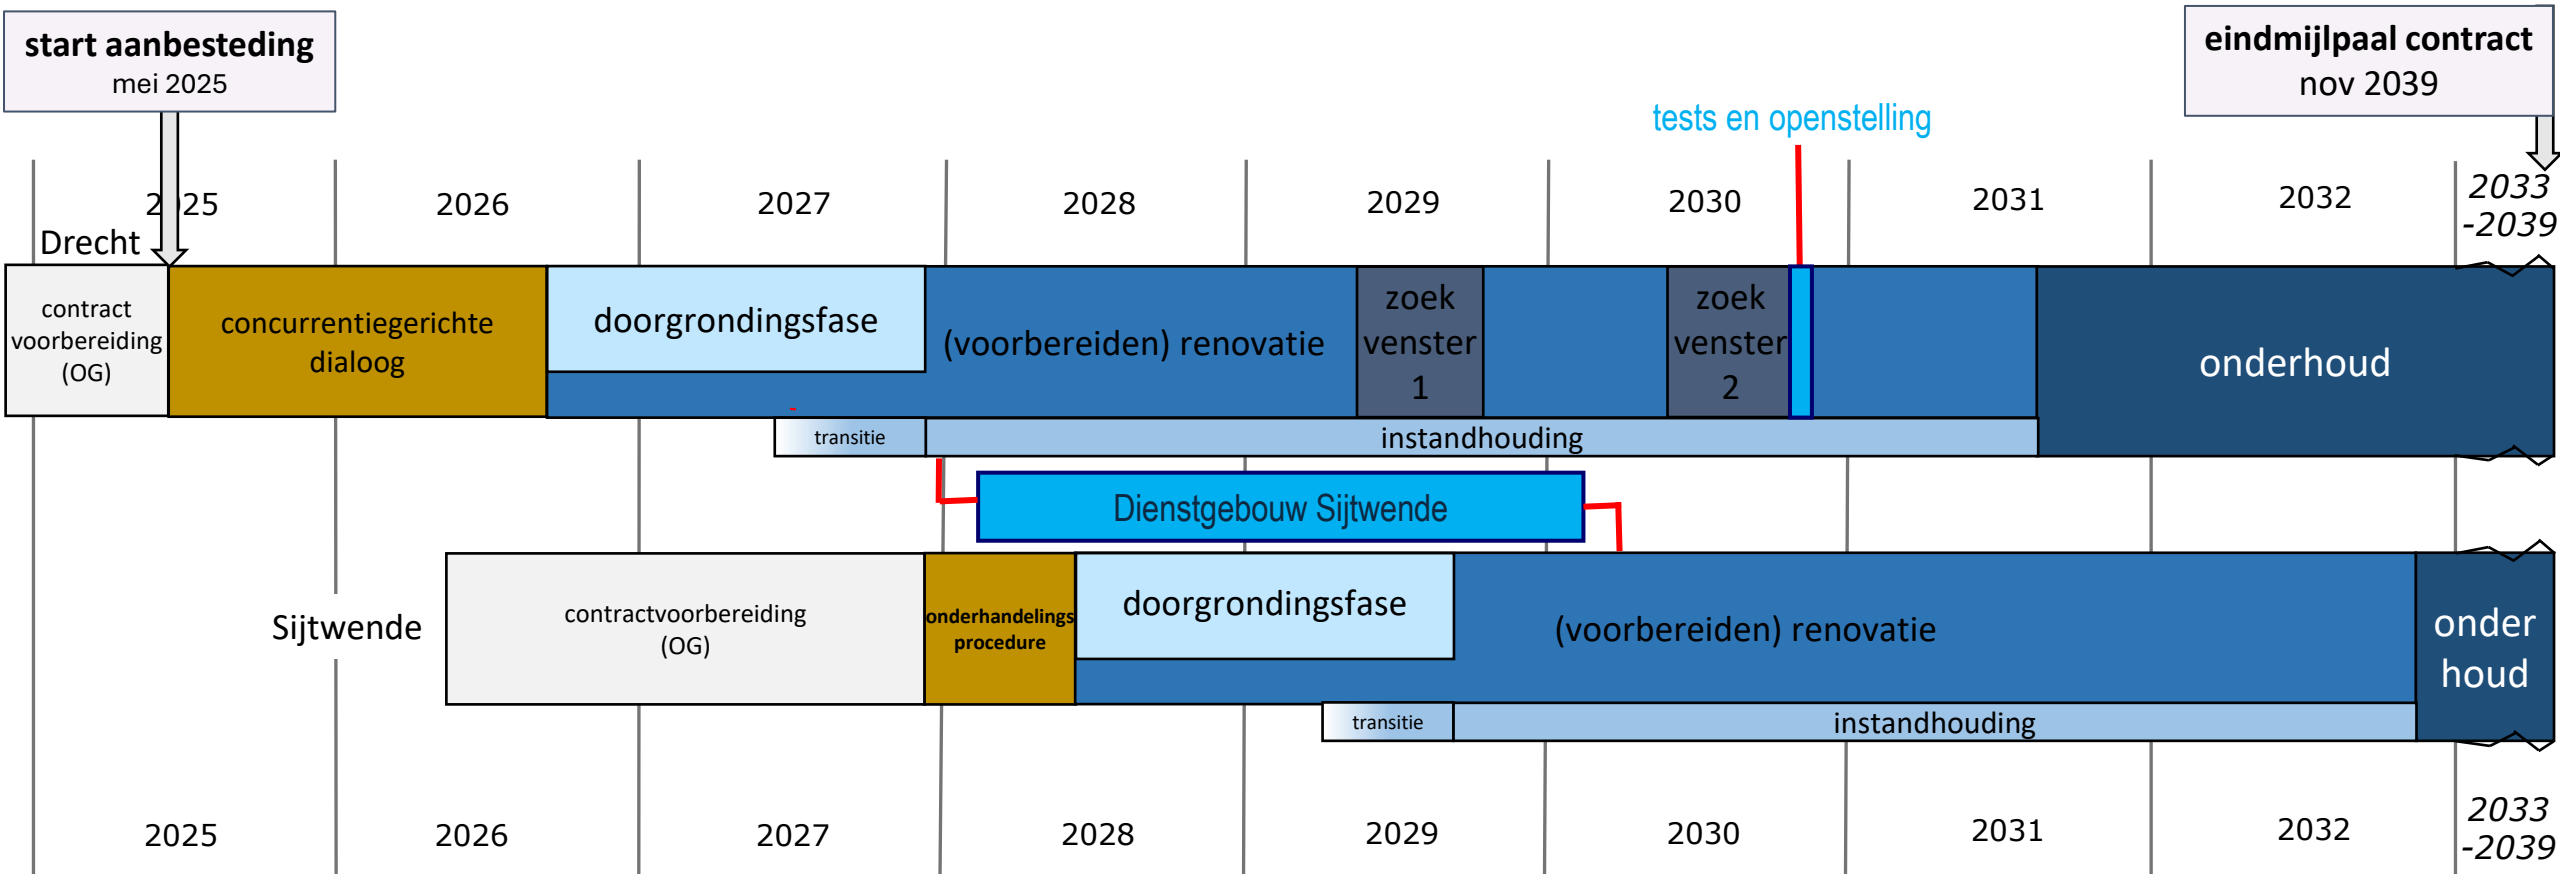



Denkkaders voor uitvoeringsplanning



Dit deel van de deelsessie heeft uitsluitend betrekking op Drechtunnel



De A16 corridor

- Drechtunnel en Van Brienenoordbrug liggen allebei op route Rotterdam – Breda
- We willen verkeershinder beperken door afsluitingen van tunnel en brug op elkaar af te stemmen
- Hinderplanning Drechtunnel is al verder dan Brienenoord, maar ene project is niet ondergeschikt aan andere



Spanningsveld


 Bedrijfseconomisch
Lange, aaneengesloten afsluitingen
Flexibiliteit in planning, veel bufferruimte
Geen dure hindermaatregelen

 Medewerkers
Werken tijdens kantooruren, buiten vakanties
Geen onverwacht overwerk



 Veiligheid
Veiligheid is randvoorwaarde

 Omgeving
Korte afsluitingen in nacht/weekend/vakantie
Hoge voorspelbaarheid hinder
Hinder afgestemd op andere wegenprojecten



Enige uitgangspunten voor ombouwplan

Wat staat vast

Scope van de renovatie

Geen regulier verkeer in werkbuis
(PTZ-brede keuze)

Parallel ombouwen: oude en nieuwe
installaties gelijktijdig aanwezig

Geen tegenverkeer (tweerichtingsverkeer)
in 1 buis

Wat laten we open

Afwijken van hoofdregel van parallel
ombouwen

Wat is nog te bepalen

Nood-/hulpdiensten in werkbuis: discussie
over noodzaak is nog gaande


Wat technisch kan ≠ wat is toegestaan
(door o.a. bevoegd gezag en stakeholders)

→ *Kan niet allemaal vóór aanbesteding
worden afgestemd!*

Omgang met tijdbuffers




Ombouwplan en zoekvensters voor hinderslots

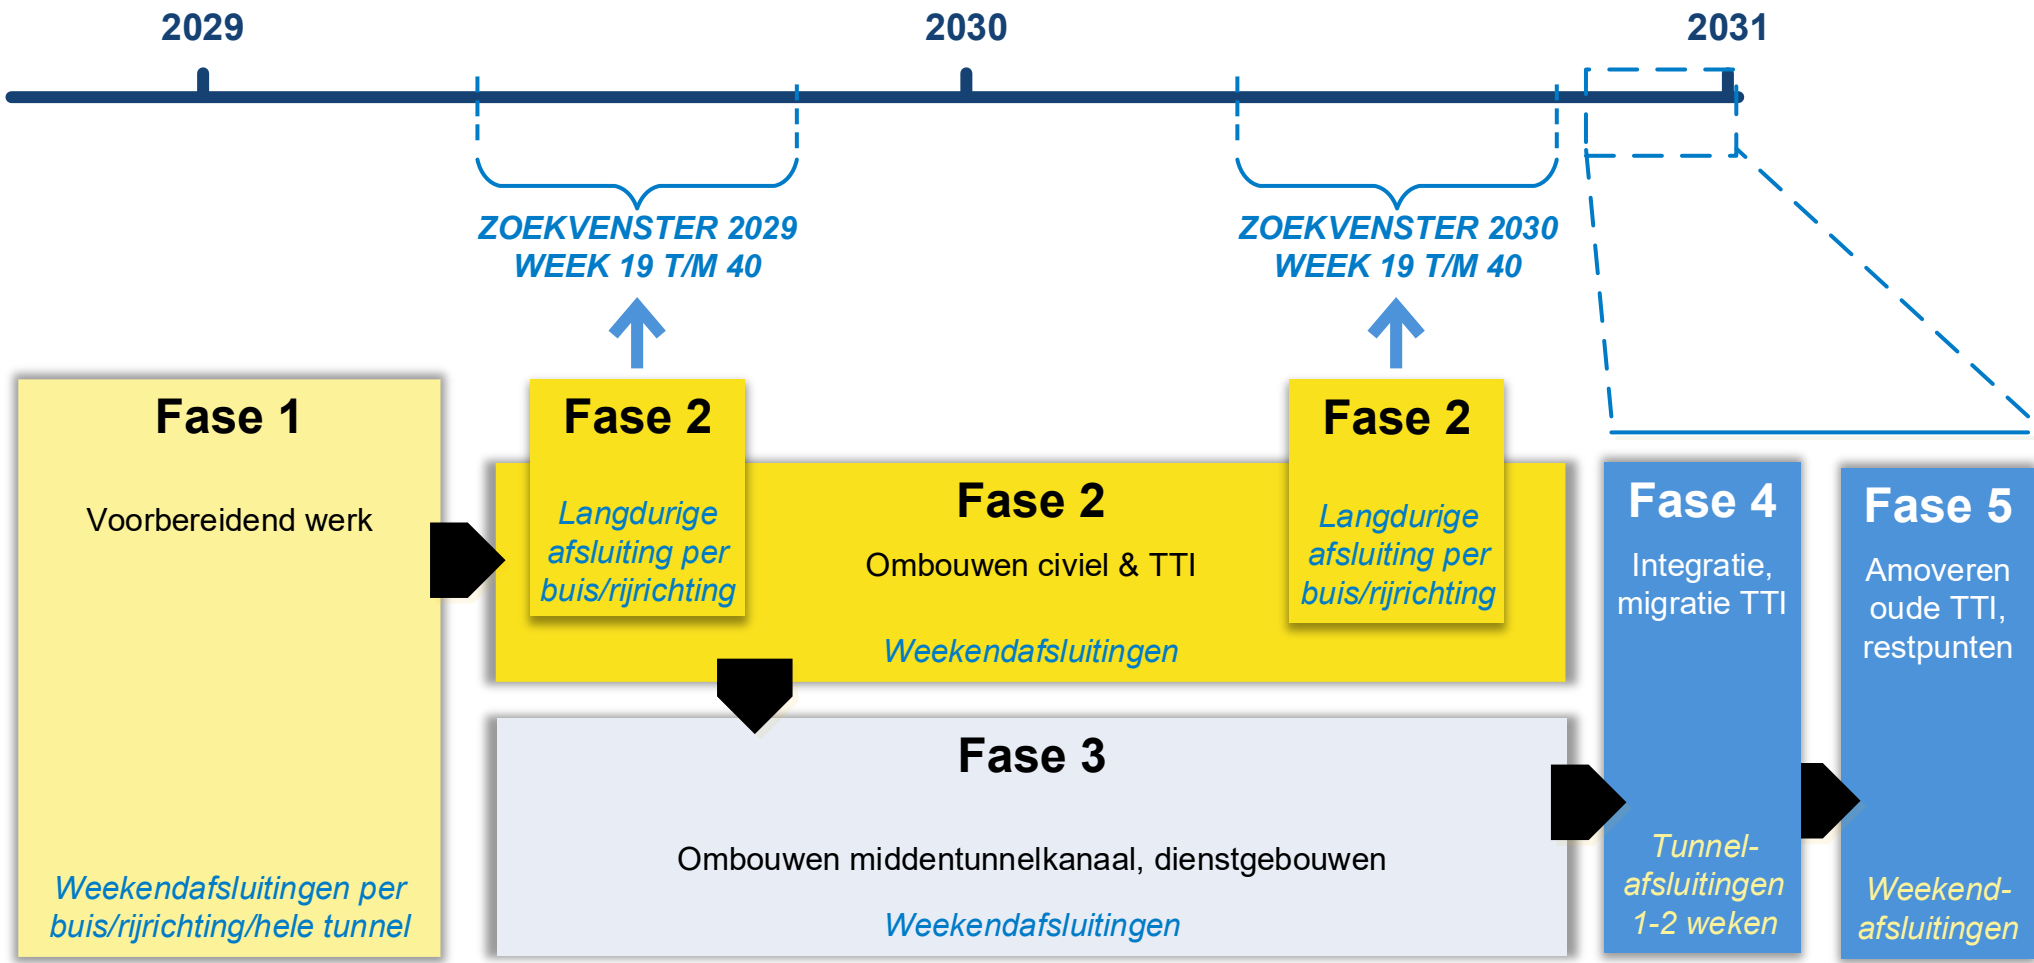



Wat wordt voorgeschreven, wat niet?

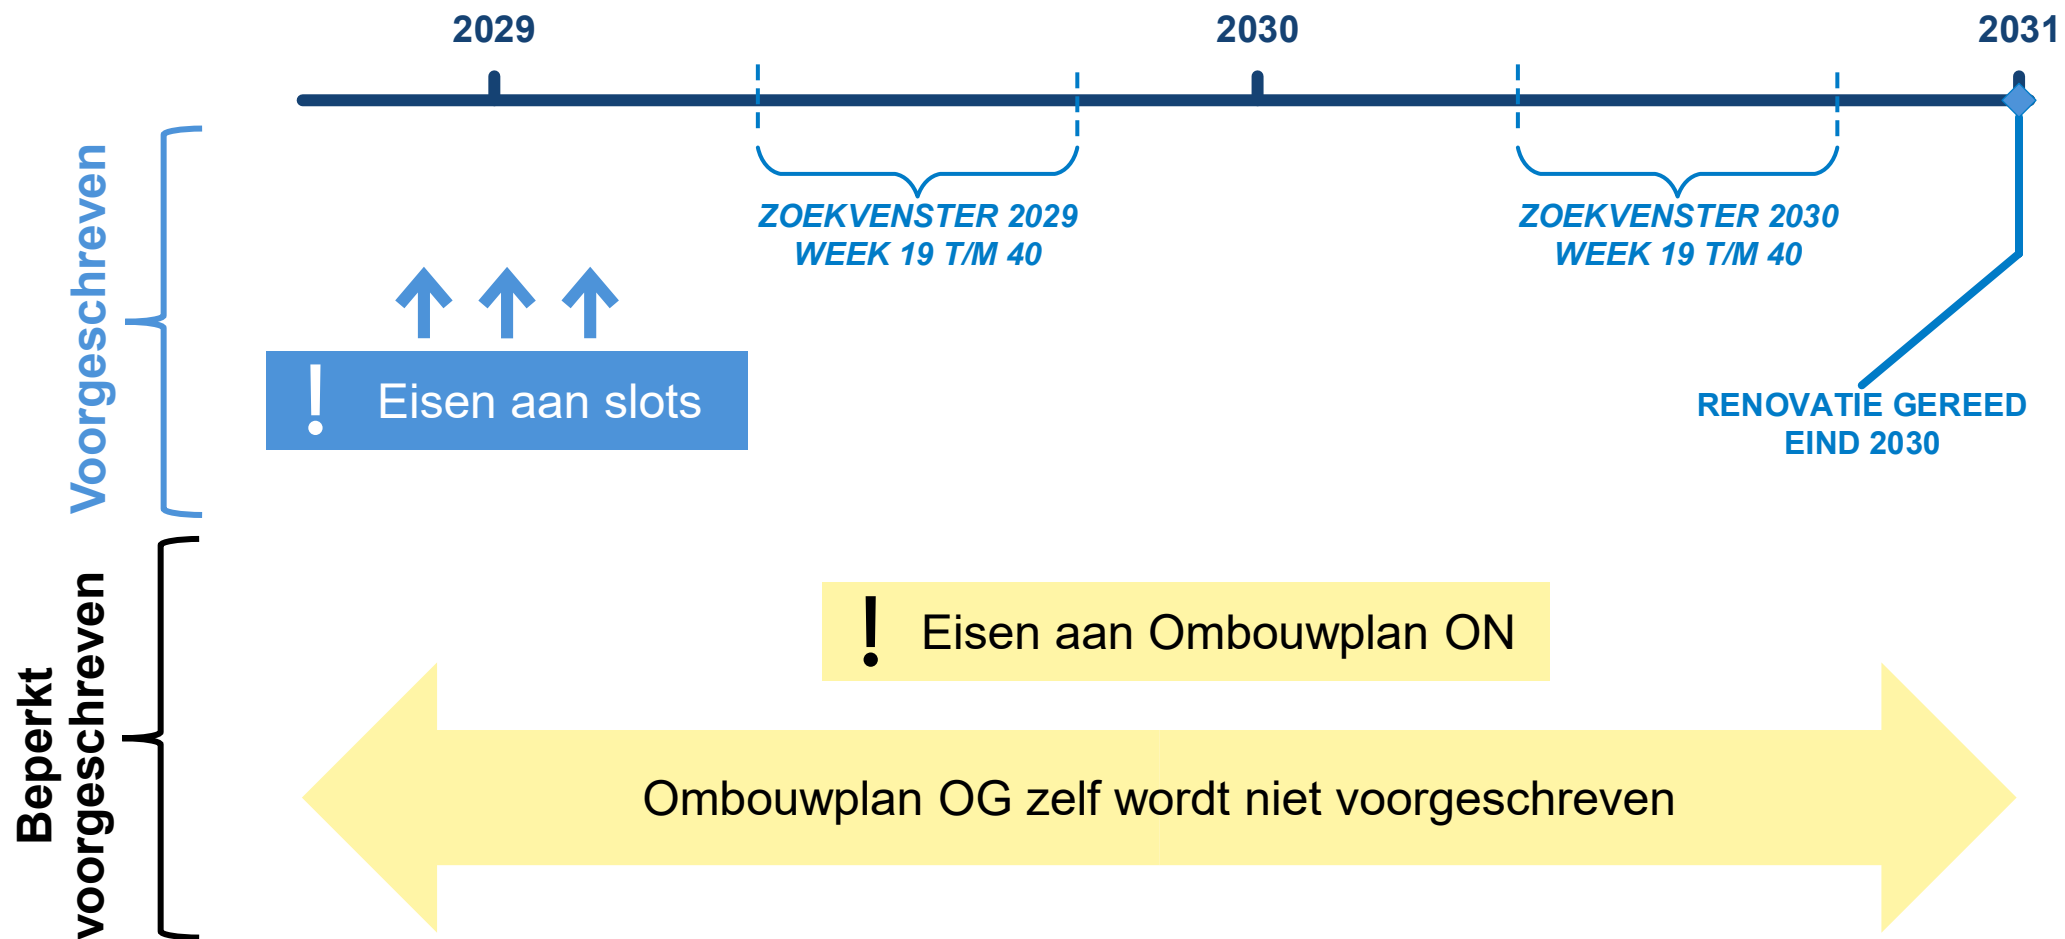




1.

Welke extra informatie heeft u tijdens de aanbesteding nodig om een goede inschrijving te kunnen doen?


2.

Wat is voor u van belang om tot een succesvolle uitvoering van het Werk te komen?

Consultatie

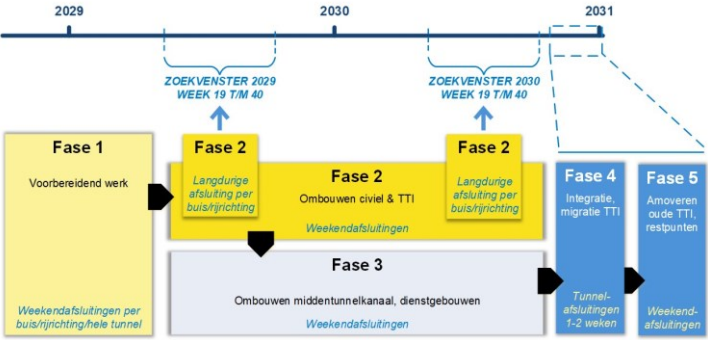

1.
Welke extra informatie heeft u tijdens de aanbesteding nodig om een goede inschrijving te kunnen doen?

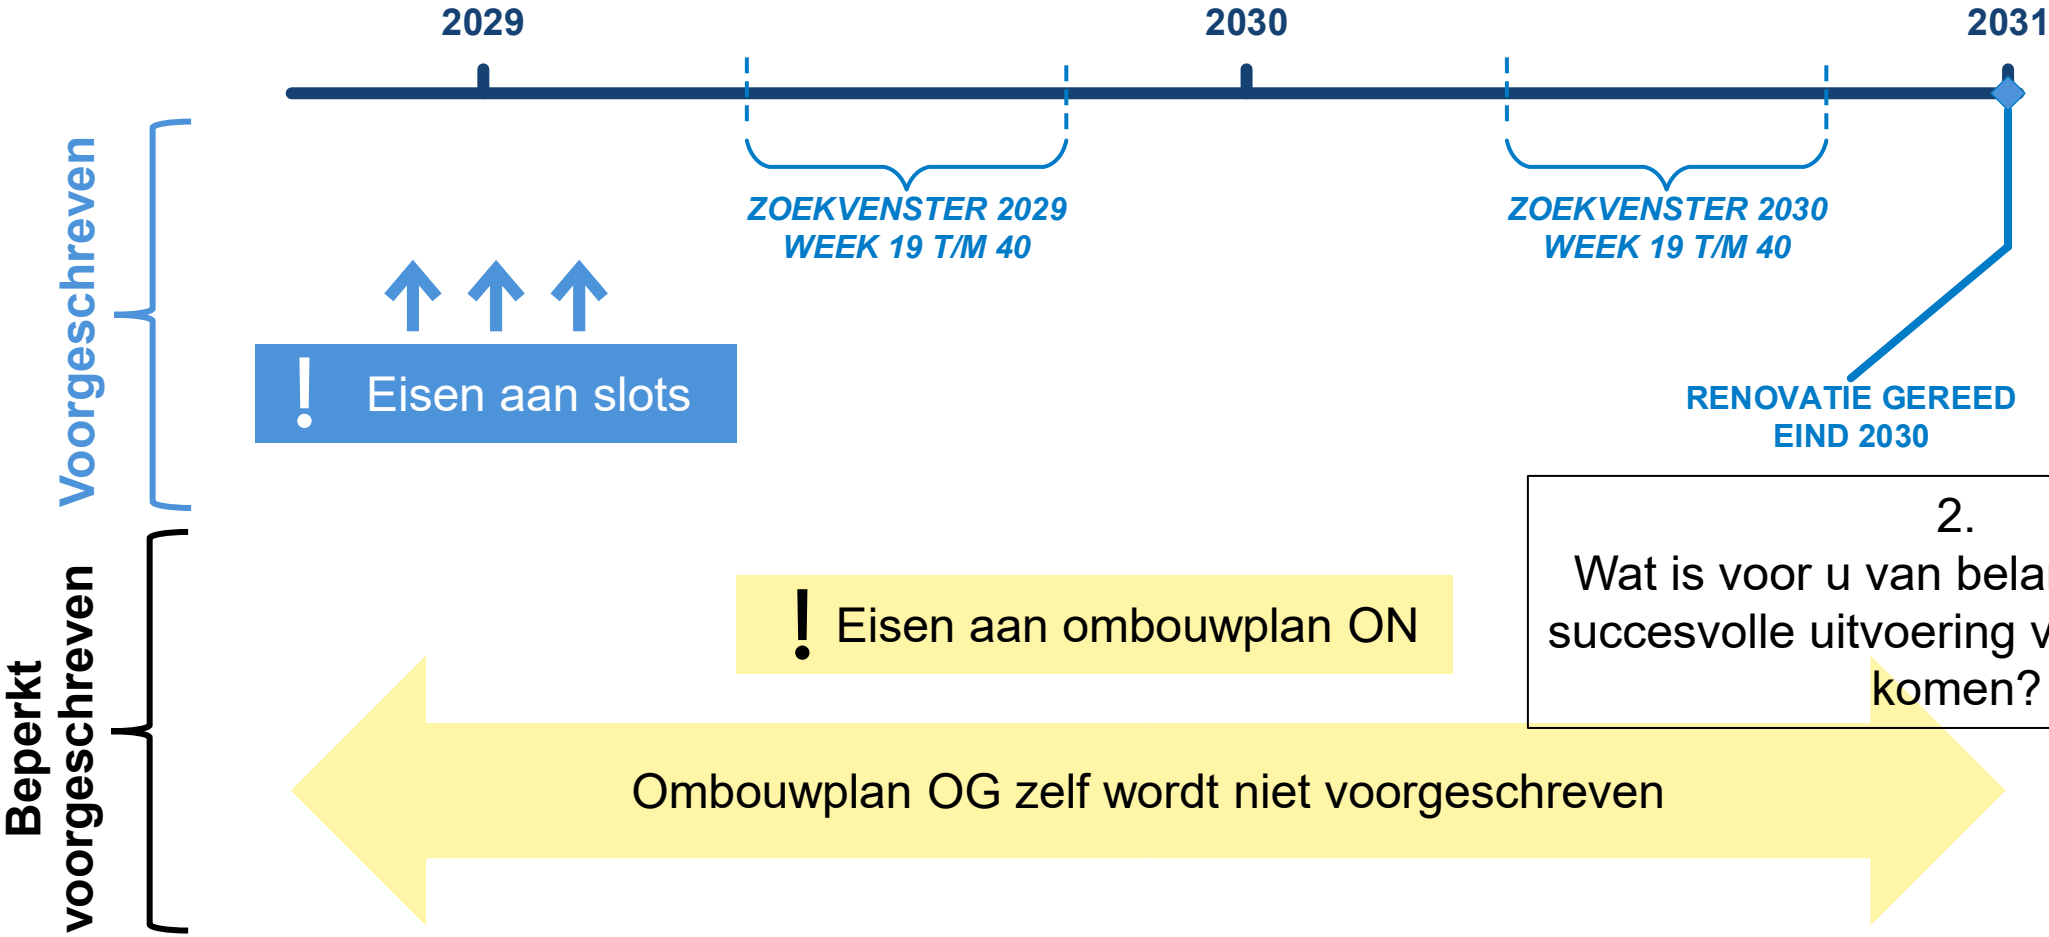

2.
Wat is voor u van belang om tot een succesvolle uitvoering van het Werk te komen?
