



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Inlichtenbijeenkomst

Uitbesteding Projectbeheersing

Project Verruiming Twentekanalen

08 juni 2020



Onderwerpen

- Korte introductie & kennismaking
 - Ella Nanninga-Kryzewski – Projectmanager
 - Daan Beuermann - Adviseur Projectbeheersing
 - Mart-Jan Roos – Inkoopadviseur
- Spelregels
 - Wat gaan we wel en wat gaan we niet bespreken
- Informeren over:
 - Het Project
 - De Uitvraag
 - De Procedure
- Vragen

Werkzaamheden Project Opwaardering Twentekanalen



De Twentekanalen

1. Voorpand IJssel – sluis Eefde

- Verdiepen vaarweg
- 1a Baggeren zwaaiком Ei van Thijse

2. Zijtak Delden-Almelo

- Verdiepen vaarweg
- Vervangen damwanden
- Aanbrengen maatregelen grondwaterbeheersing
- Aanleggen natuurvriendelijke oevers
- 2a Aanleggen zwaaiком XL-kade
- 2b Natuurvriendelijk inrichten zwaaiком Bornebroek
- 2c Natuurvriendelijk inrichten zwaaiком Deldenerbroek

3. Hoofdtak Delden-Hengelo

- Verdiepen vaarweg
- Vervangen damwanden
- Aanbrengen maatregelen grondwaterbeheersing
- Aanleggen natuurvriendelijke oevers
- 3a Inkassen gemeentekade Delden
- 3b Verruimen zwaaiком Delden

4. Hoofdtak Hengelo-Enschede

- Verdiepen vaarweg
- Vervangen damwanden
- Aanbrengen maatregelen grondwaterbeheersing
- Aanleggen natuurvriendelijke oevers
- 4a Uitbreiden wacht- en opstelplaatsen sluis Hengelo

Verruiming Twentekanalen, fase 2 (183 mln euro)

Doel: bevaarbaar maken voor grote schepen klasse Va, als onderdeel van Europese transport-corridor



Uitdagingen

- Technisch: grondwaterbeheersing (ingewikkeld), 35 km nieuwe damwanden (meeste werk), grondstromen, PFAS
- Contract: middenin Aanbesteding met concurrentiegericht dialog; eind oktober definitieve gunning en start voorbereiding werkzaamheden, ON grondwaterbeheersing al aan boord (ZHP van Heteren); werken in de Driehoek OG - ON – ZHP
- Omgeving: diverse stakeholders (havenbedrijven, scheepvaart, bewoners), vergunningen, intern RWS
- Projectbeheersing: Bevorderen kwaliteit van besluitvorming, 'in control zijn', huis op orde en specifieke/dynamische advisering, juist interdisciplinair.




Uitvraag PB TKf2

- Basis producten
 - Scope en baselinebeheer
 - Financiën
 - Planning
 - Risico's
 - Kwaliteit
 - Organisatie
 - Ondersteuning
- Aanvullende producten
 - Issuemanagement
 - Strategisch Dashboard
 - Opleveren=Overdracht (O=O)
 - Diverse Rapportages (Trimester, CEF, Verantwoording)
- Houding en gedrag
 - Pro-actief, dienstverlenend, flexibel, contact-boven-contract



PB bij TK2

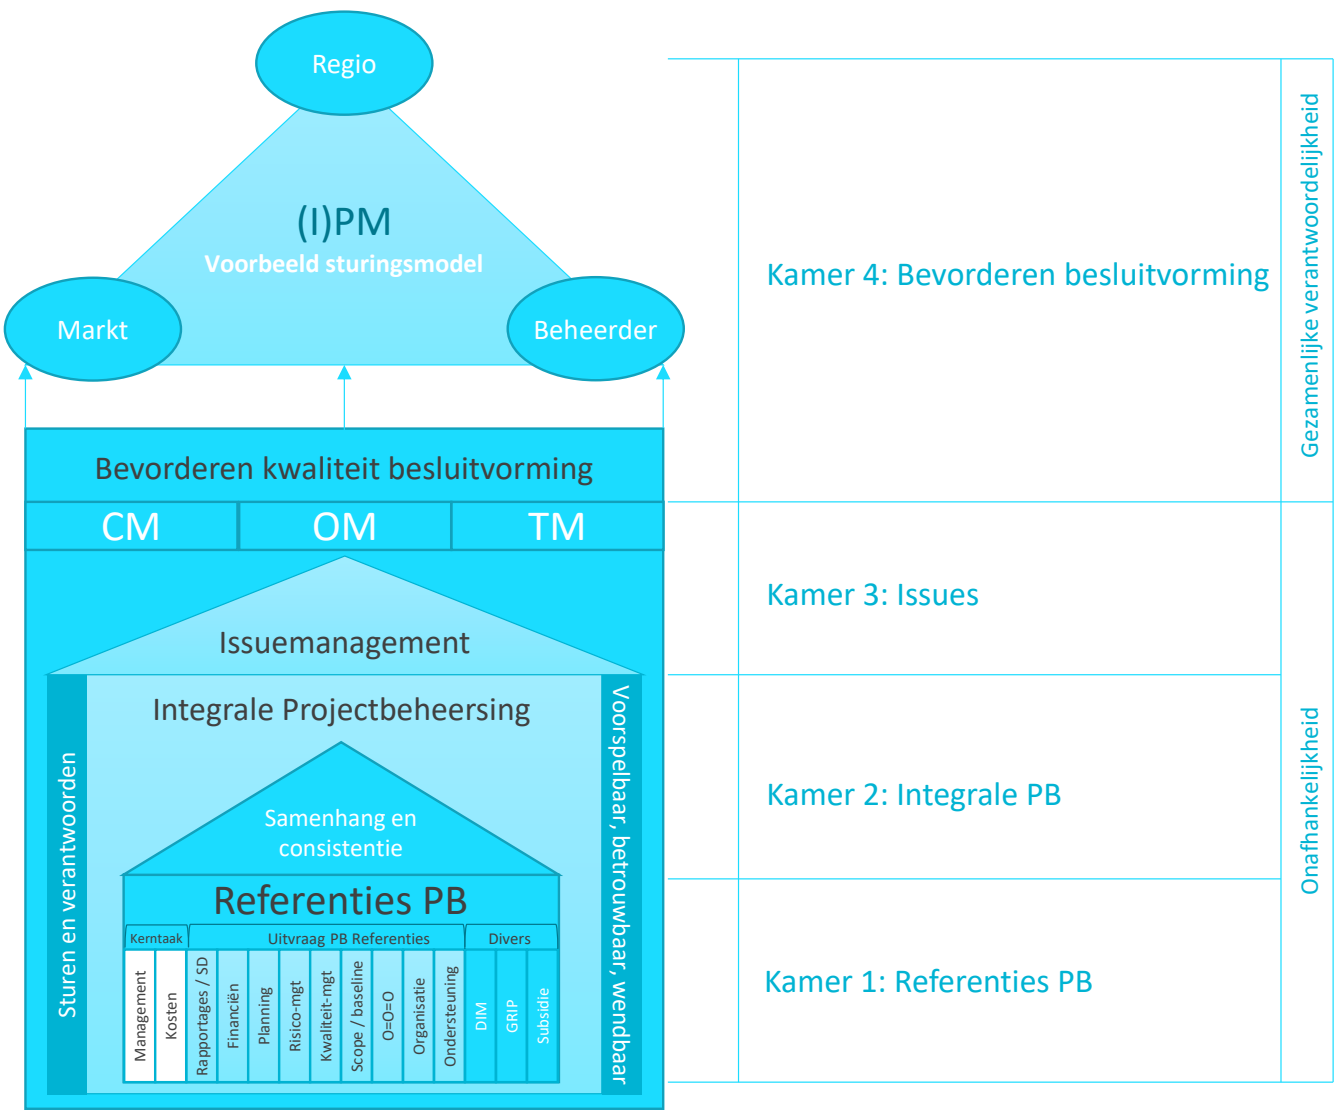



Aandachtspunten

- Sturen en beheersen op de doelen
- Samenwerken in de driehoek
- Subsidie CEF
- Geen standaard project, niet alleen *proven technology*, innovatief t.a.v. kunststof damwanden (proef), grondwaterbeheersing (op deze schaal)



De procedure

- Aanbestedingsleidraad
- Scheiding van belang
 - Partijen dienen een keuze te maken voor werken aan Opdrachtnemerszijde van het hoofdcontract voor de realisatiefase of aan opdrachtgeverszijde



Aanbestedingsplanning

Activiteit	Datum
Aanmeldingsfase	
Aankondiging	27-05-2020
Inlichtingenbijeenkomst	08-06-2020
Deadline verzoeken nadere inlichtingen	12-06-2020
Publicatie Nota van Inlichtingen Aanmeldingsfase	26-06-2020
Deadline ontvangsten verzoek tot deelneming	06-07-2020
Selectiefase	
Opening digitale kluis TenderNed	07-07-2020
<i>Bouwvak van 18-07-2020 tot 24-08-2020</i>	
Verzenden mededeling van selectiebeslissing	24-08-2020
Deadline indienen bezwaar op selectiebeslissing	31-08-2020
Datum loting	01-09-2020
Deadline indienen bezwaar op uitkomst loting	04-09-2020
Inschrijvingsfase	
Inlichtingenbijeenkomst	07-09-2020
Deadline verzoeken nadere inlichtingen	14-09-2020
Publicatie Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase	18-09-2020
Deadline ontvangst inschrijvingen	14-10-2020
Beoordelingsfase	
Opening digitale kluis TenderNed	15-10-2020
Verzenden gunningsbeslissing	30-10-2020
Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn	23-11-2020
Verzenden opdracht	24-11-2020



Tot slot

- Vragen?
