



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Vernieuwingsopgave Verkeersbrug Dordrecht

Marktconsultatie

Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan.
Zie voor uitleg de pagina [Toepassen van vertrouwelijkheidsniveaus](#).

10 juli 2025



Agenda

09:00 Welkom en plenaire toelichting

09:20 Eerste Themasessie

10:05 Pauze

10:10 Tweede Themasessie

10:55 Plenaire afronding



Algemeen - Doelstelling

Doel van vandaag:

- **Informeren** over de voortgang en werkwijze;
- **Consulteren** over de voorgenomen contract- en uitvoeringsuitgangspunten;
- **Aansluiting houden** met de visie vanuit de markt.



Algemeen – Terugblik vorige marktconsultatie

- Op 30 januari toelichting gegeven over het **team**, het **cluster**, de **projectscope** en de **uitdagingen**.
- Constructieve gesprekken gevoerd over de centrale thema's **Samenwerking** en **Wendbaarheid**.
- De uitkomsten van de marktconsultatie zijn **gepubliceerd** en vormden **belangrijke input** voor de contractvoorbereiding.
- Fundamentele principebesluiten leiden nu tot de wens om opnieuw met de jullie te spreken.



Scope

Veelzijdige scope met diverse uitdagingen

- **Constructief:** Beton, staal, opleggingen en voegovergangen;
- **WTB:** Bewegingswerk, Machineverordening, CE;
- **GWW:** Wegsysteem en HWA
- **EI&A:** Bediening/ besturing, LFV's
- **Bouwkundig:** Bediengebouwen en interieur;
- **Conservering**, etc.





Principebesluit – Extern renoveren

- RWS ziet omgevings-gerelateerde uitdagingen ten aanzien van in situ renoveren (raakvlakprojecten, hinder en overlast);
- Na een haalbaarheidsonderzoek is besloten om zowel de basculebruggen als de vakwerkbrug los te halen en extern te renoveren
- De (de)montage, transport en externe locatie zijn onderdeel van het bouwcontract.



Principebesluit – Hybride Tweefasenaanpak met VVV-prijsvorming

- Scope is qua prijsvorming onderverdeeld in **vast, verrekenbaar** en **variabel**;
- **Getrapte prijsvorming** van de variabele scope tijdens Fase 1, binnen vooraf overeengekomen bandbreedte;
- Aanleiding van deze werkwijze is de aanwezigheid van **goed afprijsbare scope-onderdelen, versus onvoorspelbaardere scope-onderdelen**.




Principebesluit – Hybride Tweefasenaanpak met VVV-prijsvorming

- **Vaste scope:** Bij aanbesteding wordt een vaste prijs aangeboden, deze verandert niet ;
- **Verrekenbare scope:** Bij aanbesteding worden eenheidsprijzen aangeboden, daadwerkelijk aantal eenheden wordt afgerekend;
- **Variabele scope:** Bij aanbesteding wordt een meest waarschijnlijke prijs gegeven. Tijdens fase 1 kan deze bijgesteld worden binnen een afgesproken bandbreedte. De bandbreedte wordt tijdens de dialoogfase vastgesteld.



Principebesluit – Hybride Tweefasenaanpak met VVV-prijsvorming

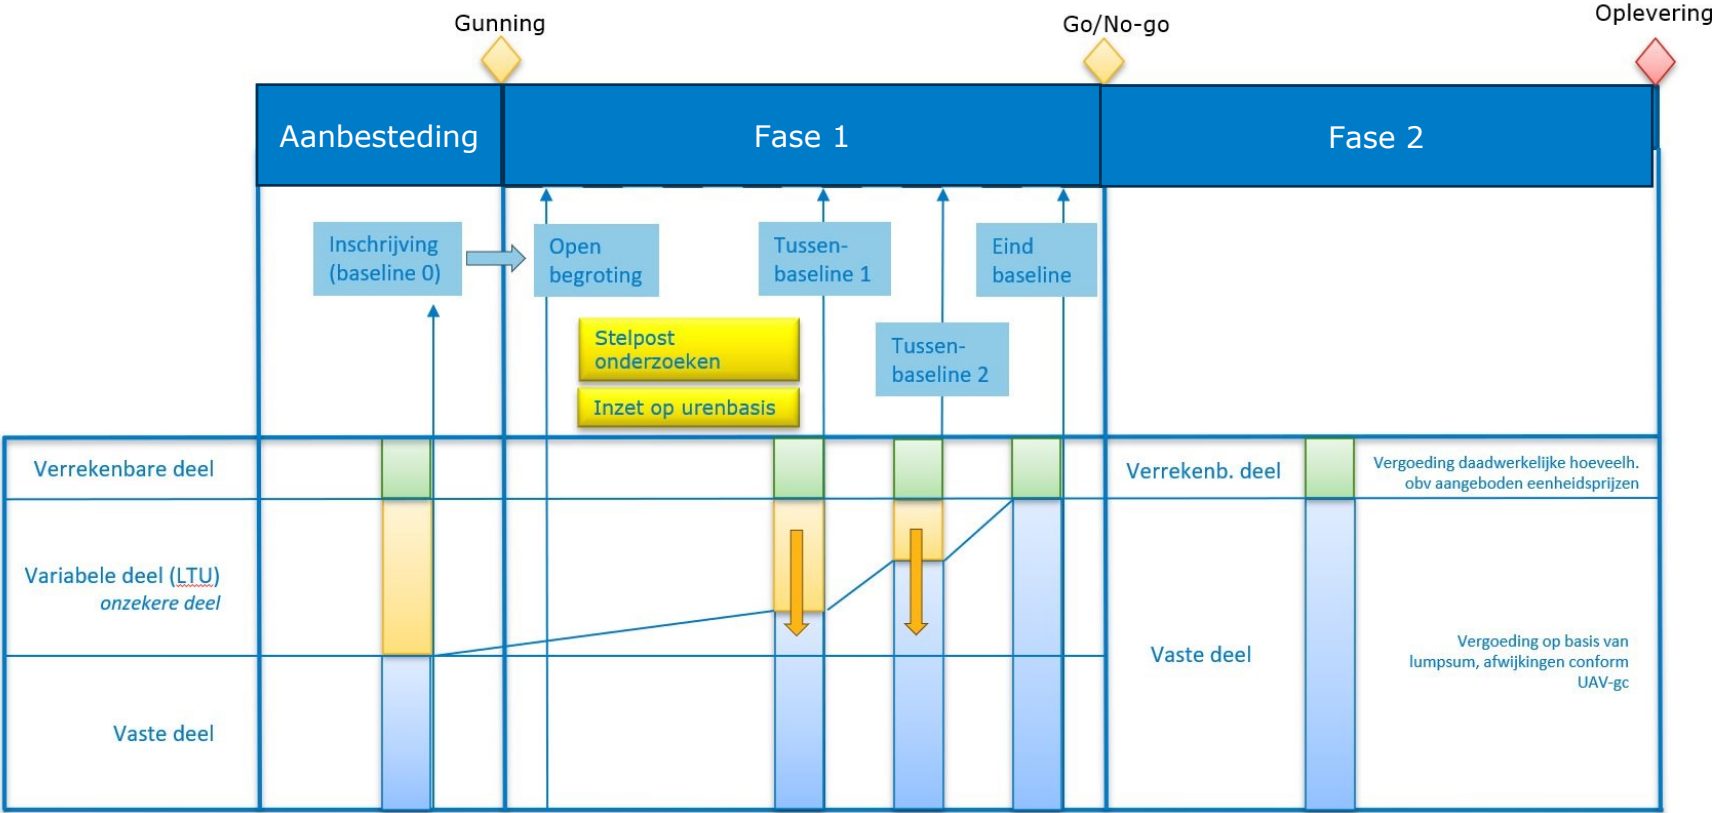




Principebesluit – Scopeverdeling Vast, Verrekenbaar, Variabel

	Vast	Verrekenbaar	Variabel (=vast na Fase 1)
Onderdelen Technische scope	• MJO; • Conservering • Wegsysteem, wegverharding, houten delen en slijtlagen; • Voegovergangen en opleggingen; • HWA-systeem; • Logische functievervullers; • Bewegingswerk; • Zinker; • Bediening en besturing incl. ontvlechting spoorbrug; • Externe werklocatie; • Transport bruggdelen, incl. (de)montage, hijsen/vijzelen;	• Betonreparaties; • Staalreparaties voor zover niet met het blote oog zichtbaar;	• Versterkingsmaatregelen staal; • Versterkingsmaatregelen beton in basculekelders; • Bouwkundige werkzaamheden; • Maatregelen i.k.v. machineveiligheid en CE-markering; • Vervanging betonnen dekken vakwerkbrug en plaatliggerbrug; • Remming en geleidewerken (niet zijnde aanlegplaats);



Planning

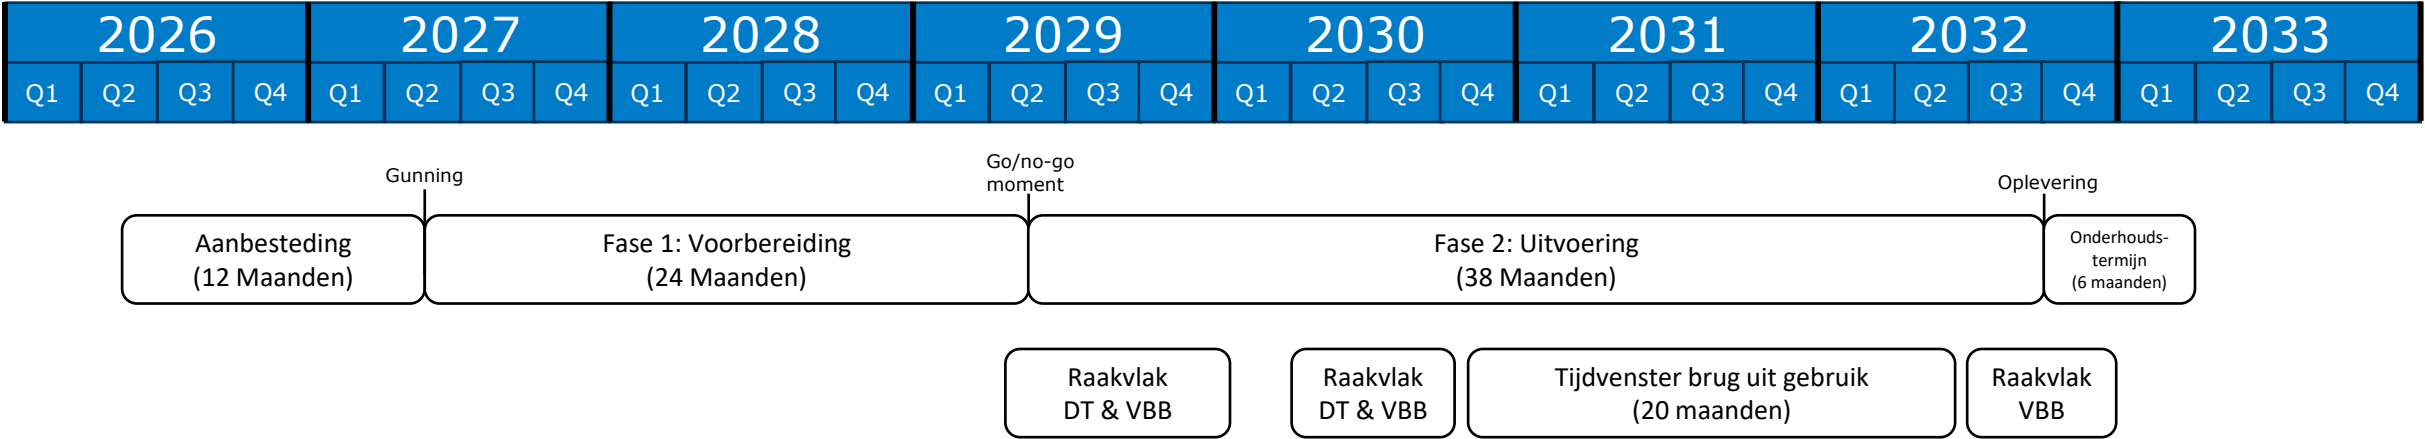



Thema Prijsvorming en invulling samenwerking

- *Contractvorm* – Acht de markt de hybride tweefasencontractvorm (onder de UAV-GC) werkbaar?
- *Scopeverdeling* – Is de verdeling over 'vast', 'variabel' en 'verrekenbaar' helder en plausibel?
- *Samenwerking* – Hoe kunnen we met deze uitgangspunten het meest optimaal samenwerken?



Thema Externe renovatie en uitvoeringsmethodiek

- *Uitvoeringsmethode* – Welk effect heeft het uitvaren op de mogelijke meerwaarde, concurrentiesituatie en prijs?
- *Externe locatie* – Welke voordelen, nadelen en uitdagingen ziet de markt in het renoveren op externe locatie?
- *Planning* – Is voorgenomen uitvoeringsplanning haalbaar?



Marktconsultatie – Werkwijze Themasesies

- We gaan uit elkaar in **vier groepen**. U wordt automatisch ingedeeld in een *break-out room*.

	Breakout 1	Breakout 2	Breakout 3	Breakout 4
Sessie 1	Prijsvorming	Prijsvorming	Uitvoering	Uitvoering
Sessie 2	Uitvoering	Uitvoering	Prijsvorming	Prijsvorming

- Eenieder behandelt **beide thema's**. De groep blijft hetzelfde.
