



Annexen bij de Vraagspecificatie

Het in stand houden, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden
van het project Wilhelminakanaal Sluis II

Zaaknummer: 31148903

Datum: 16 juni 2025



Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	16 juni 2025
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Annex V	Vrijkomende materialen	12
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	19
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; risicoregeling	20
Annex VIII	Stelposten	23
Annex IX	Bankgarantie	24
Annex X	Verzekeringen	27
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	28
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	29
Annex XIII	Garanties	30
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	33
Annex XV	Afspraken omtrent Social Return on Investment (SROI)	34

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&q=2016-12-01	Boswet; Wet natuur- bescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generieke verkregen vergunning
Projectplan Waterwet (incl. m.e.r.-beoordeling)	Waterwet	Aanleg en wijziging van een waterstaatswerk (bodem, oevers, kunstwerken, waterkeringen)	RWS	In afbeelding 8 Projectplan Waterwet staan conclusies en vervolgstappen soortenbescherming. Voor de recreatiesteiger wordt verwezen naar eis VE015 in de Vraagspecificatie Proces. In afwijking van het Projectplan Waterwet geldt een maximale stremmingsduur van 18 maanden. Zie eis VN040 in de Vraagspecificatie Proces.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop toestemming moet zijn verkregen

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	LS-011 Enexis (laagspanning)
2	MS-021 Enexis (middenspanning)
3	W-014 Brabant Water (Water)
4	D-043 KPN B.V. (datatransport)
5	GH-011 Enexis (gas hoge druk)
6	RD-025 Gemeente Tilburg (rioolpersleiding, diameter 600 mm)

Kabels en leidingen categorie 1 zijn zoals benoemd in paragraaf 3.2.1 Scope ontwerp kanaalpand Sluis II - Sluis III noordzijde van het 'Globaal plan kabels en leidingen' dat is opgenomen in Annex XIII.

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1				
2				
3				

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Werk gereed voor vervroegde ingebruikneming voor vaarwegklasse IV. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van vervroegde ingebruikneming conform UAV-gv par. 26.	1 november 2029
2	Werk gereed voor aanvaarding (Oplevering van het Werk)	1 juni 2030
3	Meerjarig Onderhoud gereed voor aanvaarding.	1 jaar na oplevering van het Werk

Met betrekking tot Meerjarig Onderhoud wordt verwezen naar artikel 2 lid 2 Basisovereenkomst.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst.

Met betrekking tot vervroegde ingebruikneming wordt verwezen naar artikel 2 lid 7 t/m 10 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Elk ter acceptatie in te dienen document dient, conform eis VV170 van de Vraagspecificatie Proces, te worden vergezeld van een V&V-formulier.

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (waaronder V&G-plan en RI&E)	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Werkplannen waarvan bij acceptatie procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement is bepaald dat deze ter acceptatie moeten worden ingediend	4 weken voor start betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV025
Procesbeschrijving calamiteiten	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Procesbeschrijving machineveiligheid (machineveiligheidsplan)	6 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV020
Risicobeoordeling machineveiligheid	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV040, MV090
Grensbeschrijvend document	8 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV062
Functional Safety Plan	Voorontwerp Machineveiligheid	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, MV100
EMC-Beheersplan	Voorontwerp	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, EM020

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Grondwater risicobeheersplan	10 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IN290
Plan van Aanpak 'Opleveren en Overdragen'	14 weken na opdrachtverlening	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OO100
Plan van Aanpak Emissies	12 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, ST020
Projectbeheersing				
Transitieplan instandhouding	4 weken na ingaan transitieperiode	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, SM270
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	4 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL020
Planning	2 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	3 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	3 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Procesbeschrijving milieukosten (plan van aanpak MKI)	6 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, DU010
Omgevingsmanagement				
Stakeholdersanalyse	4 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OM040
Omgevingsmanagementplan	4 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, OM060
Procesbeschrijving vergunningen	8 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VE020
Procesbeschrijving kabels en leidingen	8 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, KL020
Communicatieplan	4 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD105
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	4 weken voor plaatsing bouwborden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Verkeersmanagementplan (nat)	8 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
Scheepvaartverkeersmaatreg	Rekening houdend	1	21 dagen	Vraagspecificatie

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
elenplan	met termijnen hinderklassen			Proces, VN021
Protocol archeologische toevalsvondsten	6 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, AW070
Procesbeschrijving omgaan met ontplofbare oorlogsresten	6 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Projectplan conform CS-000 (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten)	6 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE050
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	3 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF030
Groenbeheerplan	6 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF075
Vismonitoring Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3	2 weken na afronding monitoring	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF105
Plan van aanpak cultuurhistorische waarden	6 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CW060
Technisch management				
Procesbeschrijving ruimtelijke kwaliteit en vormgeving	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, TM065
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	16 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Grond- en materiaalstromenplan	16 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV315
Transitieplan bediening	10 weken voor transitie bediening	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV800
Procesbeschrijving duurzame bouwplaats en bouwlogistiek	16 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV1000
Beschrijving V&V-strategie	12 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplannen §20 en §21 UAV-GC 2025)	12 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Procesbeschrijving leveren gegevens	12 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Afleverdossier	Bij afronding van een betaalpost met als	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	resultaat een blijvend onderdeel van het Werk			
Opleverdossier Werk	6 weken voor oplevering Werk	1	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Opleverdossier Meerjarig Onderhoud	6 weken voor einddatum MJO	1	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
BIM uitvoeringsplan	8 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG410
Cybersecurity plan	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY020
Gemotiveerd voorstel om niet te patchen	4 weken voorafgaande aan geplande patch	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY750
Implementatieadvies kritieke en niet kritieke patches	Conform Vraagspec. Proces, CY760	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY760
Cybersecurity dossier	Afleverdossier en Opleverdossier	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY800
Excel CMDB met configuration items (CI's)	Afleverdossier en Opleverdossier	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY810
Recoveryplan	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY820
Protocol voor back-up en recovery	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY830
Continuïteitsplannen voor energievoorziening	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY840
Software development plan	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA030
SDR, System Design Review, inclusief daartoe benodigde documenten	Voorontwerp IA	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA130
PDR, Preliminary Design Review, inclusief daartoe benodigde documenten	Definitief Ontwerp IA	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA140
CDR, Critical Design Review, inclusief daartoe benodigde documenten	Uitvoeringsontwerp IA	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA150
Configuratiemanagement-plan	10 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, IA201
Hardware Design Specification	Definitief Ontwerp IA	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, LB200
Safety Requirement Specification	Voorontwerp IA	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, LB210
Testplan software	12 weken na opdrachtverlening	1	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, US430

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
– Plan van aanpak per beheerobject – Objectspecifieke FIT-lijst per beheerobject – Testplan per beheerobject	Uiterlijk 20 werkdagen voor start uitvoering FIT op locatie	1 analoog en 1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, US2400
Meetnetontwerp	4 weken vóór plaatsing van de deformatiemeetpunten	1	21 dagen	Bijlage L bij Vraagspecificatie Proces, data 12
Elektronische Navigatiekaart (ENC)	2 weken voor uitvoering	1	7 dagen	Bijlage L bij Vraagspecificatie Proces, data 21
Deelkwaliteitsplan lodingen	5 weken voor uitvoering	1	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, US1210 en Bijlage L HYD 09
Rapportage en data 'aantoning onder dynamische omstandigheden'	1 week na 'aantoning onder dynamische omstandigheden'	1	21 dagen	Bijlage L bij Vraagspecificatie Proces, HYD 10
Hydrografische producten	1 week na afronding opneming	1	21 dagen	Bijlage L bij Vraagspecificatie Proces, HYD 13
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersoon	1	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Elk ter toetsing in te dienen document dient, conform eis VV170 van de Vraagspecificatie Proces, te worden vergezeld van een V&V-formulier.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met een toetstermijn van de Opdrachtgever van maximaal 3 weken.

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol), conform Vraagspecificatie Proces FF030	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1
Werkplannen waarvan bij acceptatie procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement is bepaald dat deze ter toetsing moeten worden ingediend	4 weken voor start betreffende Uitvoeringswerkzaamheden	1
Grensbeschrijvend document conform Vraagspecificatie Proces, MV062	Voorontwerp	1
Voorontwerp van het Werk conform Vraagspecificatie Proces, OW305	Afronding Voorontwerp	1
Definitief Ontwerp van het Werk conform Vraagspecificatie Proces, OW305	6 weken voor start Uitvoeringsontwerp	1
Uitvoeringsontwerp van het Werk conform Vraagspecificatie Proces, OW305	4 weken voor start Realisatie	1
Markeringsplan snelfietspad conform Vraagspecificatie Proces, OW330	8 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1
Rapportages uitgevoerde testen conform Vraagspecificatie Proces, IA175	2 weken na afloop test	1
Integraal ruimtelijk inpassingsplan (IRIP)	Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Uitvoeringsontwerp	1

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
nvt

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt te worden, tenzij dat aantoonbaar niet mogelijk of duurzaam is. Hierbij is ten minste de afweging tussen de financiële kosten en vermeden milieukosten gemaakt.
5. Omgaan met vrijkomende installaties volgens de volgende toegestane geprioriteerde afdankscenarios:
 - a. 1 op 1 hergebruik van componenten;
 - b. teruglevering aan leverancier met behoud van kwaliteitsniveau en materiaal eigenschappen;
 - c. Verwerking door bedrijven die WEEELABEX/SENALEC gecertificeerd zijn.

Artikel 2. Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.
2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.
3. Voor hergebruik in aanmerking onderdelen van Sluis II conform onderstaande tabel.

Artikel 3.

Chroom-6

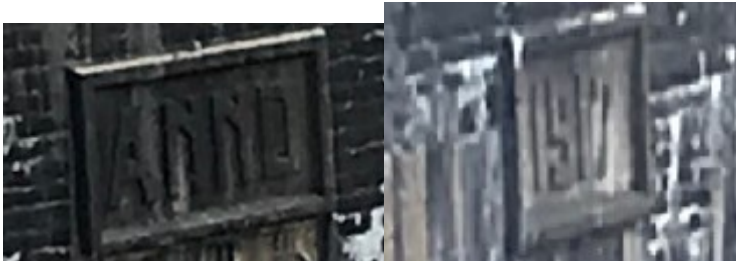
In Annex XII is het Coatingonderzoek Wilhelminakanaal Sluis II toegevoegd.

2. Vrijkomende materialen die chroom-6, (zware) metalen en/of PAK-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6, (zware) metalen en/of PAK-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
3. Indien vrijkomende materialen die chroom-6, (zware) metalen en/of PAK-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
4. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6, (zware) metalen en/of PAK is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6, (zware) metalen en/of PAK en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4

Aziatische Duizendknopen

1. Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder "11. Verwerken van besmette grond" of conform de "Rijkswaterstaat-bijlage bij het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen".

Onderdelen Sluis II	Aantal	Opmerking
1. Datumstenen (Anno 1917 stenen) 	Allemaal	Opslaan in de loods bij sluis III 
2. Randstenen afgerond op de hoeken van de slusingang 	Alle Randstenen afgerond op de binnen en buiten hoeken van de slusingangen	Wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.
3. Meerpalen en wachtsteiger balken 	16 meerpalen en wachtsteiger balken	Wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.
4. Gebouchardeerde randsteen 	Ronde randstenen	4 stuks opslaan in loods bij Sluis III Overige worden opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.

	Rechte randstenen	4 stuks opslaan in loods bij Sluis III Overige worden opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning
5. Grote bolders op de sluiskoppen 	Het betreft 2 grote bolders.	1 stuks opslaan in loods bij Sluis III 1 wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.
6. Aanmeerboldertjes, twee soorten 	Alle aanmeerboldertjes, twee soorten. Hier mogen de betonblokken of stalen palen bij geleverd worden.	Wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.
7. Bijzondere elementen uit de sluiswand (Haalkommen en deuren voor de kabelgoten) 	Alle aanmeerpunten: de stenen en stalen ingebouwde bolders, ook die buiten de sluisdeuren	Wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.
8. Basaltblokken uit de sluiswand	25 m2,	Wordt opgehaald. Datum en tijd In overleg te bepalen. Gegevens volgen na gunning.

			
9. Nieuwe houten palen 		Alle houten palen	Opslaan in de loods bij sluis III
10. Beneden en boven deuren met alle toebehorende delen Schutsluis SX2 (SCS2)		2 stuks beneden deuren 2 stuks boven deuren	Opslaan op terrein bij sluis III conform eis SYS-02472
11. Platen van kabelkokers 		6 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III
12. Afdekroosters van de omloopriool 		2 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III
13. Hydraulische cilinder afscherming		4 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III

			
---	--	--	--

14. Platen van kabelkokers 	6 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III
15. Afdekroosters van de omloopriool afdichting 	2 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III
16. Hydraulische cilinder afscherming omloopriool 	4 stuks	Opslaan in de loods bij sluis III

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Prestatiecontract civiel en groen onderhoud: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het natte Areaal, met upgradewerkzaamheden, Brabantse- en Midden-Limburgse kanalen	Gehele looptijd van de Overeenkomst	Opdrachtnemer
Project TB3: Het moderniseren en onderhouden van de objecten gelegen in en langs de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen, inclusief de bediencentrales, met focus op de disciplines elektrotechniek, werktuigbouwkunde en industriële automatisering	2023 - 2030	Opdrachtnemer
Optimalisatie Wilhelminakanaal tussen Kraaiven en Looven	Circa 2029	Opdrachtnemer
Onderhoud en gladheidbestrijding fietspaden en wegen.	Gehele looptijd van de overeenkomst	Opdrachtnemer
Onderhoud woningen bij Sluis SX2	Gehele looptijd van de overeenkomst	Opdrachtnemer
Aanleg overstortleiding van bedrijventerrein Albion naar het Wilhelminakanaal in opdracht van de gemeente Tilburg.	Q2 2026	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; risicoregeling

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden voor het Werk de volgende productgroepen en percentages:

productgroep loonkosten	Lb = 40 %
productgroep gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 5 %
productgroep staal exclusief betonstaal	Lb = 20 %
productgroep breuksteen	Lb = 5 %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode conform artikel 2 lid 2 Basisovereenkomst gelden voor het Meerjarig Onderhoud de volgende productgroepen en percentages:

productgroep loonkosten	Lb = 65 %
productgroep gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 5 %

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2025 is bij de Overeenkomst en in de daarop betrekking hebbende prijs voor de realisatie van het Werk als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 250.000,00 exclusief omzetbelasting.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. omzetbelasting
1 Sluiscomplex III (SX3)	Uitvoeren van Werkzaamheden aan het Sluiscomplex III die kunnen voortkomen uit nader onderzoek naar de consequenties van de in het verleden doorgevoerde wijziging van het streefpeil van 7,40 m + N.A.P. naar 7,70 m + N.A.P.	€ 100.000,00
2 Verkeerscentrale Tilburg	Verlenen van medewerking door de Opdrachtnemer aan de integratie door derden van de bediening op afstand van Sluis SX2, Gemaal SX2 en Spuimiddel SX2 in de bediencentrale Tilburg. De integratie betreft het door derden omzetten van de door de Opdrachtnemer gerealiseerde stand alone werkplek naar een geïntegreerde werkplek in de nautische centrale Tilburg.	€ 100.000,00
3 Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3	Aanbrengen van geluidbeperkende voorzieningen aan het Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3, zoals bedoeld in eis SYS-1112, indien uit de door Opdrachtnemer uit te voeren metingen blijkt dat de geluidsniveaus van Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3 de normen overschrijden. Na het aanbrengen van de geluidbeperkende voorzieningen dient de Opdrachtnemer opnieuw metingen uit te voeren van de geluidsniveaus van Gemaal / Waterkrachtcentrale SX3.	€ 50.000,00

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31148903 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het in stand houden, ontwerpen en uitvoeren van het project Wilhelminakanaal Sluis II,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Meerjarig Onderhoud, te weten het onderhouden van het project Wilhelminakanaal Sluis II,

zulks tot een bedrag van € ... zegge ...⁶⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- De Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform §27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 6) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

Deze annex is afzonderlijk bijgevoegd

Annex XIII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoet aan de navolgende eisen:

- a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;
- b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft $\geq 5,0$ MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;
- c. slechts onthechting / afbladdering mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-5;
- d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-2;
- e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

3. Verkleuring conserveringen

De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na aanbrengen van de toplaag van de conservering van de leuning met verticale spijlen, alsmede de leuning op deuren en remming- en geleidewerken, voldoet aan de volgende eisen:

- $\Delta E \leq 3$ ($Cie-L^*a^*b$) voor RAL kleuren in de 7000 serie en de lichte kleuren in de 9000 serie;
- $\Delta E < 6$ ($Cie-L^*a^*b$) voor overige RAL kleuren.

E.e.a. conform de NEN-EN-ISO 11664-4.

4. Opleggingen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen in de RTD1012.

5. Grondaanvullingen achter damwanden

De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat bij de bovenzijde van de grondaanvullingen achter damwanden de zetting beperkt blijft tot maximaal 5 cm t.o.v. het ontworpen aanlegniveau. Telkens wanneer deze waarde binnen 2 jaar overschreden wordt dient er, aansluitend op het moment van constatering, opnieuw aangevuld te worden. Daarbij dient tevens de groenvoorziening hersteld te worden.

6. Ontwikkeling overige beplanting

De opdrachtnemer garandeert dat 4 (vier) jaar na oplevering de beplantingen voldoen aan de volgende eisen:

Voldoen aan het in het inrichtingsplan aangegeven eindbeeld na 4 jaar;

Bomen maximaal 1% uitval kennen;

Struweel maximaal 5% uitval kent.

De ON is gedurende deze 4 jaar verantwoordelijk voor het benodigde onderhoud om deze groeigarantie te bewerkstelligen (inboeten, water en mest geven, snoeien, boomspiegel vrijhouden). Inboet van de beplanting is toegestaan tot in het 3e jaar van de garantieperiode. In het 4e jaar is geen inboet meer toegestaan.

7. Boeteregeling garanties

Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:

- tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 2.500,00;
- tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 1.500,00;
- tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 1.000,00.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie­meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie­meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie­meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie­meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie­meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.

Annex XV Afspraken omtrent Social Return on Investment (SROI)

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment

Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return on Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de Inschrijver zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. De omvang van deze verplichting bedraagt 0,45 % van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs voor realisatie van het Werk. Exclusief BTW steeds per jaar vast te stellen op basis van de werkelijk gefactureerde kosten

Invulling Social Return verplichting

Kenmerkend voor de Tilburgse uitvoering van SROI is een structuur van maatwerk en bouwstenen. Hierbij worden de inspanningen van Opdrachtnemer op SROI transparant gewaardeerd op basis van onderstaande 'menukaart':

SROI-inspanning	Waardering
Inspanningen gericht op de inzet van werkzoekenden	
- Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde of WW-er met een uitkeringsduur korter dan 1 jaar: - Het in dienst nemen van een bijstandsgerechtigde of WW-er met een uitkeringsduur langer dan 1 jaar: - Het in dienst nemen van een niet uitkeringsgerechtigde (NUG-er): - Het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte (WIA/WAO/Wajong of WWB) met een vastgestelde structurele functionele beperking:	€ 15.000,- per fte (op basis van een arbeidsduur van 1 jaar). € 25.000,- per fte (op basis van een arbeidsduur van 1 jaar). € 15.000,- per fte (op basis van een arbeidsduur van 1 jaar). € 35.000,- per fte (op basis van een arbeidsduur van 1 jaar).
Inspanningen gericht op de inzet van scholieren of studenten	
- Het invullen van een leerwerkbaan in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL): - Het invullen van een stageplaats in het kader van een beroepsopleidende leerweg (BOL):	€ 10.000,- € 5.000,-

Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan Opdrachtnemer in overleg met een accountmanager van Werkgeversservicepunt Midden-Brabant (samenwerking tussen UWV, Diamant-Groep en gemeente Tilburg) een pakket samenstellen dat het beste past in zijn bedrijfsvoering en uiteindelijk een waarde moet presenteren van minimaal de door de gemeente vastgestelde SROI-waarde.

Aantrekken van kandidaten

De accountmanager van het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant ondersteunt Opdrachtnemer vervolgens bij het realiseren van Social Return. Bijvoorbeeld door samen met Opdrachtnemer Social Return-vacatures concreet te maken en door Opdrachtnemer te ondersteunen bij werving en selectie. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de SROI-verplichting blijft evenwel bij Opdrachtnemer liggen.

Verantwoording

Opdrachtnemer maakt met de accountmanager van het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant afspraken over de wijze waarop nakoming van de SROI-verplichting wordt aangetoond. Indien Opdrachtnemer zijn SROI-verplichting niet (volledig) nakomt vindt een inhouding plaats op de facturatie naar rato van de niet-gerealiseerde SROI-verplichting. Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten tot stand te brengen. Inhouding vindt niet plaats indien Opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat hem in redelijkheid en billijkheid geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Dit is ter beoordeling aan de Opdrachtgever en accountmanager van het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant.
