



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Informatiebijeenkomst

Renovatie bewegingswerken

Oosterscheldekering

16 juni 2025



Agenda


1. Welkom & introductie
2. Waar komen we vandaan?
3. Doel: Inkoopstrategie fase 2
4. Contractvorm
5. Aanbestedingsprocedure
6. Vervolgplanning
7. Afsluiting - vragenlijst





1. Welkom en introductie


- RWS team: Esther Verheij (PM), Annoeska Haaze (IA), Roel de Jong (OA), Jaco Moerdijk (TM), Joop Wielart (TA), Joost Rijnsberg (TA), Marco van Nimwegen (CA).
- Onderdelen en proces van de marktconsultatie
- Vragen s.v.p. schriftelijk stellen
- Afronding en openbare publicatie marktconsultatie

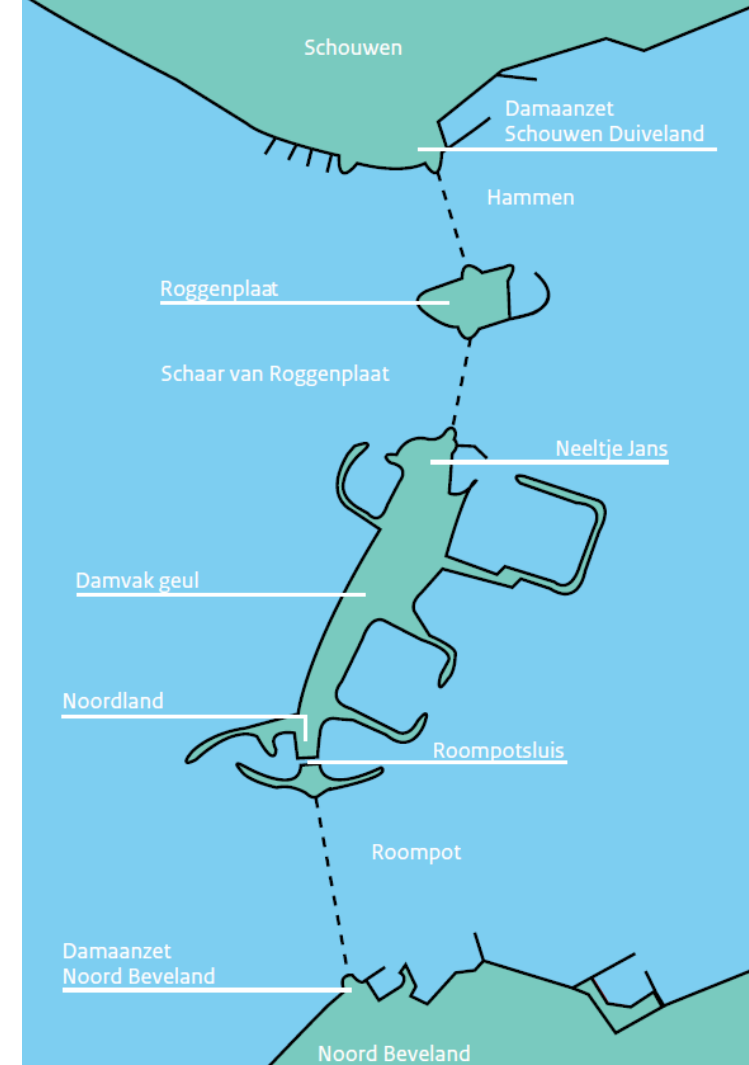



2. Waar komen we vandaan

- Pilotfase 1a + b waarin onderzocht is of Bewegingswerken gerenoveerd kunnen worden waarbij levensduur met 50 jaar wordt verlengd?
- Leerervaringen;
 - Resultaat hergebruik zuigerstang
 - Degradatie sneller dan gedacht → versnellen is nodig
 - Revisie hydraulische cilinder is uiterst complex gebleken
 - Hijsmethode vanaf de werkweg met korte stremming N57 → cardanconstructie en cilinder los van elkaar.

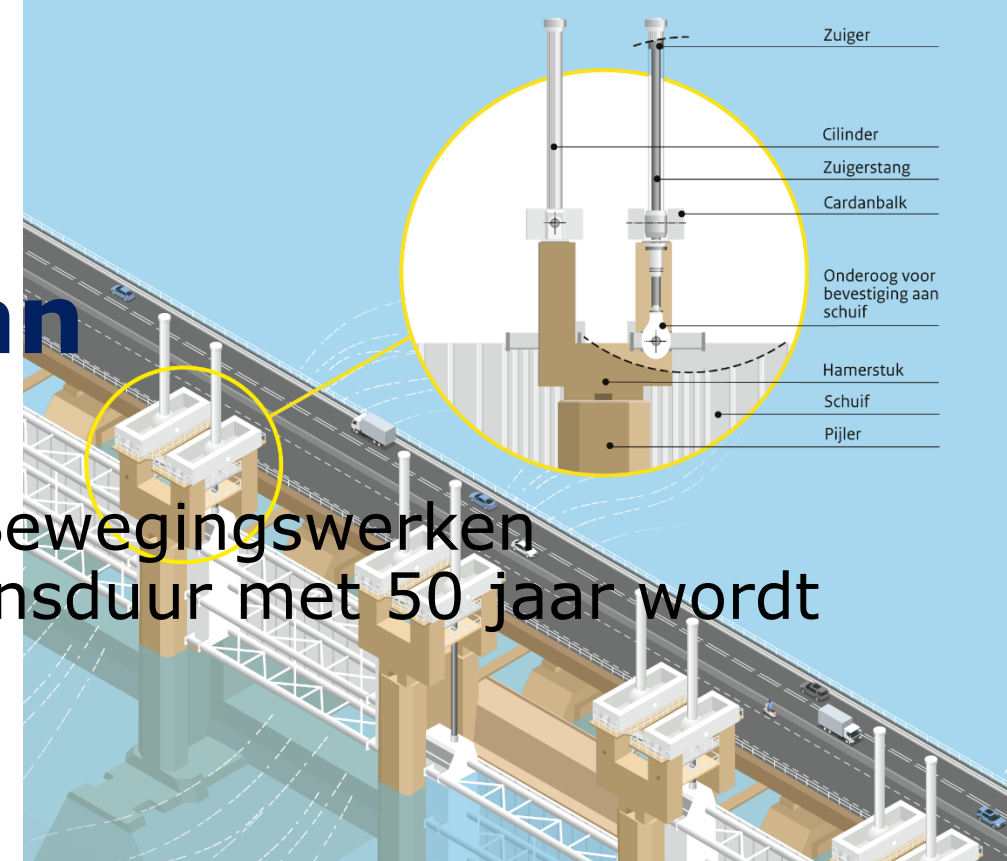




3. Inkoopstrategie fase 2

- Scope opdelen in:
 1. On-site werk (de- & montage BW en coördinatie) en revisie cardanconstructie
 2. Revisie hydraulische cilinder (fabriek)

Waarom?

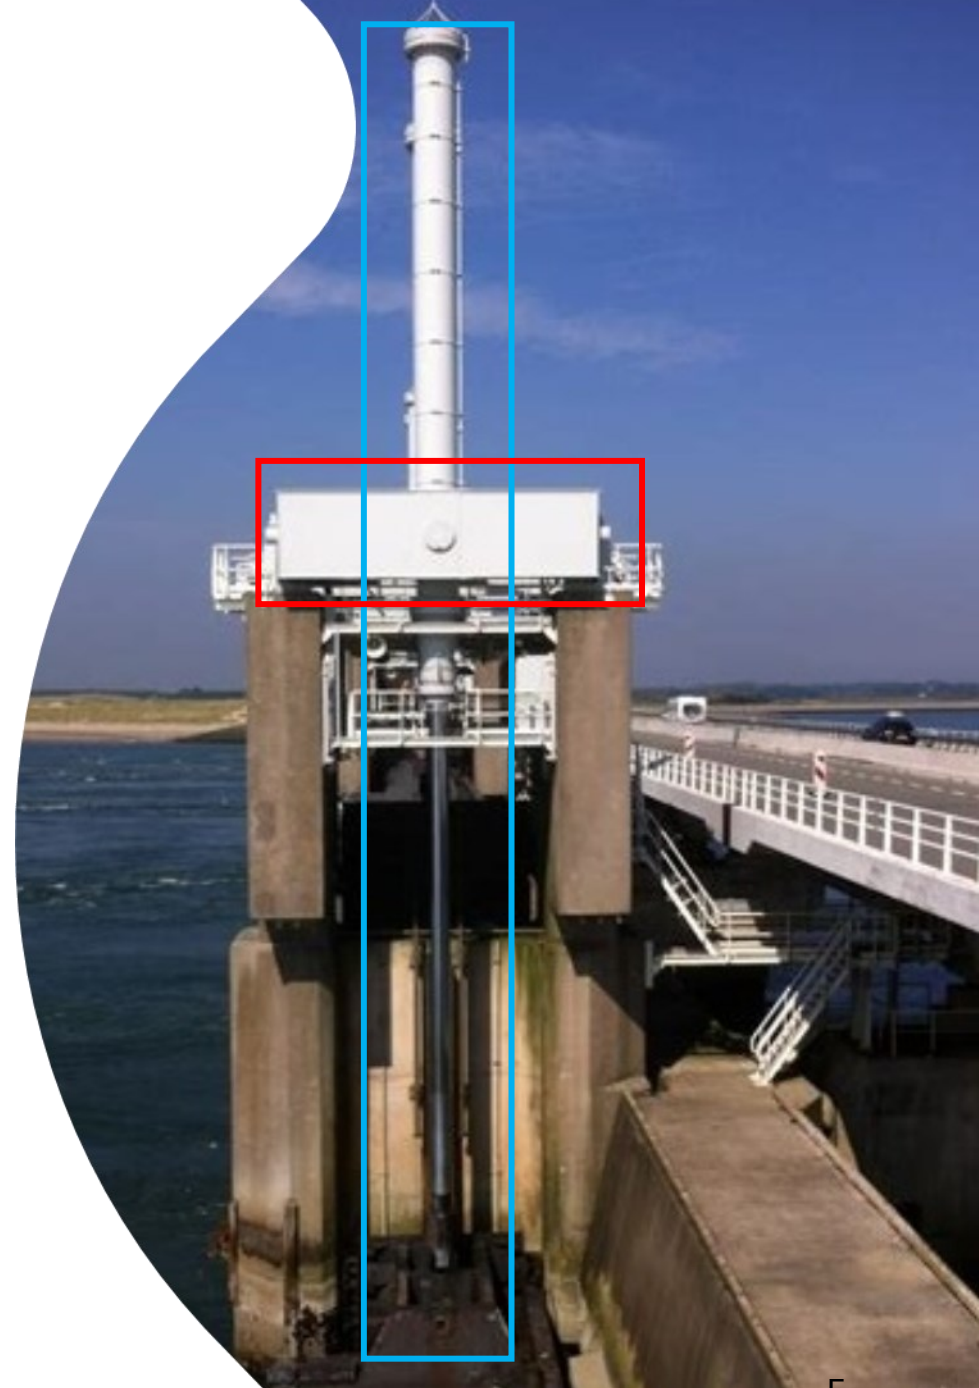



Deel 1: On-site werk en revisie cardanconstructie

- Werkzaamheden:
 - De- en montage
 - Hijzen bewegingswerk cilinder en cardanconstructie
 - Transport
 - Revisie en conserveren cardanconstructie
 - Conserveren overgangsconstructie
 - Coördinatie raakvlak nevenopdrachtnemer





Deel 2: Revisie hydraulische cilinder (fabriek)

Mededinging ontbreekt om technische redenen


Onderhandelingsprocedure

Scope geen onderdeel van deze bijeenkomst

- Werkzaamheden
 - Vervangen stangdeklaag zuigerstang C35
 - Vervangen afdichtingen en lagering
 - Revisie cilinder



4. Contractvorm (deel 1)

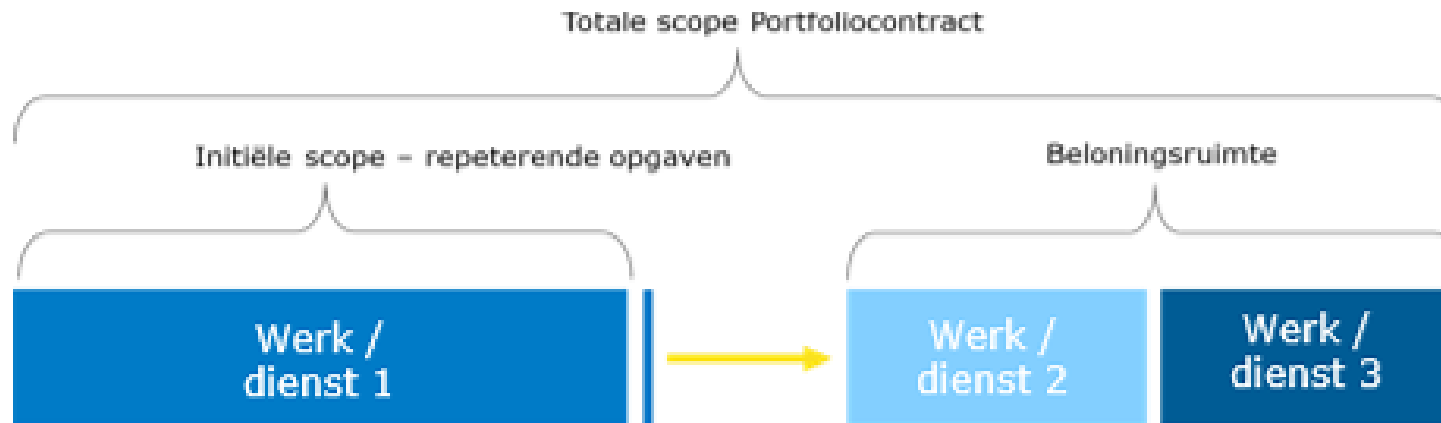

Figuur II.2. Voorbeeld opbouw portfolio met één werk of dienst in de eerste opdracht

Portfolio met 1 Opdrachtnemer
Lange looptijd (15-18 jaar)
ROK met NOK's of Herzieningsclausules



5. Voorgenomen Aanbestedingsvorm

- **Concurrentie gerichte dialoog**
- Publicatie, informatiebijeenkomst, aanmelding
- Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen (ervaring, bekwaamheid)
- Dialoogfase I (optioneel):
 - indienen trechtering product (afgeleide van 1 gunningscriterium)
 - Selectie a.d.h.v. trechtering aantal gegadigden terug brengen naar maximaal 3
- Dialoogfase II
- Mogelijke aanpassing aanbestedingsdocumenten
- Inschrijving, beoordeling op BPKV-criteria, gunning



6. Vervolg planning

Vervolg planning	
Datum marktconsultatie op het Topshuis	16 juni 2025
Uiterste datum tot het stellen van vragen (n.v.i.) over de marktconsultatie en het marktconsultatiedocument (via TenderNed)	18 juni 2025
Uiterste datum voor het indienen van de ingevulde vragenlijst	18 juni 2025
Publiceren nota van inlichtingen	20 juni 2025
Data voor eventuele mondelinge toelichtende gesprekken	23 juni 2025 – 26 juni 2025
Afronding en publiceren resultaten	9 juli 2025



7. Afsluiting - vragenlijst

Nr.	Vraag
1	RWS overweegt de hijswerkzaamheden vanaf de weg voor te schrijven. Hoe kijkt u hiernaar in relatie tot ontwerpvrijheid en risico's?
2	Portfolio-aanpak en looptijd overeenkomst. Wat vindt u van: • Duur per perceel en de totale doorlooptijd van de overeenkomst; • Voorwaarden m.b.t. het laten doorlopen van vervolgpercelen.
3	Welke risico's/kansen ziet u bij dit project en op welke wijze kan beheersing hiervan plaatsvinden? Bij deze vraag graag aandacht besteden aan: a. Risico's in het kader van raakvlakmanagement met nevenaannemers; b. Kansen in het kader van versnelling; c. Overige risico's.
