



**Algemene inlichtingen ronde N264.39 “Groot onderhoud N264
Odiliapeel-Haps” d.d. 11 februari 2025**

Provincie Noord-Brabant

Agenda

1. Opening en algemene mededelingen
2. Even voorstellen
3. Toelichting project
4. Bijzonderheden
5. Aanbestedingsproces en planning
6. Vragen
7. Sluiting

Remco de Jong / Jan de Kruijf

Remco de Jong

Jowan Smulders / Mervyn Suurmond

Mervyn Suurmond / Wouter van der Kramer

Laurens den Oudsten / Remco de Jong


Remco de Jong

Remco de Jong / Jan de Kruijf

Opening en algemene mededelingen

- Doel bijeenkomst
- Projectteam Provincie Noord-Brabant
 - Jan de Kruijf, Projectmanager
 - Dirk van der Linden, Contractmanager realisatie / directievoerder
 - Laurens den Oudsten, Contractmanager voorbereiding
 - Jowan Smulders, Technisch manager
 - Rick Groenen, Omgevingsmanager
 - Remco de Jong, Inkoper
 - Mervyn Suurmond, Technisch manager adviesbureau TAUW
 - Wouter van der Kramer, Contractmanager adviesbureau TAUW
- Presentatie wordt gepubliceerd in TenderNed
- (Officiële) vragen en communicatie via TenderNed, vragen over deze presentatie of over het proces kunnen vanmiddag gesteld worden

Toelichting project

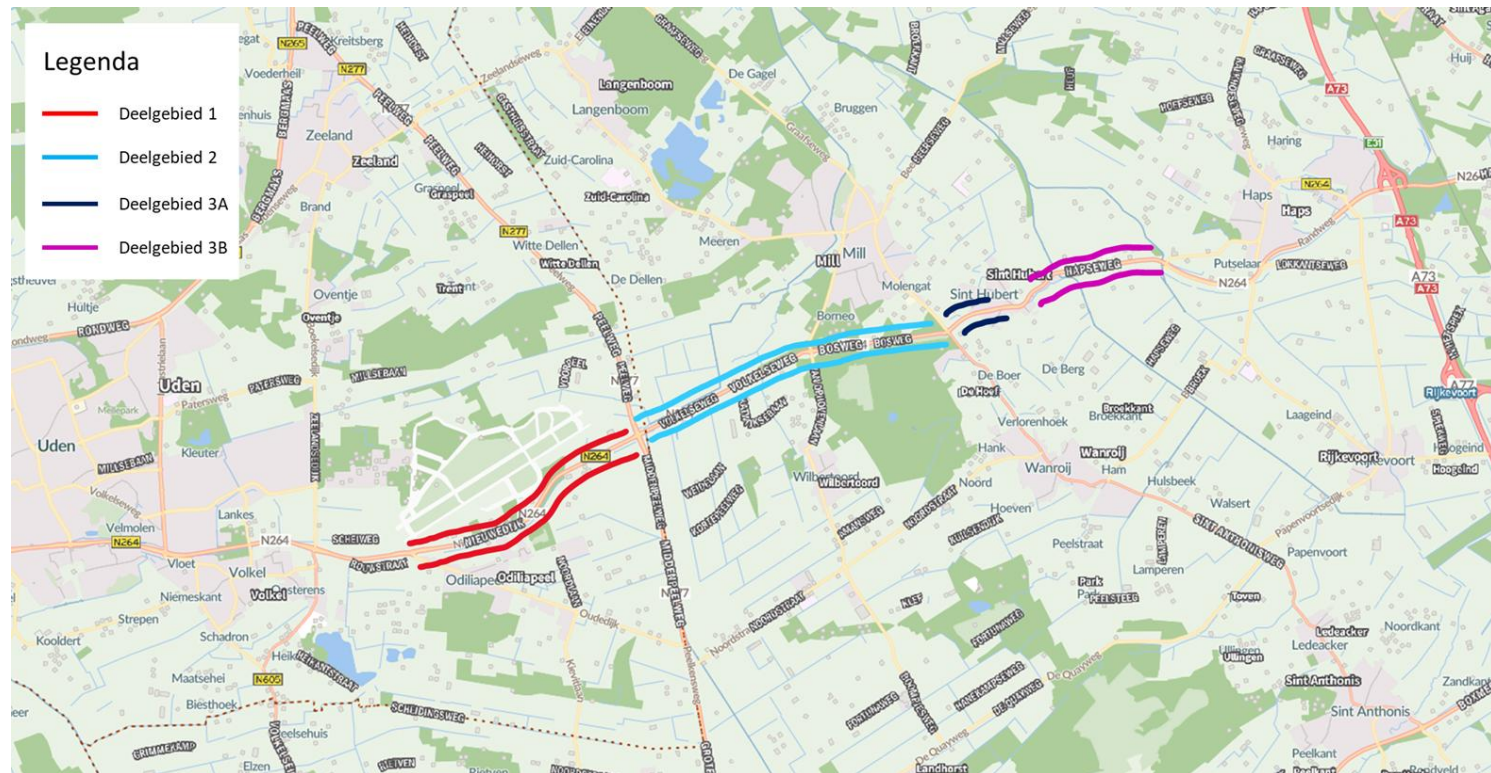

Toelichting project

N264


- 80 km/h Gebiedsontsluitingsweg (GOW)
- Type II (1x2), met parallelweg
- Laanbeplanting en watergangen
- Landbouwverkeer (gedeeltelijk) op hoofdrijbaan
- Kruising met N277



Toelichting project

Deelgebied 1

1. Alleen onderhoudswerkzaamheden.
2. Raakvlak met project 'Verlengde Noordlaan' van Gemeente Maashorst.
3. (Medio 2027 worden hier veiligheidsmaatregelen getroffen)

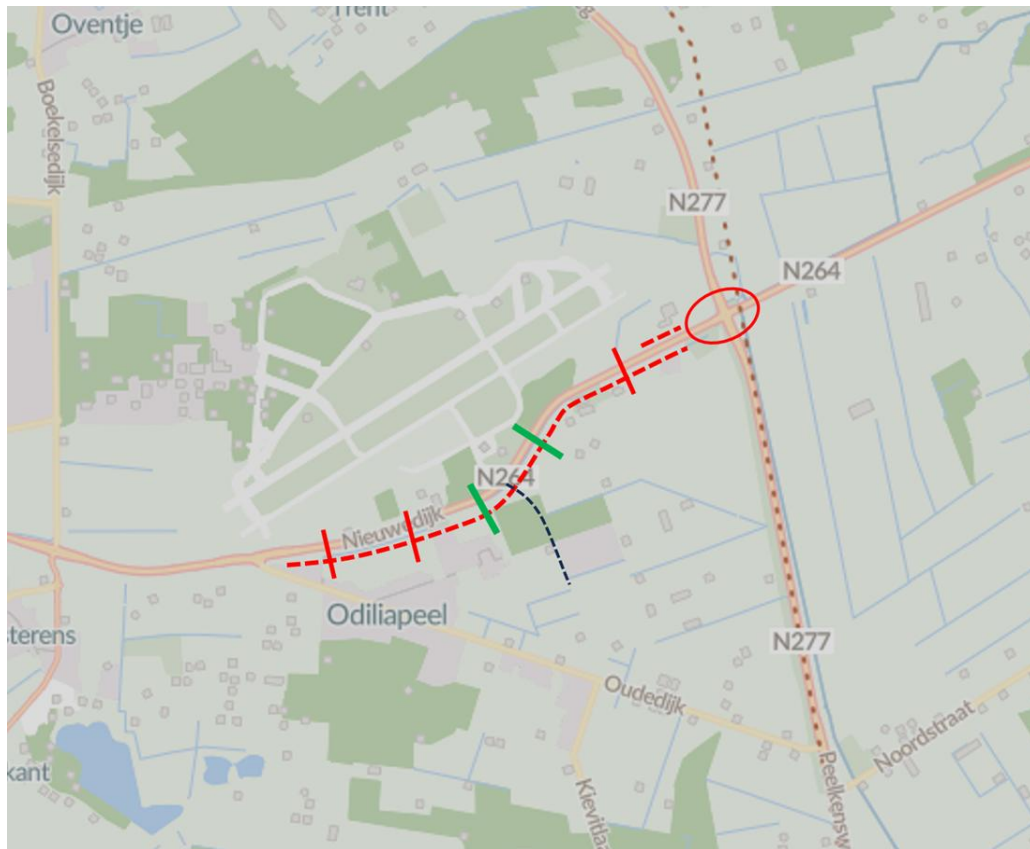

Toelichting project

Deelgebied 2

1. Onderhoudsmaatregelen verhardingsconstructie
2. Het vervangen van de deklaag van rotonde Vorleweg en rotonde Erica (gemodificeerd asfalt) + eventuele schades
3. Het aanleggen van twee fiets oversteekplaatsen
4. Onderhoud (+ engineering) kunstwerk(en)
5. Het aanleggen van een HWA systeem
6. Het kappen, herplanten en aanbrengen van bomen
7. Het toepassen van geleiderail (obstakels)
8. Aanbrengen Openbare Verlichting



Toelichting project

Deelgebied 3a+b

1. Onderhoudsmaatregelen verhardingsconstructie(s)
2. Het saneren van een bedrijfsinrit ter hoogte van restaurant Erica
3. Het aanleggen van twee fietsoversteekplaatsen
4. Het instellen/ behouden van een adviessnelheid van 60 km/h op een trajectdeel
5. Onderhoudswerkzaamheden fietspaden deelgebied 3A
6. Het verwijderen bomen in de obstakelvrije zone en aanbrengen nieuwe bomen
7. Het toepassen van geleiderail



Bijzonderheden

Kabels en Leidingen

- Knelpunten, vooroverleggen en VtA/ VtM verstuurd
- Coördinatie K&L opgave in bestek (in VtA/ VtM zijn ruime 'slots' gecommuniceerd)
- Combineren uitvoering: Afsluitingen/ omleidingen

Raakvlak met Verlengde Noordlaan

- Project Gemeente Maashorst, uitvoering medio mei/juni 2025 (nog afhankelijk van vergunning)
- Deelgebied 1, relatief weinig werkzaamheden

Stikstof en AdBlue

- Knip van projecten en deelgebieden/ uitvoering
- Voorwaarden uit AERIUS

Bijzonderheden

Aanvulling in de 1e Nvl

Rotonde Vorleweg

-Alleen deklaag (en evt. schades tussenlaag)

Openbare Verlichting

-Nieuwe E-kasten en aansluitingen

Kabels en Leidingen

-Eventuele overeenstemmingen (POS)

Aanbestedingsproces + planning

Naam	Gepland	Afgerond
Publiceren vooraankondiging	11 nov. 2024	11 nov. 2024
Publiceren aankondiging van de opdracht	27 jan. 2025	24 jan. 2025
Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten	24 apr. 2025, 11:55	-
Inlichtingenbijeenkomst inschrijffase	11 feb. 2025, 14:30	-
Vragenronde 1 inschrijffase: startdatum	27 jan. 2025, 10:00	-
Vragenronde 1 inschrijffase: einddatum	18 feb. 2025, 10:00	-
Vragenronde 1 inschrijffase: bekendmaken nota van inlichtingen	27 feb. 2025	4 feb. 2025
Vragenronde 2 inschrijffase: startdatum	28 feb. 2025, 10:00	-
Vragenronde 2 inschrijffase: einddatum	20 mrt. 2025, 10:00	-
Vragenronde 2 inschrijffase: bekendmaken nota van inlichtingen	3 apr. 2025	-
Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	24 apr. 2025, 12:00	-
Gestanddoening (Vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)	2 Maanden	-
Opening van de kluis met inschrijvingen	24 apr. 2025, 12:05	-
Versturen gunningsbeslissing	16 mei 2025	-
Versturen gunning	5 jun. 2025	-
Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht	1 jul. 2025	-
Aanvang van de opdracht	6 jun. 2025	-
Voltooiing van de opdracht	31 dec. 2025	-

Aanbestedingsproces + planning

Referenties (1, max 2 en <5 jaar)

1. Ervaring met het uitvoeren van Groot Onderhoud
2. Ervaring met het ontwerpen en plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van Groot onderhoud op provinciale wegen

Aanbestedingsproces + planning

Kwalitatieve documenten

	Nr	Kwaliteitscriterium	Maximale Kwaliteitswaarde (KW)	In %
	1	Plan van aanpak		
	1a	Borging bereikbaarheid en doorstroming	€ 800.000,-	20
	1b	Uitvoeren omgevingscommunicatie en beperking hinder	€ 800.000,-	20
	2	Duurzaamheid		
	2a	Omvang milieukosten (MKI)	€ 2.400.000,-	60
		Maximale totale fictieve aftrek	€ 4.000.000,-	100

Aanbestedingsproces + planning

Plan van Aanpak

Borging bereikbaarheid en doorstroming

Doel: Het Plan van Aanpak beschrijft welke concrete maatregelen Inschrijver neemt om een zo optimaal mogelijke bereikbaarheid van stakeholders te waarborgen gedurende de uitvoering.

Uitvoeren omgevingscommunicatie en beperking hinder

Doel: Het Plan van Aanpak beschrijft welke concrete maatregelen Inschrijver neemt om de bouwcommunicatie effectief en efficiënt te laten verlopen en zo min mogelijk hinder laat ontstaan als gevolg van de werkzaamheden.

Aanbestedingsproces + planning

MKI

De MKI-waarde dient te worden berekend voor een geselecteerde scope (conform referentie MKI-berekening):

- Gesloten verhardingen (dek-, tussen en onderlagen, kleeblagen, betonverharding)

Vragen



Interessante links

- Donderdag 20 februari 2025: aanmelden kan nog!
 - <https://www.publicatiessamenwerking.nl/brabantse-infra-relatiedag-2025/>
 - Aanmeldformulier: [Aanmelden Brabantse infra relatiedag 2025](#)
- Toekomstige infraprojecten in Noord-Brabant:
 - <https://www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegen-infraprojecten-brabant/publicatie-toekomstige-infrastructurele/>

Opmerkingen, vragen en suggesties altijd welkom!



**Bedankt voor uw komst en veel succes met de
voorbereiding van uw aanbieding!**

Provincie Noord-Brabant
