



Welkom!

Bij de 1e inlichtingenbijeenkomst

Suppletie Galgeplaat en Slikken van den Dortsman



Agenda

1. Opening
2. Project
3. Ontwerp en opgave
4. Omgeving
5. Contract, aanbesteding
6. Vragen



1. Opening

Wie zijn wij?

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Opdrachtgever | Ina de Bruin |
| - Projectmanager | Koen Heerkens |
| - Technisch manager | Machiel Crielaard |
| - Omgevingsmanager | Cees Busé / Mario de Wever |
| - Manager Projectbeheersing | Ricky Janse |
| - Contractmanager | Bouke van den Bunt |

Mededelingen

- Presentielijst
- Verslaglegging
- Vragen



2. Project



Rijn-, Maas- en Scheldemonding in 2050

Met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) versterken we de ecologische waterkwaliteit en de natuur van de grote wateren in Nederland. Dit is goed voor de leefbaarheid en vergroot bovendien de economische waarde.



PAGW

- 4 gebieden
- 30 projecten




Aanleiding





Zandplaten Oosterschelde verdwijnen

Ontwikkeling voedselgebieden voor vogels

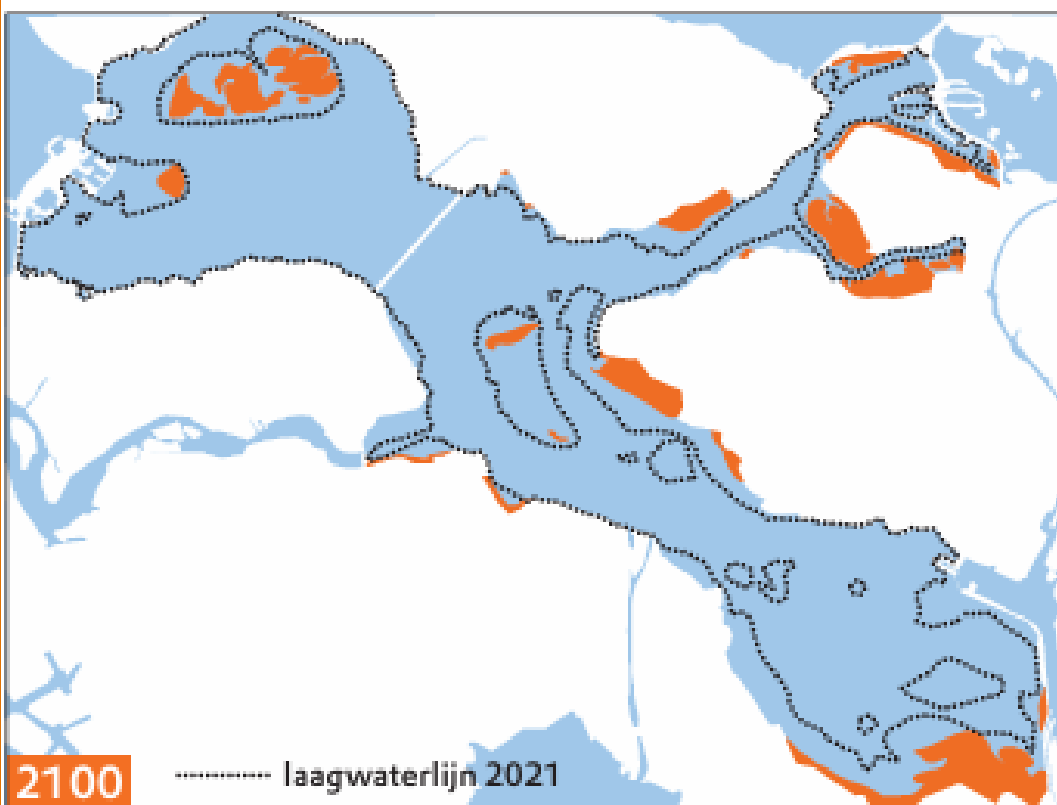

Wegrestaurant voor vogels steeds korter open

Openingstijd Galgeplaat en Slikken van den Dortsman

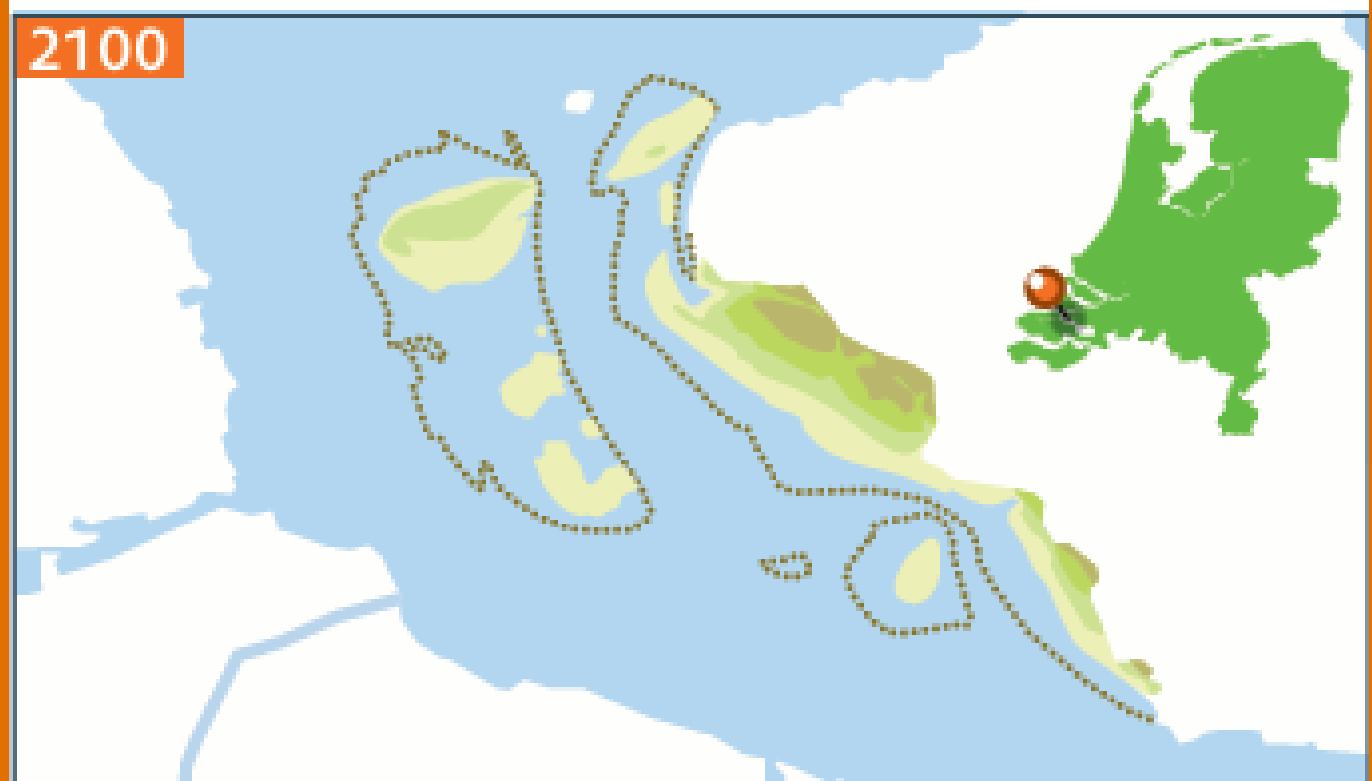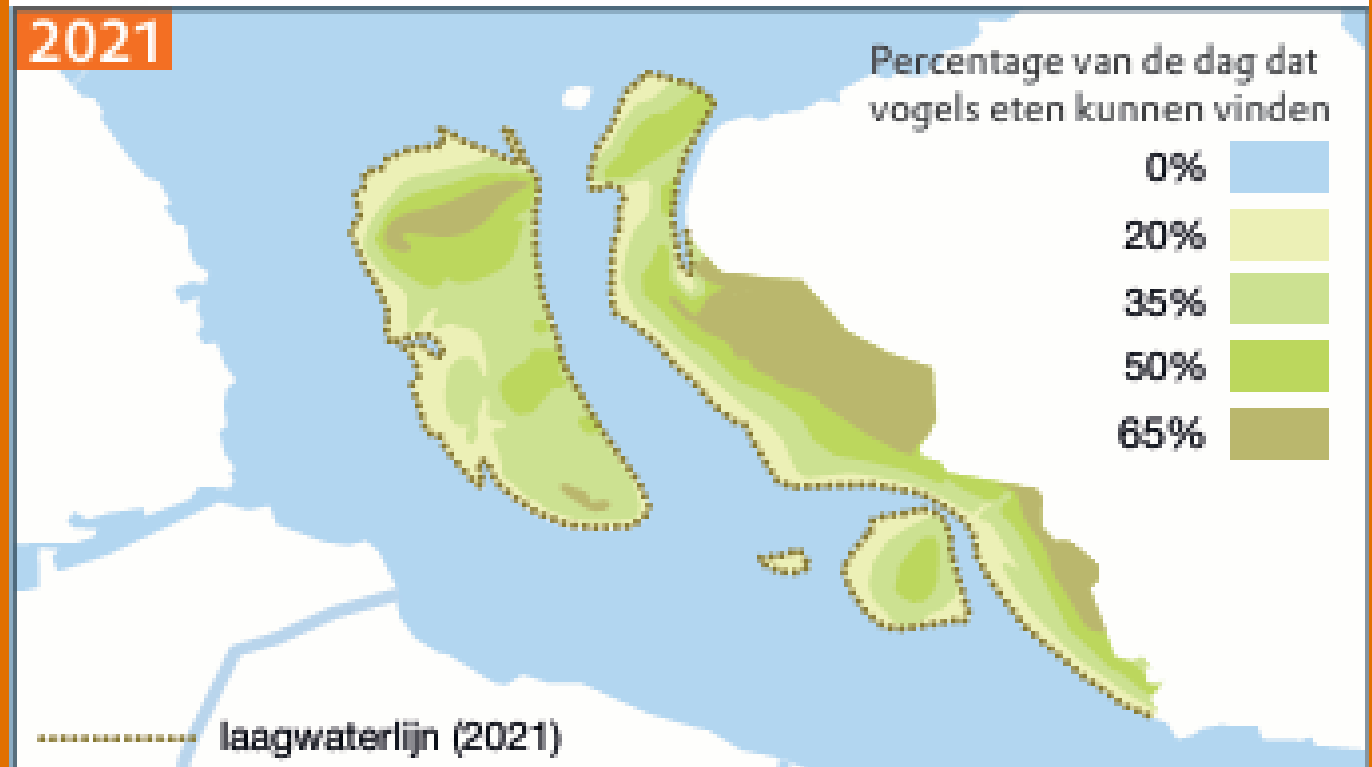



Doel zandsuppletie

- Behoud voedselvindplaats voor de steltlopers
- Behoud rustgebied voor de zeehonden
- Ontwikkelen van kennis voor toekomstige zandsuppleties in de Oosterschelde






3. Ontwerp en opgave

Uitgangspunten ontwerp



Uitsluitgebieden / randvoorwaarden

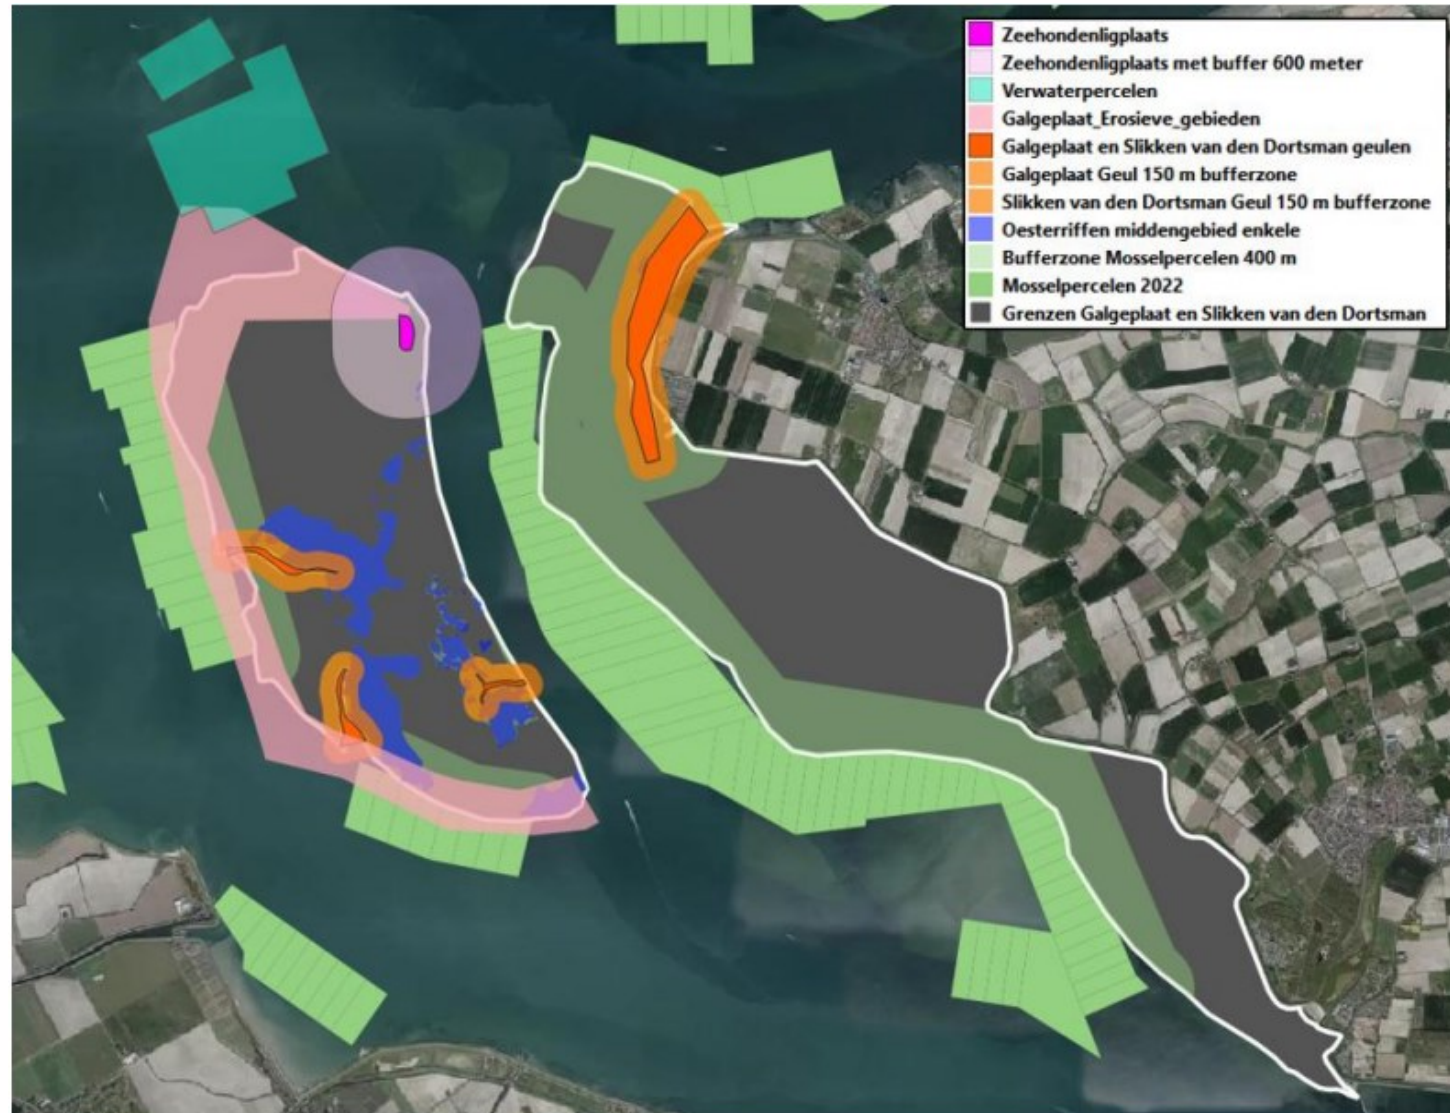

- 600m afstand tot zeehondenrustplaats
- 400m afstand tot mosselpercelen
- Uitsluiten erosieve gebieden ($>0,01\text{m}$ per jaar)
- 150m afstand tot afwateringsgeulen
- Niet meer dan 50% van de oesterriffen bedekken, ontzien oesterriffen

Aanwezigheid vogels dus uitgesloten (rode arcering)



- Niet suppleren op locaties met hoge dichtheid vogels

50-80% droogvalduur is groen meer
dan 80% is zwart


Suppletieontwerp



Suppletieontwerp Bijzonderheden



Element 1
- Invang slib,
organisch
materiaal

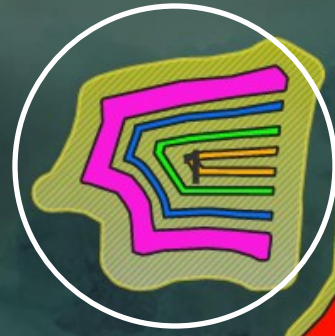

Element 5
Aanleg met
hoger organisch
gehalte



Element 4 en 6
Dubbele
aanleghoogte



Suppletieontwerp Raakvlakken



Droogvallende
plaat Witte-
Tonnen Vlije

Suppletie 2 ligt
tegen oude
suppletie aan
(2008)

Element 6 en 7

- Bij laagwater bereikbaar vanaf land
- Zeegrasvelden en slikontwikkeling
- Gemaal de Noord



Locaties Vaarwegonderhoud en zandwinning

- 6 vaarwegonderhoudslocaties waar vaarweg op diepte gebracht dient te worden
- Zandwinvak Wemeldinge



Realisatie



Uitvoeringsvenster:

-Ligt tussen 1 oktober 2026 en 31 maart 2027

Opdrachtnemer doet inmeting en uitmeting, NL A, combinatie van Lidar RTK en Multibeam

Inzet van MARS voor monitoring en evaluatiedoeleinden

Doelstellingen in realisatie

- De schade aan omliggende mosselpercelen door de werkzaamheden zoveel als mogelijk voorkomen.
- De ecologische waarde van de Galgeplaat en de Slikken van den Dortsman zo spoedig mogelijk herstellen en daar waar mogelijk vergroten.
- Draagvlak voor het project behouden en waar mogelijk vergroten en bijdragen aan een goede relatie van Opdrachtgever met stakeholders.

Monitoring



Projectmonitoring (OG)

T=0

- Hoogteligging
- Bodemleven
- Laagwatertelligen vogels

Tot oktober 2026

Monitoring uitvoering (ON)

- Vertroebeling
- Hoogteligging (in en uitmeting, zakbakens)
- MARS
- Karakteristieke supplementen

Projectmonitoring (OG)

- Hoogteligging
 - Bodemleven
 - Laagwatertellingen vogels
- T=1/T=5

2027-2032

Risicomonitoring (OG)

Achtergrond ontwikkeling mosselweek

2025-2028

Veiligheid




- **Werken bij slechte/zware weersomstandigheden en bij duisternis**
 - Keuze voor winterseizoen vanwege ecologie en de cyclus van mosselkweek.
- **Werken in een getijdengebied**
 - Snel opkomend water
- **Werken langs een hoofdtransportroute scheepvaart**
 - Zichtbaarheid is noodzakelijk
- **Afstemmen met schelpdier -en visserijsector**
 - Specifiek voor element 6 en 7 in verband met vrije toegankelijkheid laag water

4. Omgeving



Complexe omgeving

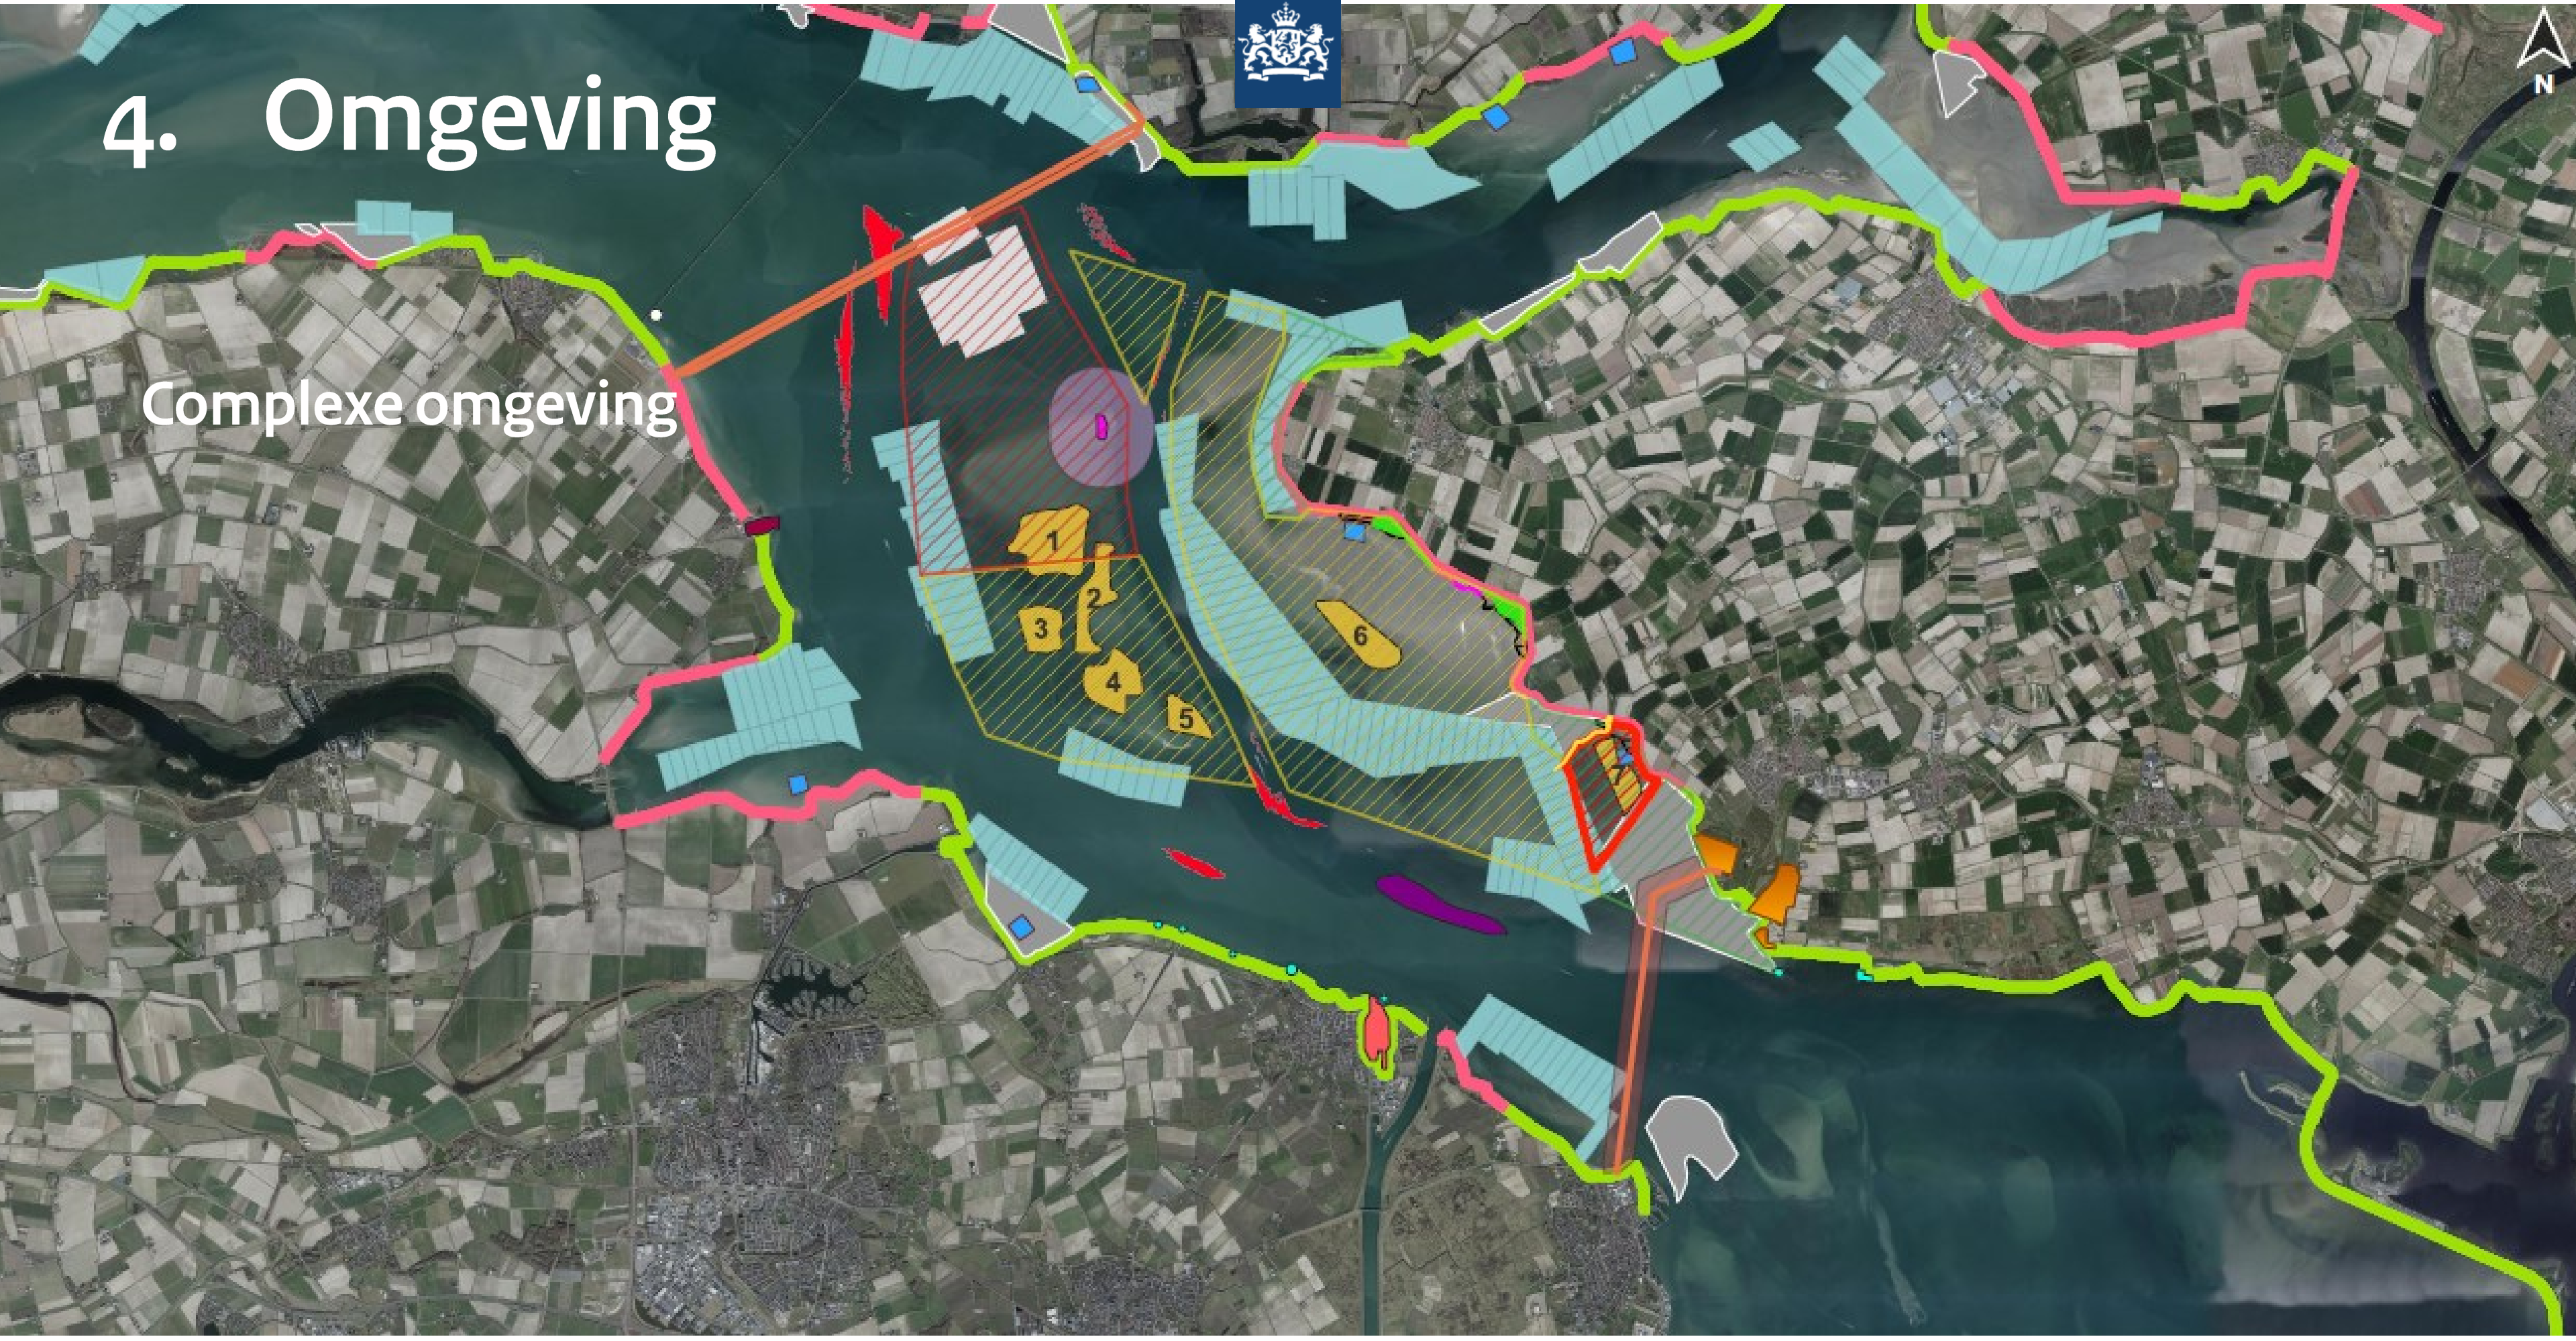

Aandachtspunten omgeving

Vergunningen

- Omgevingsvergunning (OG)
- Uitvoeringsvergunningen (ON)

Stakeholders



Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

SCHUTTEVAER



OP HANDKRACHT VERDER





5. Contract

Design & construct

- Resultaat: aan te brengen profielen
 - Beginsituatie: RWS lodingen (2021)
 - Inmeting door ON, verschil verrekenen
 - Geen MKI bovenop TIER-III en pelotoneisen
- } Basis voor inschrijving

Aan te brengen profielen:

- Deze maand (nov. '25) RWS update op TenderNed
- Aangepaste profielen waar compensatie van zetting in verwerkt is
- Zettingsproces vindt bijna geheel plaats buiten contractduur
- Risico's omtrent zetting na uitmeten: OG
- ON: uitmeten kort (1-2 wk.) na realiseren profielen



Documenten

- Vraagspecificatie
 - Bijlagen bij vraagspecificatie
 - Informatieve documenten
- Projectvoorwaarden
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Criteria beste prijs/kwaliteitsverhouding
 - Plan van Aanpak
 - Verklaringen



Planning procedure

Inlichtingenperiode

- Eerste inlichtingenbijeenkomst
- Tweede inlichtingenbijeenkomst
- Indienen vragen via Tendered
- Nota van inlichtingen
- Inschrijving

woensdag 5 november 2025

dinsdag 25 november 2025 tot 15.00 uur
t/m 18 december 2025

donderdag 22 december 2025

donderdag 20 januari 2026 tot 15.00 uur

Geen projectbezoek

Beoordelingsperiode

- Voornemen tot gunning
- Opdrachtverlening

vrijdag 20 februari 2026

vrijdag 13 maart 2026



6. Vragen ?

- Vragen worden, zo mogelijk, hier beantwoord
- Los hiervan: stel uw vraag graag (ook) op TenderNed.
 - > hiermee de informatie expliciet en het speelveld gelijk
- De vragen en antwoord op TenderNed zijn bindend
