

Informatiebijeenkomst Instandhouding Zwartewaterbrug



Welkom & doel informatiebijeenkomst

- Welkom
- Voorstellen projectteam
- Doel van deze bijeenkomst:
 - informeren over het project instandhouding Zwartewaterbrug
 - toelichten van de marktconsultatie
- Input wordt gebruikt ter voorbereiding van de opdracht
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan hetgeen vandaag vermeld wordt
- Stellen van vragen kan tussendoor en/of aan het eind
- Duur ca. 50 – 60 minuten incl. vragen

Projectteam

- Wolter Scholten (projectmanager & manager projectbeheersing)
- Wencke Scholten (contractmanager)
- Lars Haverkort (omgevingsmanager)
- Mariska van Spellen (projectondersteuner)
- Technisch manager vacant
- Gerbrand Sinnema (inkoopadviseur ONS)

Openbare Europese aanbesteding Instandhouding ZWB

- Marktconsultatie
 - Vragen van provincie (digitaal)
 - **Informatiebijeenkomst**
 - Beantwoording vragen van de provincie
- Aankondiging en publicatie aanbesteding
- Inlichtingen (evt met schouw)
- Inschrijving
- Beoordeling en gunning
- Contractering

Inhoud informatiebijeenkomst

- Projectcontext
- Scope instandhouding Zwartewaterbrug
- Contractering & rolverdeling
- Planning
- Vragen & verduidelijking
- Afronding

Projectcontext













Projectcontext

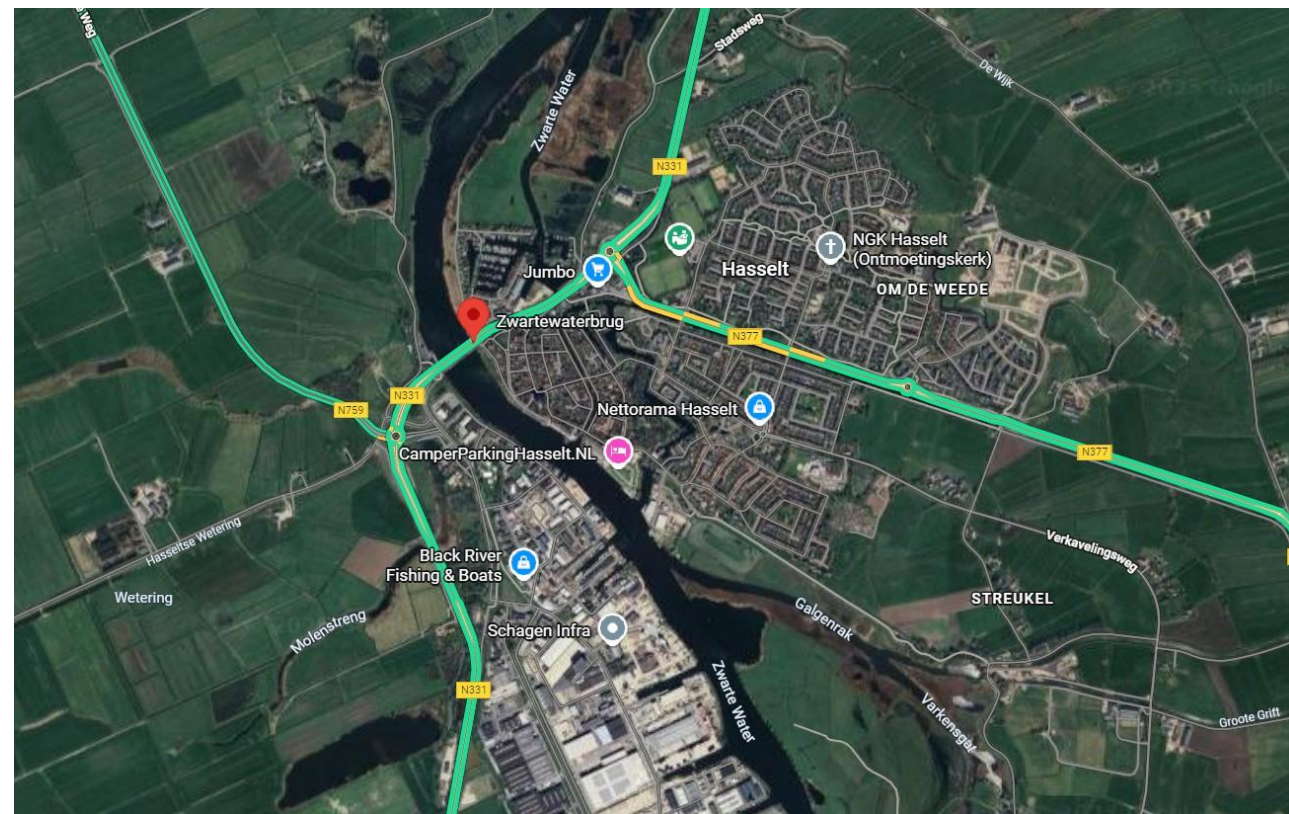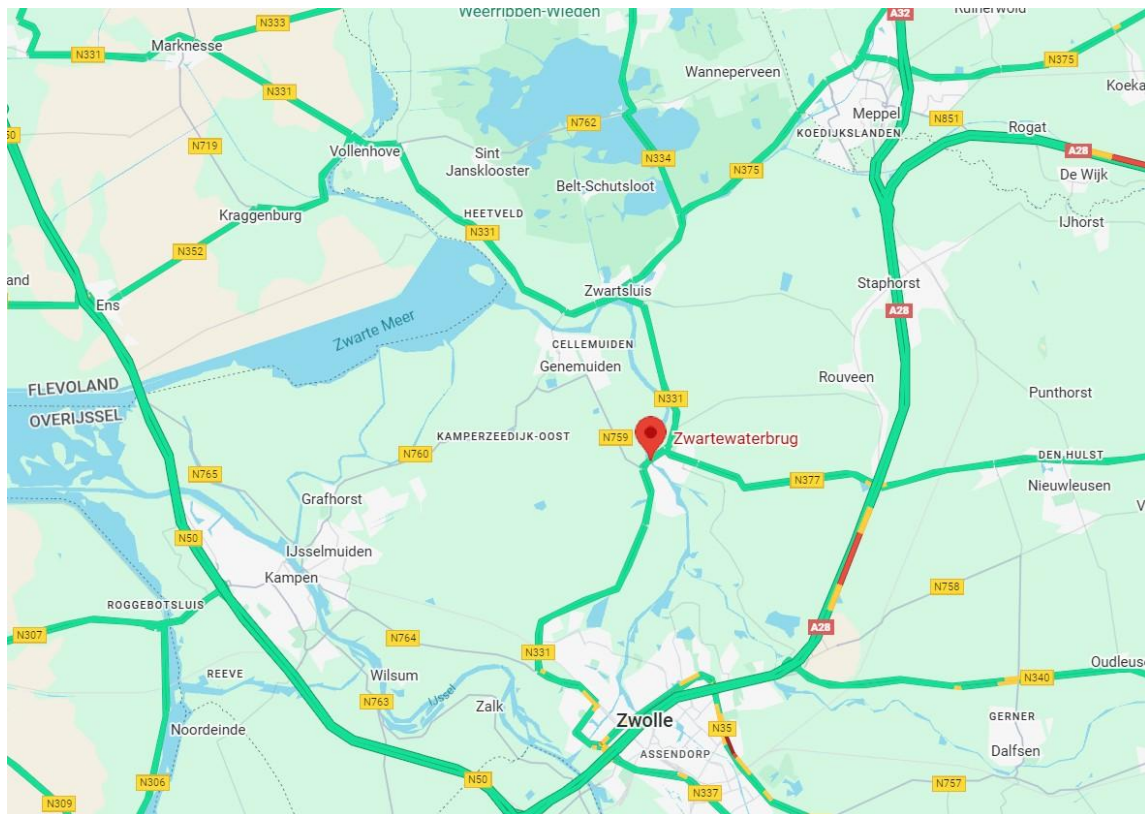

Projectcontext


- De brug nadert het einde van haar levensduur
 - Afgewaardeerd naar een belasting van 45 ton
 - Constructief → vervanging is noodzakelijk
 - Project Vervanging Zwartewaterbrug
 - Brede verkenning naar oplossingen
 - Projectbesluitprocedure
 - Notitie Reikwijdte & detailniveau
 - Huidige brug in stand houden tot nieuwe verbinding gereed is
 - Project Instandhouding Zwartewaterbrug
 - Vervanging en levensduur verlengend onderhoud van onderdelen
- Doel: een veilige, beschikbare en betrouwbare Zwartewaterbrug tot deze vervangen is.

Scope instandhouding Zwartewaterbrug

Wat verstaan wij onder instandhouding?

- Instandhoudingsmaatregelen binnen bestaande functie van de Zwartewaterbrug
- Vervanging en levensduur verlengend onderhoud
- Theoretische beschouwing & inspecties afgelopen jaren

- Bouwteam

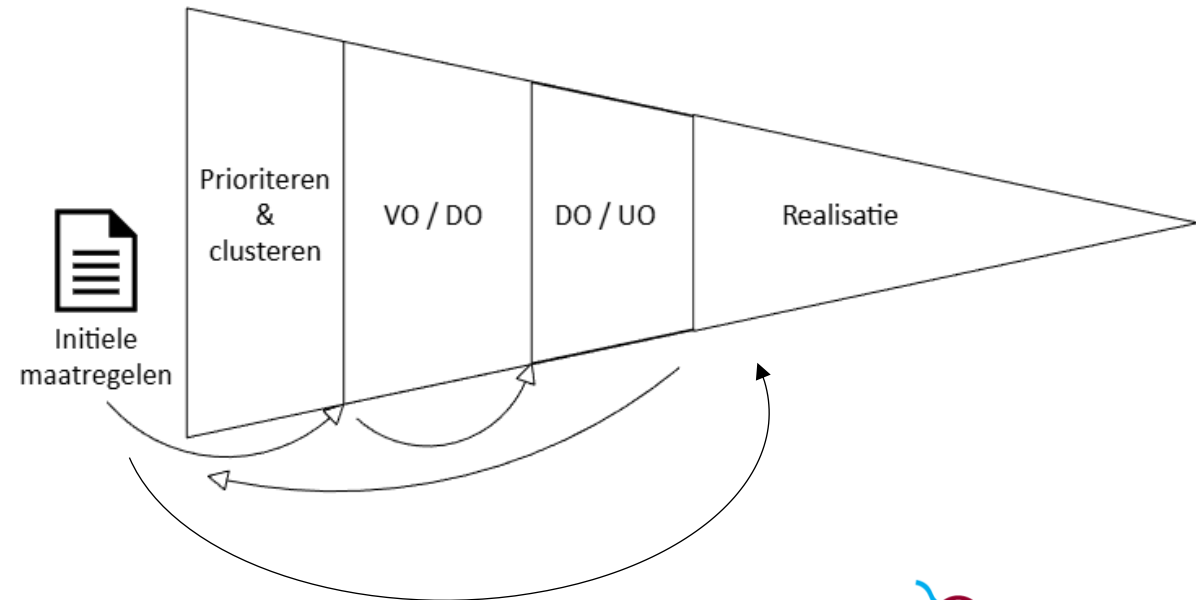

Scope instandhouding Zwartewaterbrug

Indicatieve scopeverdeling initiële maatregelen o.b.v. kosten excl. btw (excl. uitvoeringskosten en staartkosten)

E-installatie	€ 700.000,-
Bediening & besturing	€ 850.000,-
Werktuigbouwkundig	€ 800.000,-
Civieltechnische	€ 250.000,-
Bouwkundig	€ 200.000,-
Inspecties en onderzoeken	€ 100.000,-
Verkeersmaatregelen	€ 100.000,-
Totaal	€ 3.000.000,-

Contractering & rolverdeling

Contractuele uitgangspunten

- Rol opdrachtgever:
 - besluiten wel/niet uitvoeren instandhoudingsmaatregelen
 - afstemmen met stakeholders
 - verzorgen communicatie
 - afstemmen met project Vervanging
- Rol aannemer:
 - inspecties uitvoeren
 - prioriteren & clusteren instandhoudingsmaatregelen (adviserend)
 - ontwerpen
 - signaleren afwijkingen en risico's
 - verkrijgen vergunningen
 - afstemmen met stakeholders
- Rol ingenieursbureau:
 - technisch advies, toetsing en achtervang opdrachtgever

Planning

Planning marktconsultatie

- Uiterlijk indienen antwoordformulier op 23 januari 2026
- Mogelijkheid aanvullende gesprekken op 26 januari 2026 tussen 13:00 en 17:00 uur en 27 januari 2026

Planning aanbesteding

- Publicatie aanbesteding in april 2026
- Start bouwteamfase in september 2026
- Start realisatie in januari 2027

Vragen & verduidelijking

“Heeft u nog overige opmerkingen en/of tips welke nuttig kunnen zijn voor de provincie Overijssel?”

Bedankt voor uw aanwezigheid

