

Voor een **soepele meeting** willen wij jullie op voorhand het volgende vragen:

- Zet je microfoon op aan. De operator zet iedereen op "mute" en geeft deelnemers gericht het woord door geluid per deelnemer aan te zetten. Dit voorkomt dat er door elkaar heen gepraat wordt.
- Zet de camera uit (beperking dataverkeer)
- Problemen met geluid? Bel per telefoon in en bekijk de sheets via het scherm
- Specifieke vragen over het systeem: neem contact op met Vico (vico.de.bruijne@rws.nl, +31646021382)



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vragen kunt u gedurende de presentatie via de **chatfunctie** stellen. Stel vragen aan "iedereen". RWS houdt bij welke vragen gesteld worden echter dienen vragen altijd alsnog via Tendered ingediend te worden om een formeel antwoord te kunnen geven.

Tijdens de interactie zal de microfoon van de vragensteller aangezet worden, zodat de vraag gesteld en beantwoord kan worden.

Algemene Inlichtingenbijeenkomst

Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl Renovatie kanaal fase 1

10 September 2020



Wij heten u welkom



Rob van Aarsen
Projectmanager



Ruud Westerhof
Adviseur Omgeving



Vico de Bruijne
Contractmanager



Agenda

Welkom en opening (Rob)

Toelichting opgave (Rob)

Toelichting opdeling in baselines (Ruud)

Toelichting contract en aanbesteding (Vico)

Vragen

Afronding en afsluiting






Aanleiding

- De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) moet in 2030 geschikt zijn om duurzaam en veilig transport van goederen over het water met klasse Va schepen mogelijk te maken.
- Op de HLD worden daarom een groot aantal verbeteringen gerealiseerd:
 - er worden 8 bruggen vervangen;
 - [het kanaal wordt gerenoveerd en aangepast voor Va](#);
 - het op afstand bedienen van bruggen en sluizen wordt gemoderniseerd.





Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

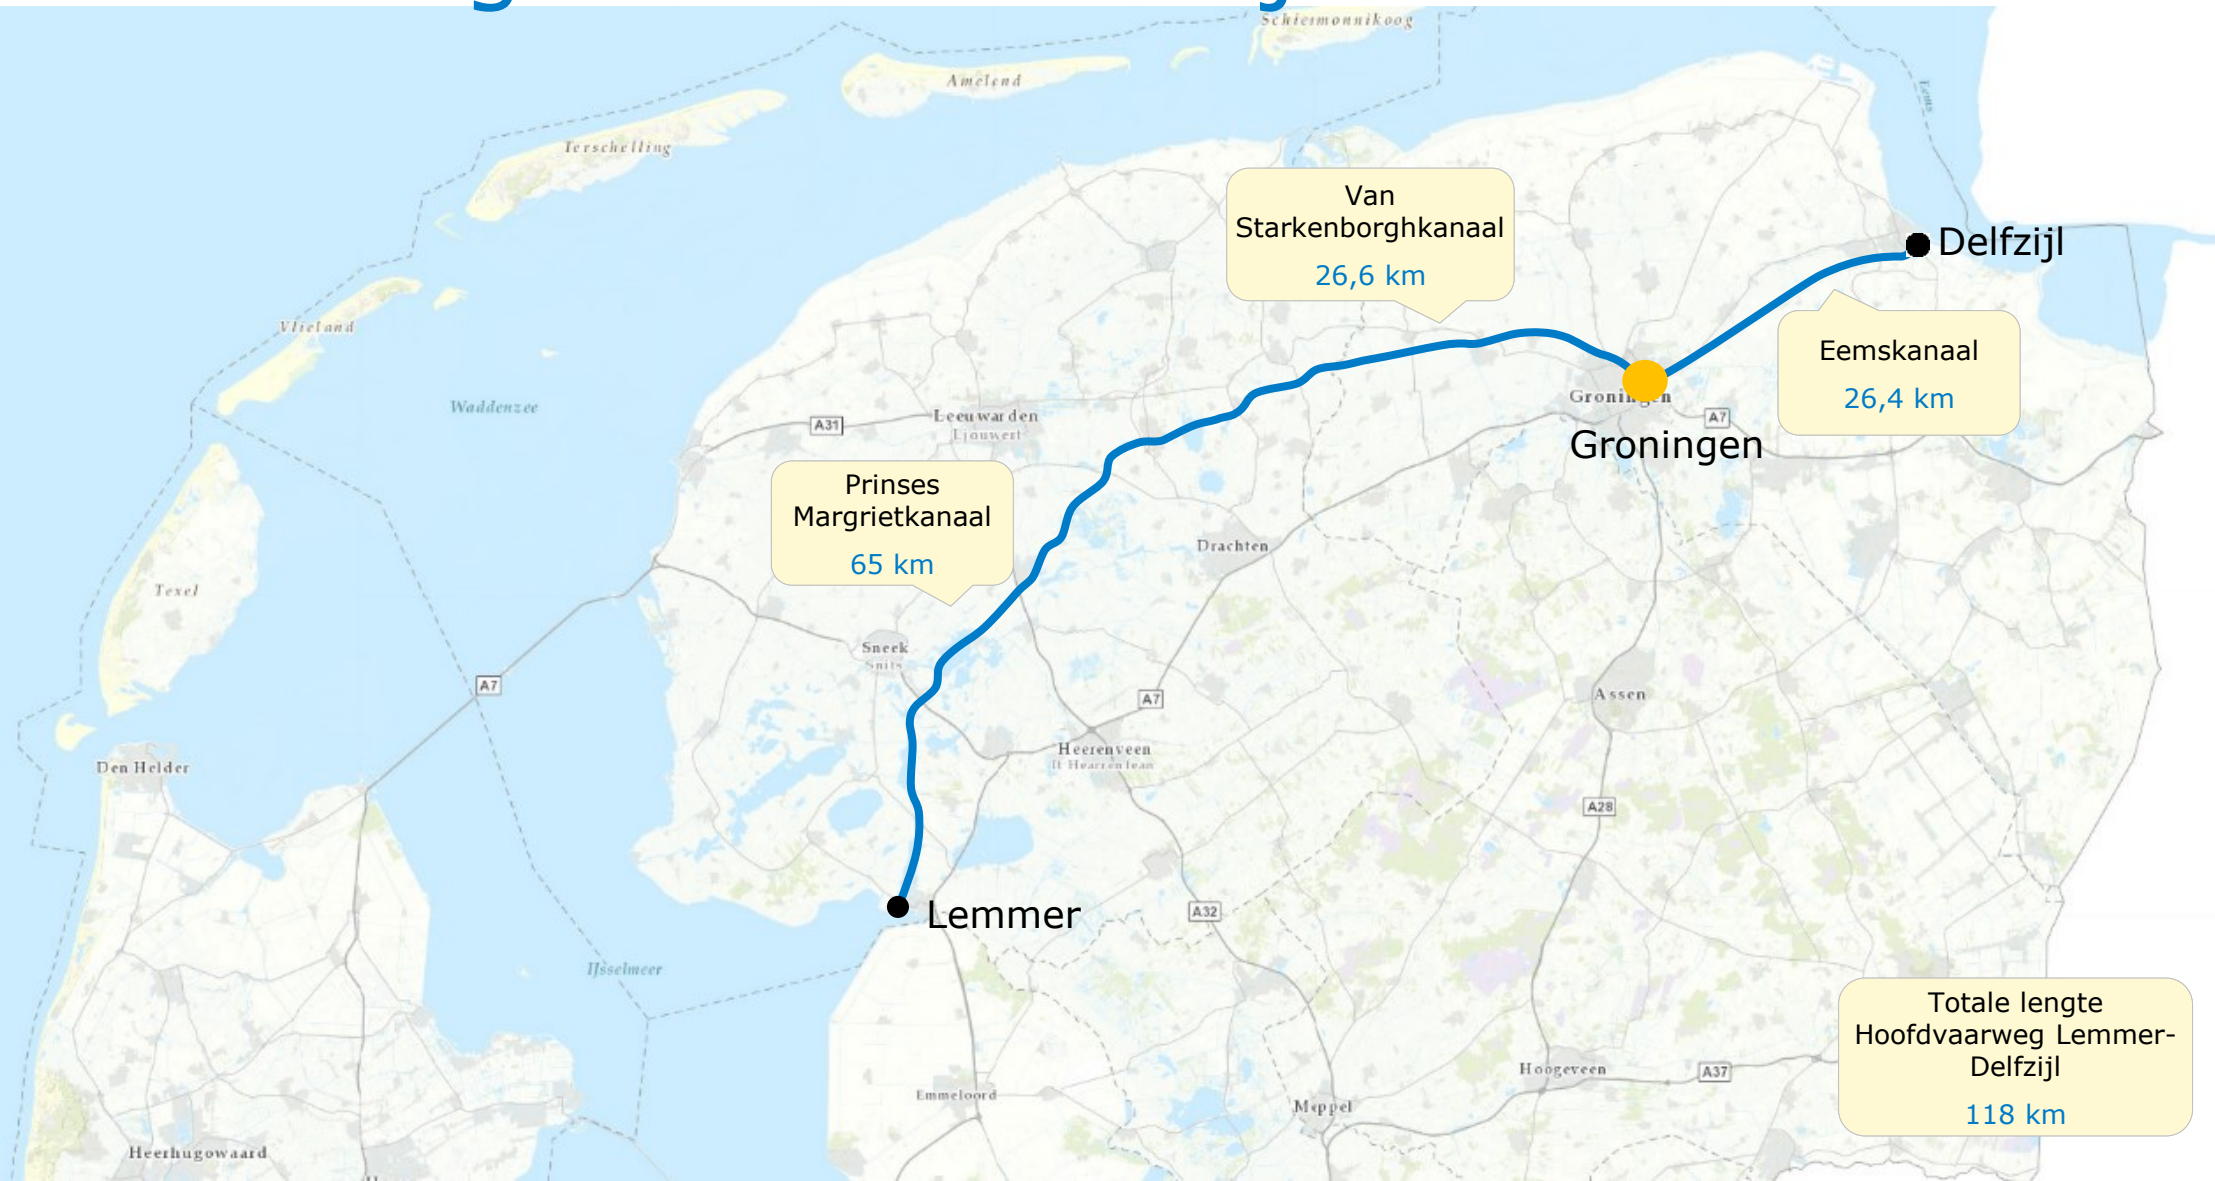




Onze opgave

Integraal onderzoek naar de vervangingsopgaven en optimalisaties om het kanaal technisch en functioneel op orde te brengen:

- Versterken en vervangen van de oevers, geleidewerken en meerpalen
- Aanpassen lig- en wachtplaatsen
- Verdiepen en symmetrisch maken van de vaarweg
- Amoveren sluis Terherne

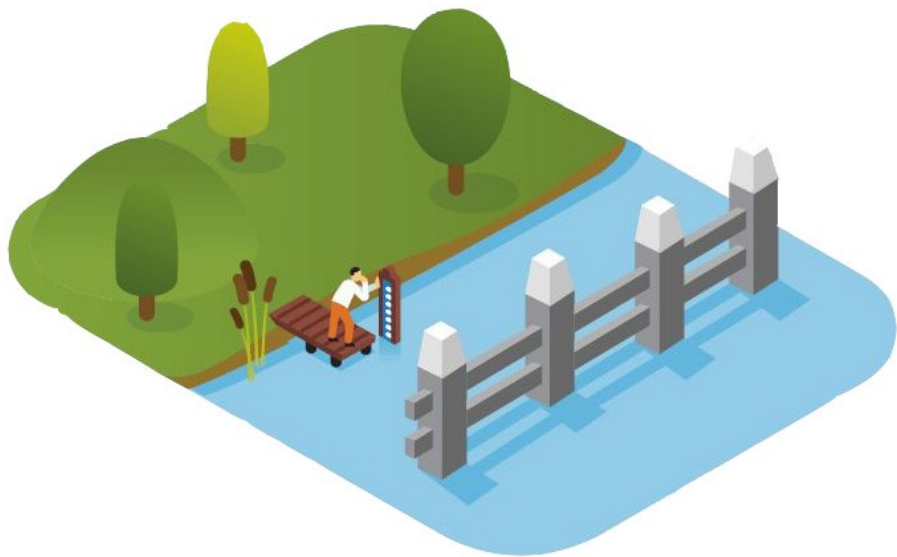




Opgave ingenieursopdracht

- *Baseline 1 en 2 (Stap 1 t/m 3; planstudie)*
 - Onderzoek opwaarderen van de **gehele** vaarweg naar klasse Va (**excl. kunstwerken**)
 - Onderzoek vervangingsopgave (Groot Onderhoud) voor gehele vaarweg
- *Baseline 3 (Stap 4; voorbereiding realisatie)*
 - Realisatiecontract voor een deel van de opgave (tranche 4, ca. k€ 50.000)
- *Optie*
 - baseline 4: RO procedures voor de gehele vaarweg (excl. tranche 4)
 - baseline 5: Realisatiecontract voor de rest van de opgave (ca. k€ 225.000)



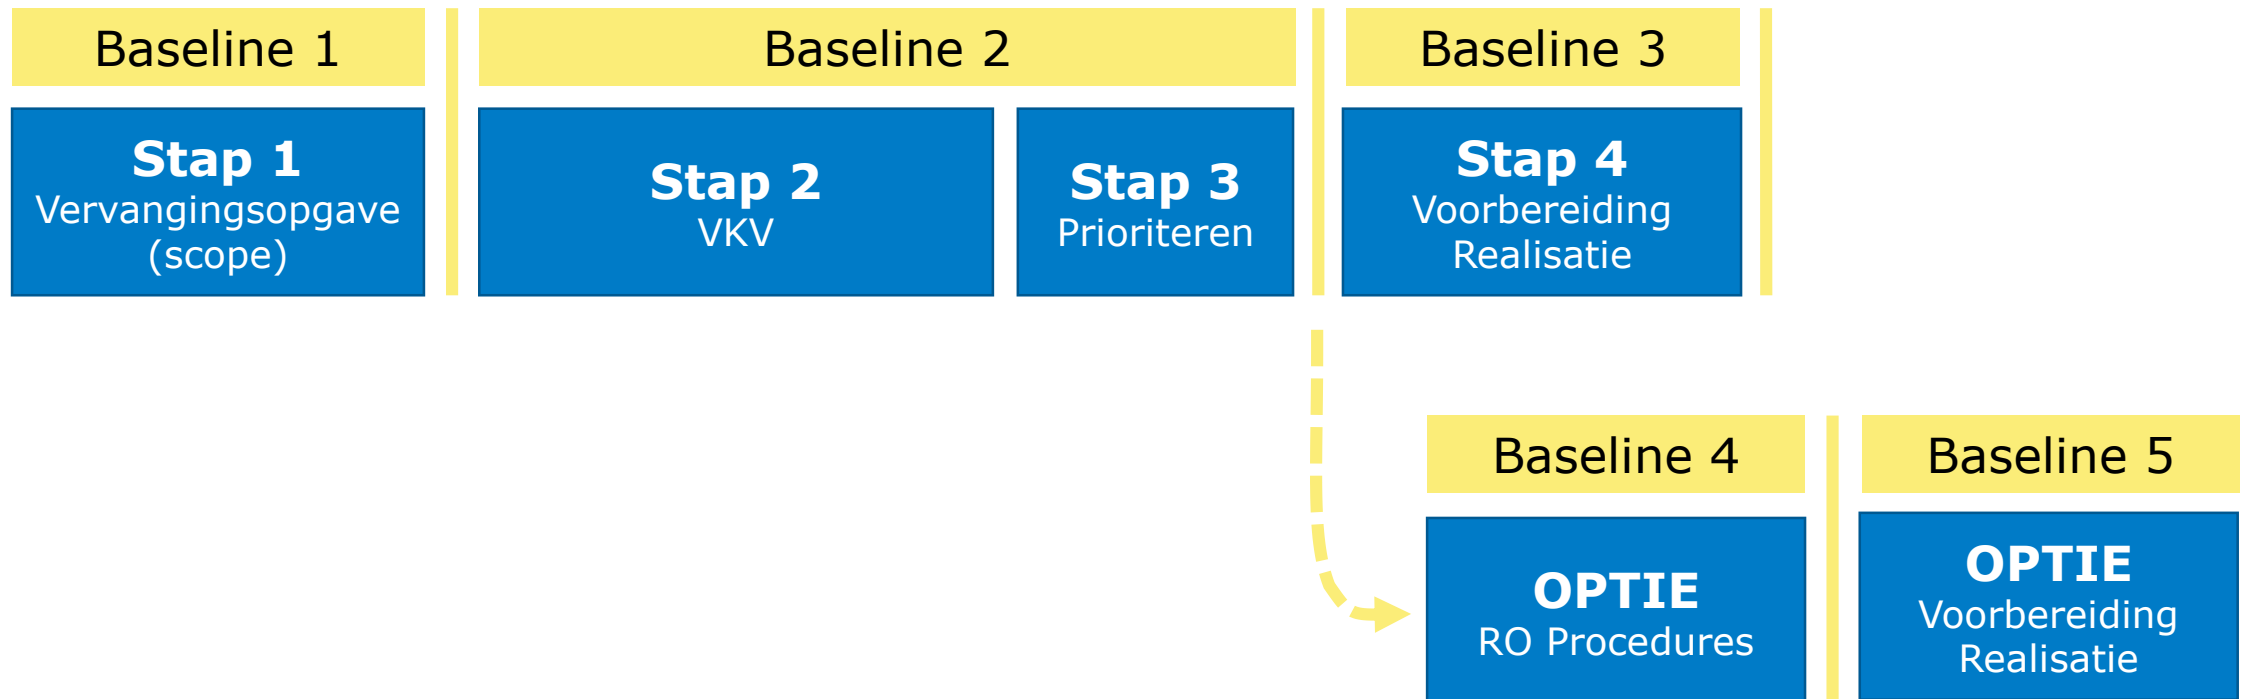




Uitgangspunten overeenkomst

- Best Value Aanpak: samenwerking met de best beschikbare expert die de opdracht kan uitvoeren
- Dienstverleningsovereenkomst onder ARVODI-2018
- Opdracht bestaat uit 3 baselines (stappen 1, 2+3 en 4)
 - Opschortende voorwaarde
 - Bij baselineovergang herijking scope en prijs
- Gericht op samenwerking
 - Horizontaal samenwerken aan gezamenlijke belangen



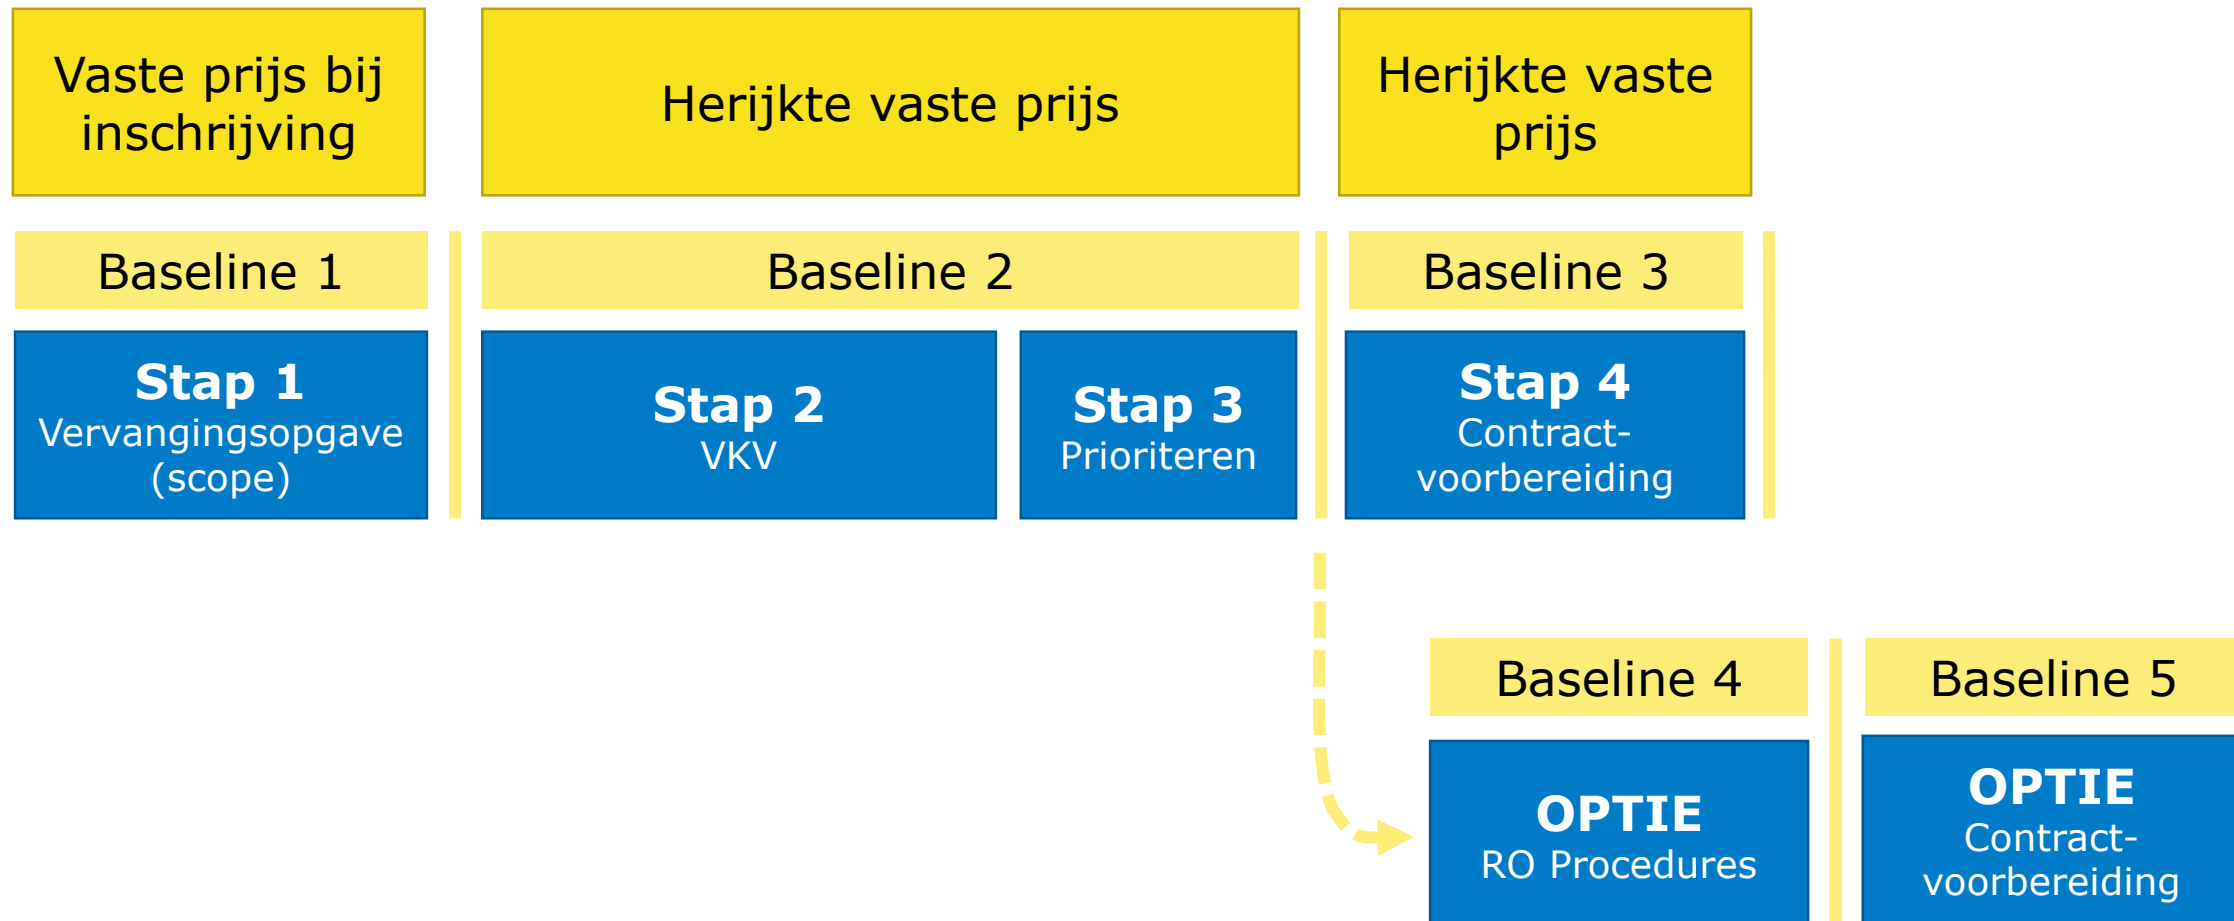



Opties

Afhankelijk van

- Resultaat BL 2
- Presteren tijdens overeenkomst
- Opdracht Ministerie
- Overeenstemming scope en geld





Aanbestedingstraject

- Aanmelding: uiterlijk 28 september via TenderNed
 - Voldoen aan geschiktheidseisen
 - Ranking op selectiecriteria (5) en loting (1)
- Inschrijving
 - BPKV: Kansen, Risico's en prestaties voor het gehele opdracht (baselines 1 t/m 3) en interview met sleutelfiguren
 - Vaste prijs voor baseline 1 en projectmanagement en projectbeheersing gehele opdracht (baseline 1 t/m 3)
 - Prijs voor baseline 2 en 3 op basis van geprognostiseerde omvang
- Onderbouwingsfase
 - Ca 8-10 weken
 - Aantonen dat de Inschrijving maakbaar is





Essentie financieel deel inschrijving

- Inschrijven voor vaste prijs processen (alle BL's) en producten BL1
- Inschrijven op aangegeven hoeveelheden voor producten BL 2 en 3
 - Geen omzetgarantie
 - Tarieven vast voor eerste twee jaar
 - Stelpost voor kosten derden
- Som moet lager zijn dan plafondbedrag





~~Tot slot: 12 oktober wordt 8 oktober, v.a. ca. 14.00 uur te Van der Valk, Zwolle~~

Vragen?

