



Presentatie Algemene inlichtingen
267.11 Kromme Nol en aansluiting Heesbeenseweg
Bouwteam en Realisatie
7 oktober 2025

Provincie Noord-Brabant

Agenda

1. Welkom en voorstellen
2. De uitvraagprocedure
3. Projectgebied
4. Samenwerking
5. Doel van het project
6. Bijzonderheden van de opdracht
7. Verduidelijking Rol Aannemer
8. Planning werkzaamheden
9. EMVI - BPKV
10. Vragen en afsluiting

Welkom en voorstellen team Provincie

- | | |
|-------------------------|---|
| - Anja Schievink | Projectmanager (PM) & Omgevingsmanager (OM) |
| - Jessica van de Looij | Project ondersteuner (PO) |
| - Niels van Rijswijk | Technisch manager (TM) |
| - Jan-Willem Knippels | Contractmanager (CM) |
| - Jasper van Herwaarden | Manager projectbeheersing (MPB) |
| - Pierre Latta | Inkoper |

Uitvraagprocedure

Fase	Activiteit	
Vooraankondiging	(Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl)	8-9-2025
Aankondiging	Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl)	2-10-2025
Inlichting en	Aanmelden Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder)	6-10-2025 voor 17:00 uur
	Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder)	7-10-2025 11:00 tot 12:00
	Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen 1e ronde nadere inlichtingen	22-10-2025 voor 10:00 uur
	Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	13-11-2025
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen 2e ronde nadere inlichtingen	20-11-2025 voor 10:00 uur
	Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	2-12-2025
Inschrijving en beoordeling	Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	17-12-2025 voor 10:00 uur
	Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen	17-12-2025 10:05 uur
	Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten	17/18-12-2025-01-2026
	Proces-verbaal van opening publiceren	19-12-2025
	Inhoudelijke beoordeling inschrijvingen	17-12-2025 tot 5-1-2026
	Consensus kwaliteitsdeel	5-1-2026
	Gesprekken	6/8-1-2026
	Consensus totaal	9-1-2026
Gunning	Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning)	19-1-2026
	Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). Minimaal 20 kalenderdagen	19-1-2026 tot 9-2-2026
	Definitieve Gunning	10-2-2026

Projectgebied



Samenwerking → Bouwteam


De opdracht omvat de deelname van de Opdrachtnemer in een bouwteam dat als doel heeft het uitvoeringsontwerp voor de eindsituatie op beide locaties op te stellen.

De Opdrachtnemer is beoogd uitvoerder van de realisatie van de eindsituatie op beide locaties: de turborotonde en optimalisaties Heesbeenseweg & dienen zomer 2027 te worden opgeleverd.

Doel van het project

Voor de filmpjes zie: Appendix 7 -> 08 Rapporten -> 08.08 Verkeersanalyse (Goudappel 2025)

[020881 - Ontwerp RHDHV 2040 AS N267 – Polstraat.mp4](#)

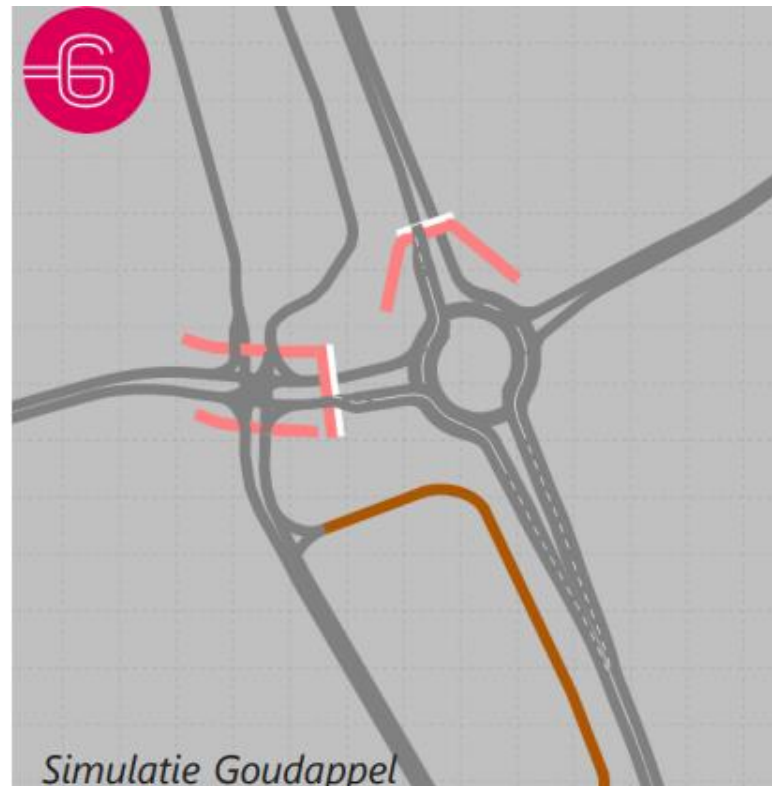

[020881 - 2040 AS N267 – Heesbeenseweg.mp4](#)



Doel van het project

- Veiligheid verhogen
- Doorstroming verbeteren

Bijzonderheden van de opdracht

- Bouwteam en Realisatie
- SO (Kromme Nol) en Plaatje (Heesbeenseweg) samen naar UO en Bestek werken
- Onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden en vergunningen aangevraagd worden
- Betrokken omgeving
- Raakvlak projecten op N-wegen en A-wegen
- Knip tussen bouwteamfase en realisatiefase
- Producten cf Appendix
- Samenwerkingsplan cf Appendix

Planning werkzaamheden

Fase	Activiteit	Datum/ tijdstip
Gunning Aannemer/Opdrachtnemer		10 februari 2026
Afstemmings- fase	Vaststellen werkwijze en maken project/ Prijsafspraken	Vanaf datum definitieve gunning tot 10 maart 2026 of eerder.
Ontwerp- fase	Ontwerp, afstemming, <u>werkvoorbereiding</u> , bestek/werkomschrijving opstellen	Vanaf moment overeenstemming werkwijze en projectafspraken. De streefdatum voor het tot stand komen van het eerste ontwerp (VO) is 12 april 2026. De streefdatum voor het afronden van deze fase is 24 juli 2026.
Onderhandelings- fase	Opstellen kostenraming(en) en vaststellen van eenheids- en richtprijzen	Vanaf het moment dat overeenstemming bestaat over de scope van beide locaties en na afronden ontwerpfase.
Go/No go		14 september 2026 of eerder.
Uitvoerings- fase	Uitvoeren werkzaamheden	Vanaf de datum van overeenstemming over een aanbieding en het ontvangen van de schriftelijke opdracht. Start uitvoering op de kortst mogelijke termijn. Alle uitvoeringswerkzaamheden dienen zomer 2027 gereed te zijn.
Opleveren dossier		Eerste concept opleverdossier dient uiterlijk 2 weken na openstellen weg aangeleverd te worden - Definitieve afronding omstreeks 15 Okt. 2027.

Verduidelijking Rol Aannemer

- De Aannemer – inclusief eventuele door hem ingeschakelde deelnemers – is gedurende de bouwteamfase integraal verantwoordelijk voor de interpretaties van de onderzoeken en het tot stand brengen van een uitvoerbaar, realiseerbaar en technisch deugdelijk ontwerp (het ontwerpproces). Eventuele fouten of onvolkomenheden in de interpretaties van de onderzoeken en het ontwerp, waaronder begrepen de (technische) maakbaarheid, zijn voor risico van de Aannemer, ook indien deze tijdens de bouwteamfase zijn ontstaan en, in consensus, door het bouwteam zijn besloten danwel vastgesteld.
- In het bestek zal voorgaande expliciet, als afwijking van de bepalingen van de UAV-2012 (versie 2025), worden opgenomen.

EMVI obv BPKV

$$EP = IP - Q_{tot}$$

Hierin is:

EP = Evaluatieprijs in Euro

IP = Inschrijvingsom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Q_{tot} = Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro


De Inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

BPKV-criteria

Nr	Kwaliteitscriterium	Maximale Kwaliteitswaarde (KW)	In %
1	Plan van aanpak		
1a	Prijsbeheersingscriterium	€ 1.181.250,-	35
1b	Aanpak op Duurzaamheid	€ 1.012.500,-	30
2	Gesprekken	€ 1.181.250,-	35
	Maximale totale fictieve aftrek	€ 3.375.000,-	100

Taakstellend budget

Investeringskosten	Beschikbaar budget
• Bouwkosten Ronde Kromme Nol (prijspeil 2027)	€ 2.185.000.-
• Bouwkosten Heesbeenseweg (prijspeil 2027)	€ 860.000.-
• Engineeringskosten beide locaties	€ 330.000,-
Totaal taakstellend budget	€ 3.375.000,-
Risico reservering	€ 100.000,-



BPKV – Plan van aan pak; prijsbeheersingscriterium

Kwaliteits-criterium	Sub criterium	Aandachtspunten	Maximale fictieve aftrek in €
1. Plan van aanpak (65%)	1a Prijsbeheersings-criterium (35%)	1. De wijze waarop Inschrijver bijdraagt, dat de aanneemsom aan het einde van de ontwerp/bouwteamfase binnen het taakstellend budget blijft; 2. De wijze waarop Inschrijver bijdraagt dat gedurende de realisatiefase de aanneemsom aan het einde van de realisatiefase binnen het taakstellend budget blijft; 3. De wijze waarop de Inschrijver gedurende de ontwerp en uitvoeringsfase zorgdraagt voor volledige transparantie met betrekking tot prijsvorming; 4. De wijze waarop de Inschrijver zorgdraagt voor marktconforme prijzen en de wijze waarop dat wordt aangetoond.	1.181.250,-

BPKV – Plan van aan pak; visie op duurzaamheid

	1b <u>Visie op duurzaamheid</u> (30%)	1. De visie hoe bijgedragen kan worden aan een duurzame oplossing, gelet op de thema's CO2-footprint/MKI, circulariteit, duurzame materialen en <u>klimaatadaptiviteit</u> en biodiversiteit; 2. Op welke wijze per fase duurzaamheidsexpertise en tools worden inzet, waarbij we Inschrijver verwijzen naar Handreiking Innovaties en Duurzaamheid in Infrastructurele Projecten - Uitvoeringskader IDI2.0 voor meer informatie over hoe de Provincie Noord-Brabant duurzaamheid vormgeeft binnen infrastructurele projecten; 3. De eventuele inzet van innovatieve instrumenten of technieken;	<u>1.012.500,-</u>
--	--	--	--------------------

BPKV - Gesprekken

2. <u>Gesprekken</u> (35%)	Met de 3 sleutelfunctionarissen: • <u>Projectleider / projectmanager</u> • <u>Ontwerpleider / werkvoorbereider</u> • <u>Uitvoerder</u>	1. De mate waarin het team en de personen het project en de inschrijving doorgronden; 2. De aanpak van de uitvraag en het project; 3. De mate waarin de beantwoording SMART is; 4. De mate waarin het team en de verschillende personen weten te overtuigen dat ze/hij/zij bijdraagt aan de doelstellingen van de OG; 5. De mate waarin het team en de verschillende personen bijdragen aan een succesvolle samenwerking in een bouwteam; 6. De mate van relevante ervaring; 7. De synergie, samenspel en integraliteit van het team.	1.181.250,-
---	--	---	-------------

Vragen?
