

Provincie Noord-Brabant

Algemene inlichtingen 615.10 Rotonde Deense Hoek Bouwteam en Realisatie

7 april 2026



Agenda

1. Welkom en voorstellen
2. De uitvraagprocedure
3. Projectgebied
4. Samenwerking
5. Doel van het project
6. Bijzonderheden van de opdracht
7. Verduidelijking Rol Aannemer
8. Planning werkzaamheden
9. EMVI - BPKV
10. Vragen en afsluiting


Welkom en voorstellen team Provincie

- Anja Schievink Projectmanager (PM)
- Sterre Kuppen Omgevingsmanager (OM)
- Jessica van de Looij Project ondersteuner (PO)
- Niels van Rijswijk Technisch manager (TM)
- Jan-Willem Knippels Contractmanager (CM)
- Jasper van Herwaarden Manager projectbeheersing (MPB)
- Remco de Jong / Pierre Latta Inkoper

Uitvraagprocedure

FASE	Activiteit		
Vooraankondiging	(Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl	27-2-2026	
Aankondiging	Publicatie op TenderNed www.tenderned.nl	31-3-2026	
Inlichtingen	Aanmelden Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder)	3-4-2026 voor 17:00 uur	
	Algemene Inlichtingen (toelichting Aanbesteder)	7-4-2026 12:00 tot 13:00	
	Uiterlijke termijn indiening schriftelijke vragen	20-4-2026 voor 10:00 uur	
	1e ronde nadere inlichtingen		
	Publicatie 1e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	1-5-2026	
	Uiterlijk termijn indiening schriftelijke vragen	11-5-2026 voor 10:00 uur	
	2e ronde nadere inlichtingen		
Inschrijving en beoordeling	Publicatie 2e nota van inlichtingen inschrijvingsfase	22-5-2026	
	Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	2-6-2026 voor 10:00 uur	
	Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen	2-6-2026 10:05 uur	
	Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten	2 t/m 4-6-2026	
	Proces-verbaal van opening publiceren	4-6-2026	
	Inhoudelijke beoordeling inschrijvingen	6-6-2026 tot 12-6-2026	
	Gesprekken	16 en 19-6-2026	
	Gunning	Gunningsbeslissing (Voornemen tot gunning)	3-7-2026
		Opschortende termijn (conform art. 2.37.2 ARW 2016 en art. 2.127 Aanbestedingswet 2012). Minimaal 20 kalenderdagen	t/m 23-7-2026
		Definitieve Gunning	24-7-2026

Projectgebied

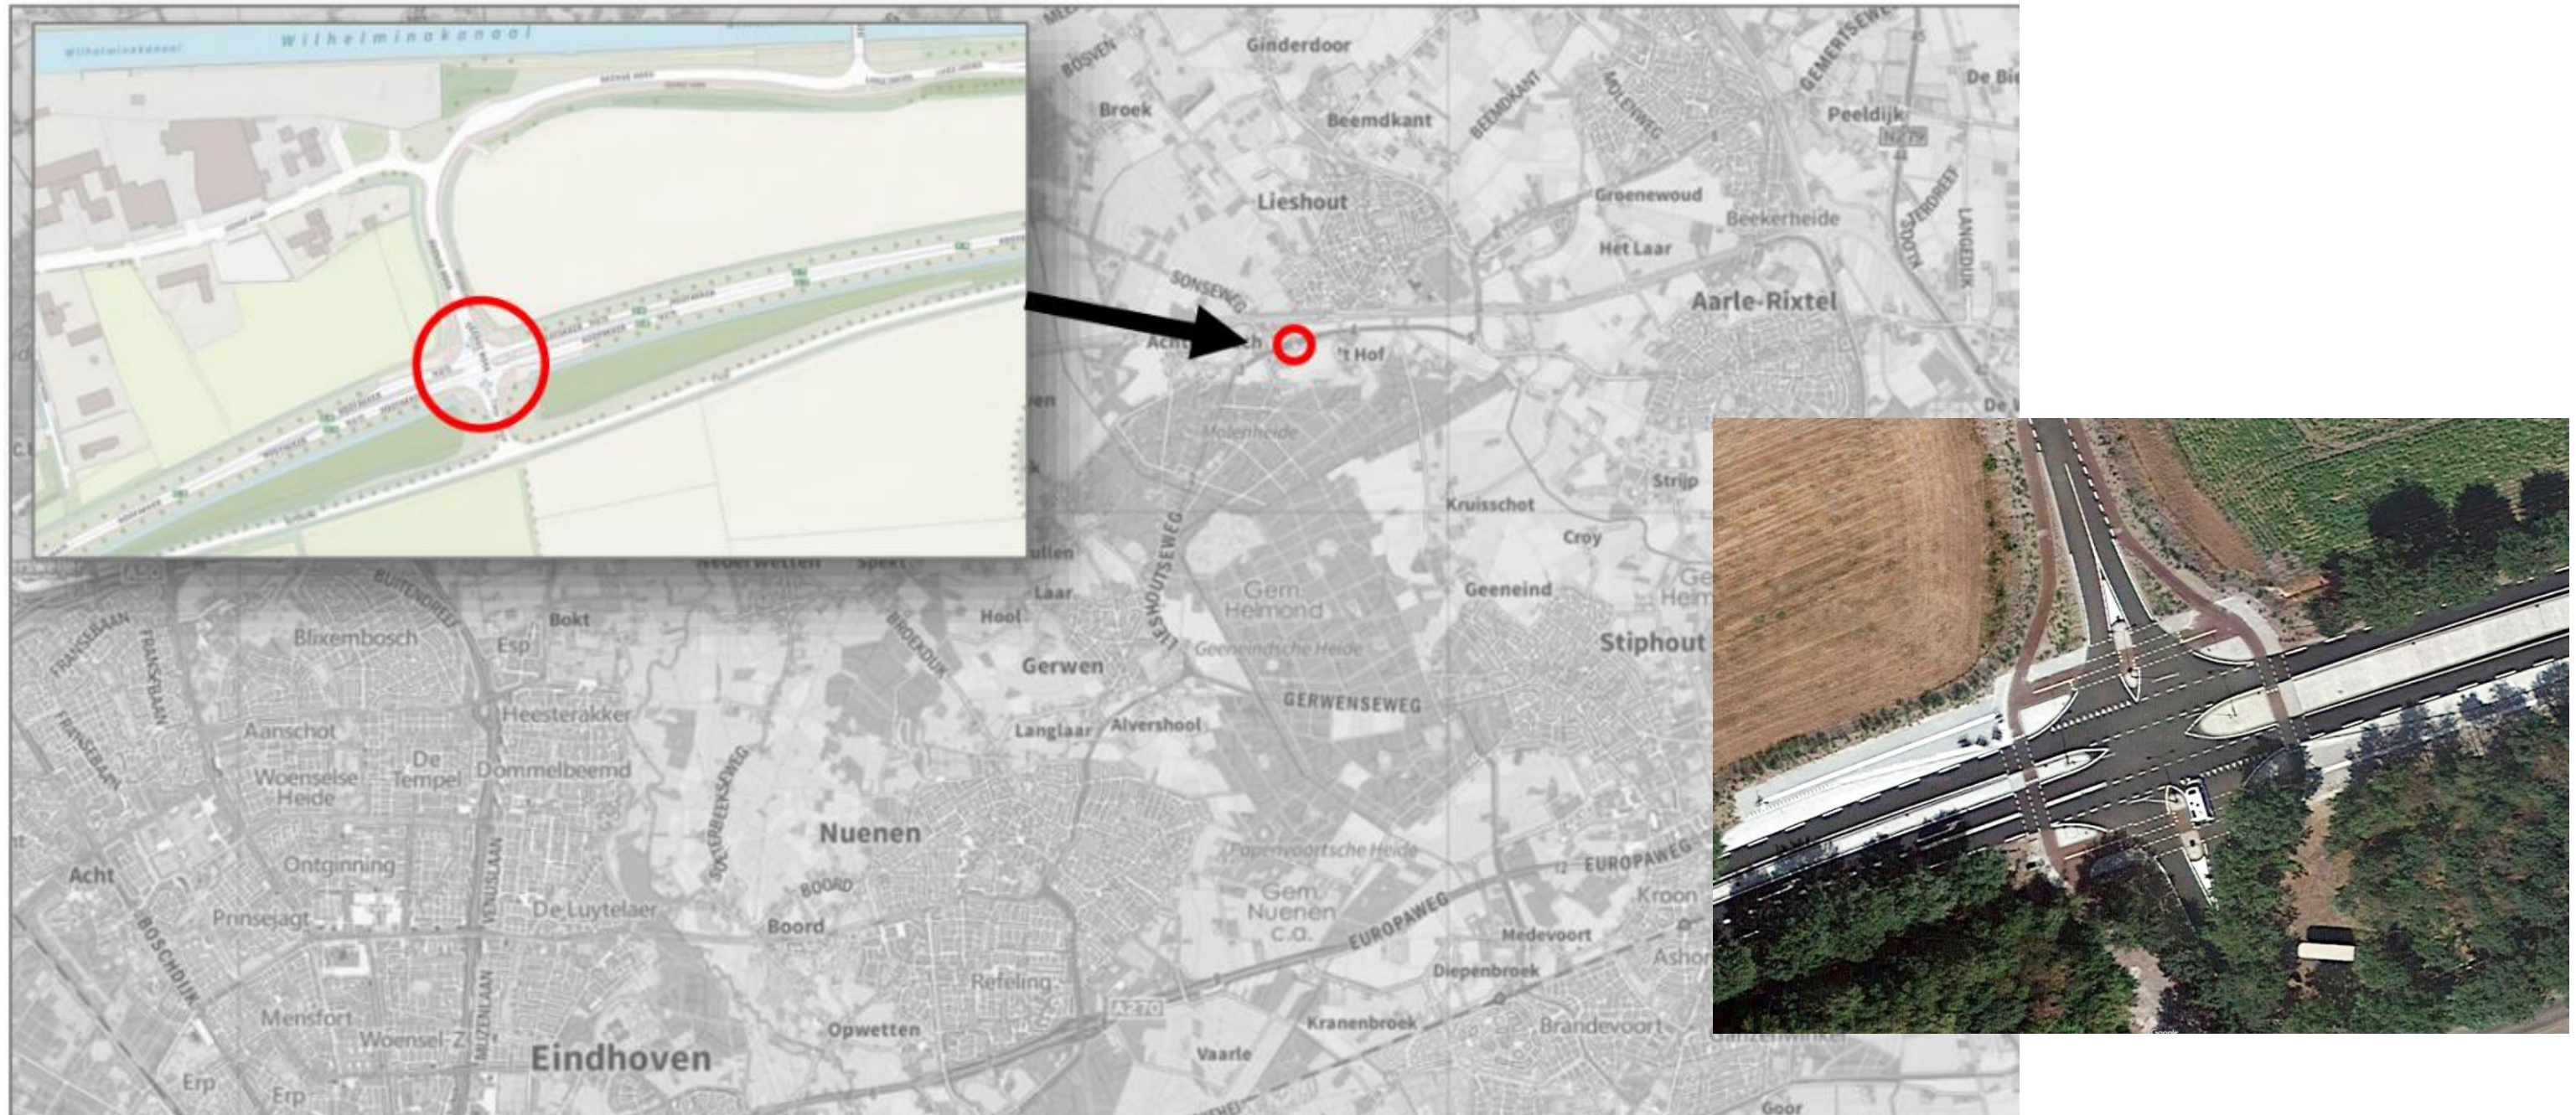

Samenwerking → Bouwteam

De opdracht omvat de deelname van de Opdrachtnemer in een bouwteam dat als doel heeft het uitvoeringsontwerp voor de eindsituatie op locatie op te stellen.

De Opdrachtnemer is beoogd uitvoerder van de realisatie van de eindsituatie op locatie: de rotonde N615 Deense Hoek dient gereed te zijn op 17-12-2027.

Doel van het project

- Veiligheid verhogen
- Doorstroming verbeteren

Bijzonderheden van de opdracht

- Bouwteam en Realisatie
- SO rotonde N615 Deense Hoek samen naar UO en Bestek werken
- Onderzoeken moeten nog uitgevoerd worden
- Vergunningen moeten nog aangevraagd worden
- Knip tussen bouwteamfase en realisatiefase
- Producten cf Appendix
- Samenwerkingsplan cf Appendix
- Ontwerpen met SFR aansluiting
- Transportleiding Gasunie
- Ruimtelijke procedure (BOPA)

Planning werkzaamheden

Fase	Activiteit	Datum/ tijdstip
Gunning Aannemer/Opdrachtnemer		24-7-2026
Afstemmings- fase	Vaststellen werkwijze en maken project/ Prijsafspraken	Vanaf datum definitieve gunning tot 30-9-2026 of eerder.
Ontwerp- fase	Ontwerp, afstemming, werkvoorbereiding, bestek/werkomschrijving opstellen	Vanaf moment overeenstemming werkwijze en projectafspraken. De streefdatum voor het tot stand komen van het eerste ontwerp (VO) is 26-2- 2027. De streefdatum voor het afronden van deze fase is 23-4- 2027.
Onderhandelings- fase	Opstellen kostenraming(en) en vaststellen van eenheids- en richtprijzen	Vanaf het moment dat overeenstemming bestaat over de scope na afronden ontwerpfase.
Go/No go		28-5-2027 of eerder.
Uitvoerings- fase	Uitvoeren werkzaamheden	Vanaf de datum van overeenstemming over een aanbieding en het ontvangen van de schriftelijke opdracht. Start uitvoering op de kortst mogelijke termijn. Alle uitvoeringswerkzaamheden dienen voor 17 december 2027 gereed te zijn.
Opleveren dossier		Eerste concept opleverdossier dient uiterlijk 2 weken na openstellen weg aangeleverd te worden - Definitieve afronding omstreeks 28- 1-2028

Verduidelijking Rol Aannemer

- De Aannemer – inclusief eventuele door hem ingeschakelde deelnemers – is gedurende de bouwteamfase integraal verantwoordelijk voor de interpretaties van de onderzoeken en het tot stand brengen van een uitvoerbaar, realiseerbaar en technisch deugdelijk ontwerp (het ontwerpproces). Eventuele fouten of onvolkomenheden in de interpretaties van de onderzoeken en het ontwerp, waaronder begrepen de (technische) maakbaarheid, zijn voor risico van de Aannemer, ook indien deze tijdens de bouwteamfase zijn ontstaan en, in consensus, door het bouwteam zijn besloten danwel vastgesteld.
- In het bestek zal voorgaande expliciet, als afwijking van de bepalingen van de UAV-2012 (versie 2025), worden opgenomen.

EMVI obv BPKV

$$EP = IP - Q_{tot}$$

Hierin is:

EP = Evaluatieprijs in Euro

IP = Inschrijvingsom in Euro (conform Inschrijvingsbiljet)

Q_{tot} = Totaal behaalde kwaliteitswaarde in Euro

De Inschrijving die op grond van dit berekeningsmodel de laagste evaluatieprijs (EP) heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

BPKV-criteria

Nr	Kwaliteitscriterium	Maximale Kwaliteitswaarde (KW)	In %
1	Plan van aanpak		
1a	Prijsbeheersingscriterium	€ 651.350,-	35
1b	Aanpak op Duurzaamheid	€ 558.300,-	30
2	Gesprekken	€ 651.350,-	35
	Maximale totale fictieve aftrek	€ 1.861.000,-	100

Investeringskosten beton	Beschikbaar budget
• Bouwkosten rotonde Deense Hoek (prijspeil 2027)	€ 1.655.000,-
• Engineeringskosten	€ 206.000,-
Totaal taakstellend budget	€ 1.861.000,-
Risico reservering	€ 100.000,-

Investeringskosten asfalt	Beschikbaar budget
• Bouwkosten rotonde Deense Hoek (prijspeil 2027)	€ 1.1950.000,-
• Engineeringskosten	€ 206.000,-
Totaal taakstellend budget	€ 1.401.000,-
Risico reservering	€ 100.000,-

BPKV – Plan van aan pak; prijsbeheersingscriterium

<p>1. Plan van aanpak (65%)</p>	<p>1a Prijsbeheersingscriterium (35%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De wijze waarop Inschrijver bijdraagt, dat de aanneemsom aan het einde van de ontwerp/bouwteamfase binnen het taakstellend budget blijft; 2. De wijze waarop Inschrijver bijdraagt dat gedurende de realisatiefase de aanneemsom aan het einde van de realisatiefase binnen het taakstellend budget blijft; 3. De wijze waarop de Inschrijver gedurende de ontwerp en uitvoeringsfase zorgdraagt voor volledige transparantie met betrekking tot prijsvorming; 4. De wijze waarop de Inschrijver zorgdraagt voor marktconforme prijzen en de wijze waarop dat wordt aangetoond. 	<p>651.350,-</p>
--	--	---	------------------

BPKV – Plan van aan pak; visie op duurzaamheid

<p>1b Visie op duurzaamheid (30%)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De visie hoe bijgedragen kan worden aan een duurzame oplossing, gelet op de thema's CO2-footprint/MKI, circulariteit, duurzame materialen en <u>klimaatadaptiviteit</u> en biodiversiteit; 2. Op welke wijze per fase duurzaamheidsexpertise en tools worden inzet, waarbij we Inschrijver verwijzen naar Handreiking Innovaties en Duurzaamheid in Infrastructurele Projecten - Uitvoeringskader IDI2.0 voor meer informatie over hoe de Provincie Noord-Brabant duurzaamheid vormgeeft binnen infrastructurele projecten; 3. De eventuele inzet van innovatieve instrumenten of technieken; 4. Het borgen van levensduur en kwaliteit 	<p><u>558.300,-</u></p>
--	---	-------------------------

BPKV - Gesprekken

<p>2. Gesprekken (35%)</p>	<p>Met de 3 sleutelfunctionarissen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projectleider / projectmanager • Ontwerpleider / werkvoorbereider • Uitvoerder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De mate waarin het team en de personen het project en de inschrijving doorgronden; 2. De aanpak van de uitvraag en het project; 3. De mate waarin de beantwoording SMART is; 4. De mate waarin het team en de verschillende personen weten te overtuigen dat ze/hij/zij bijdraagt aan de doelstellingen van de OG; 5. De mate waarin het team en de verschillende personen bijdragen aan een succesvolle samenwerking in een bouwteam; 6. De mate van relevante ervaring; 7. De synergie, samenspel en integraliteit van het team. 	<p>651.350,-</p>
-----------------------------------	--	---	------------------

Vragen ?

**Bedankt voor
jullie aandacht**
