



Marktconsultatie Mastenbroek-IJssel

Informatiedocument

Colofon

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Projectnaam: HWBP Mastenbroek-IJssel
Projectfase: Planuitwerkingsfase en Realisatiefase
Documentnaam: Marktconsultatie Mastenbroek-IJssel -
informatiedocument

Documenthistorie

Versie	Datum	Opsteller	Controle	Omschrijving
1.0	15-4-2026	IPM-team	IPM-team	Definitief

Inhoudsopgave

1. Aanleiding marktconsultatie	4
1.1. Waterschap Drents Overijsselse Delta en HWBP	4
1.2. Project Mastenbroek-IJssel	4
1.3. Doel en toelichting consultatiebijeenkomst	5
1.4. Planning marktconsultatie	5
1.5. Aanmelding TenderNed	5
1.6. Formele aspecten en voorwaarden	6
2. Samenwerking op hoofdlijnen	7

1. Aanleiding marktconsultatie


1.1. Waterschap Drents Overijsselse Delta en HWBP

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) staat voor beschermen tegen hoogwater, een goed functionerend regionaal watersysteem en het zuiveren van afvalwater. Voor de taak waterveiligheid is er een landelijk meerjarenprogramma voor dijkversterkingen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP is een alliantie van het Rijk en de waterschappen om de primaire keringen in Nederland veiliger te maken. Een van de dijkversterkingsprojecten in dit programma is het project Mastenbroek-IJssel.

1.2. Project Mastenbroek-IJssel

Het project Mastenbroek-IJssel betreft het versterken van de IJsseldijk tussen 's-Heerenbroek en IJsselmuiden (deel van het normtraject 10-3). Het te versterken traject ligt in de provincie Overijssel en binnen de gemeenten Kampen. De dijk ligt in de IJsseldelta en heeft naast een waterkerende functie ook een belangrijke rol voor recreatie en verkeer. Uit de verkenning blijkt dat 9,6 kilometer van de 14,6 km niet voldoet aan de waterveiligheidsnormen. De IJsseldijk is afgekeurd op de faalmechanismen hoogte, piping, stabiliteit binnendijks en sterkte van de grasbekleding.

De verkenning is begin 2024 gestart en op 7 april 2026 afgerond met de vaststelling van het Voorkeursalternatief (zie Figuur 1). Het projectgebied is opgedeeld in 10 deeltrajecten. Uit de verkenning blijkt dat er geen dijkversterking nodig is in deeltraject 1 Vreugderijkerwaard, daarom ontbreekt deeltraject 1 in Figuur 1. Dit deeltraject is daarom geen onderdeel van de scope van de planuitwerking. Het VKA vormt de basis voor de planuitwerkingsfase, waarin het dijkontwerp en uitvoeringsplan worden uitgewerkt en afgestemd met de omgeving. Op specifieke locaties worden maatwerkoplossingen toegepast om effecten op functies, zoals woningen en beschermde natuur, te beperken.

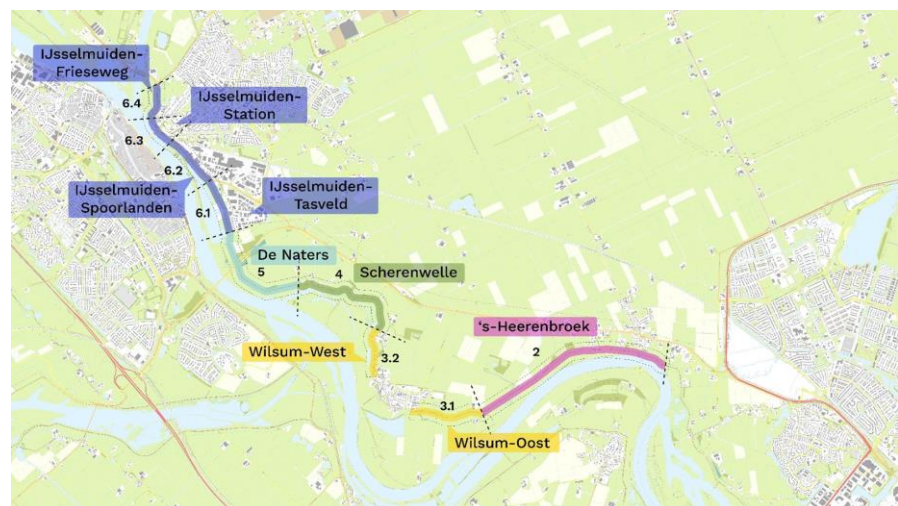

Figuur 1 Het Projectgebied Mastenbroek-IJssel

Meer informatie over het project Mastenbroek-IJssel en de resultaten van de verkenning, zoals het Verkenningenrapport, is te vinden via de volgende link: [Mastenbroek-IJssel \(HWBP\) | Waterschap Drents Overijsselse Delta](#).

1.3. Doel en toelichting consultatiebijeenkomst

Doelen van de consultatiebijeenkomst zijn om de markt te informeren over het project Mastenbroek-IJssel, over de verwachte planning van de aanbesteding en om het gesprek aan te gaan over enkele dilemma's binnen het project.

In aanloop naar de aanbesteding is nog een aantal punten uit te werken die mogelijk fundamenteel zijn in de samenwerking en daarmee voor het succesvol invulling geven van onze projectdoelen. Tijdens deze marktconsultatie willen wij enkele dilemma's aan de markt voorleggen. De informatie en ervaringen die daaruit naar voren komen willen we gebruiken om de aanbesteding en het contract in te richten. De dilemma's worden op 22 mei in het plenaire deel gepresenteerd, zodat u daarbij de context meekrijgt. De presentatie met daarin de dilemma's delen wij met u op 22 mei. Vervolgens krijgt u daarna de gelegenheid om schriftelijk op deze dilemma's te reageren binnen de in tabel 1 genoemde termijn. WDOdelta verzorgt de verslaglegging van deze consultatie en deelt deze uiterlijk op de in tabel 1 genoemde termijn. Met deze aanpak beogen wij in samenspraak met de markt te komen tot een gedragen en passende aanbesteding en contractvorming, zodat we gezamenlijk dit mooie project tot een succes kunnen maken!

Vanuit WDOdelta neemt in ieder geval het IPM-team deel aan de bijeenkomst.

1.4. Planning marktconsultatie

De marktconsultatie vindt plaats op vrijdag 22 mei 2026 van 09:00 tot 12:00 uur. De bijeenkomst wordt fysiek georganiseerd in de AB-zaal van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan de Dr. Van Deenweg 186 in Zwolle. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden zich tot en met 13 mei 2026 aanmelden voor de marktconsultatie. Na de bijeenkomst loopt de reactieperiode door tot en met 3 juni, waarin partijen hun schriftelijke reacties kunnen indienen. Uiterlijk op 12 juni deelt WDOdelta de verslaglegging van de marktconsultatie via TenderNed. Uiteraard zonder bedrijfsgevoelige informatie van individuele partijen. De planning is weergegeven in tabel 1.

Planning proces Marktconsultatie	
13 mei 2026	Aanmelden marktconsultatie
22 mei 2026	Marktconsultatie bijeenkomst <u>Agenda:</u> 1) 09:00 – 09:30 Inloop 2) 09:30 – 11:00 Plenaire sessie met presentatie van WDOdelta en bespreken dilemma's met de markt 3) 11:00 – 12:00 Informeel samenkomen en napraten
3 juni 2026	Sluiting reactieperiode markt
12 juni 2026	Verslaglegging marktconsultatie delen door WDOdelta

Tabel 1 Planning marktconsultatie

1.5. Aanmelding TenderNed

De aanmelding voor de marktconsultatie verloopt uitsluitend via TenderNed. Marktpartijen kunnen zich aanmelden door in TenderNed te reageren op deze aankondiging marktconsultatie Mastenbroek-IJssel, via de berichtenmodule.

Bij aanmelding vragen we de volgende gegevens aan te leveren:

- Het aantal personen dat namens uw organisaties aanwezig is (maximaal 4 per potentiële gegadigde);
- De namen en functies van de deelnemers.

De aanmelding voor de marktconsultatie dient voor 13 mei te zijn ingediend.

1.6. Formele aspecten en voorwaarden

Op deze marktconsultatie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- Enige reactie dan wel overlegde documenten worden geenszins gezien als een aanbod;
- Deze marktinformatie is op geen enkele wijze te zien als een officiële uitnodiging tot een tender dan wel als enige andere vorm van een aanbestedingsprocedure;
- Deelname aan deze marktinformatie geeft geen rechten op deelname aan een specifieke aanbesteding;
- Deelname aan deze marktinformatie schept over en weer geen rechten met c.q. jegens het waterschap en enige andere onderneming;
- De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om deelnemers aan de marktconsultatie in staat te stellen om een inhoudelijke reactie te kunnen geven. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend;
- Alle reacties op deze marktinformatie worden vertrouwelijk behandeld. Er zal een verslag gemaakt worden van de uitkomst van de marktinformatie, dat zal gepubliceerd worden op TenderNed. Het verslag wordt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat de vragen en antwoorden in het verslag niet terug te leiden zijn naar uw bedrijf. Als u van mening bent dat onderdelen van uw reactie commercieel vertrouwelijk zijn en in uw ogen niet gepubliceerd zouden moeten worden, dan verzoekt het waterschap u om dit gemotiveerd in de reactie aan te geven. Indien het waterschap inderdaad een commercieel belang aanwezig acht kan het waterschap beslissen de reactie of het betreffende onderdeel in de reactie niet op te nemen in het verslag;
- Reacties worden slechts gebruikt door het waterschap voor het doel zoals beschreven in dit document. Door het versturen van een reactie wordt automatisch toestemming verleend aan het waterschap om de reactie te gebruiken voor deze doeleinden;

2. Samenwerking op hoofdlijnen

Het team van project Mastenbroek-IJssel wordt onder andere gekenmerkt door veel inhoudelijke deskundigheid, gericht op samenwerking, enthousiast voor de opgave, gedreven en omgevingsgericht. Er is behoefte aan het toevoegen van uitvoeringexpertise. Een groot deel van het team uit de verkenningsfase gaat ook door in de planuitwerkingsfase. Er wordt samengewerkt met een combinatie van ingenieursbureaus.

Belangrijke drijfveren en ambities van het team die ook relevant zijn voor de marktbenadering, zijn:

- streven naar maatschappelijk verantwoorde kosten van het project;
- het bouwen aan een goede samenwerking met markt- en omgevingspartijen;
- het realiseren van een goed ingepaste en duurzame dijkversterking;
- de wens om iedere partij in zijn kracht te zetten;
- het waterschap moet zelf beslissingen kunnen maken op het gebied van waterveiligheid-, beheer- en omgevingsaspecten.

In de planuitwerkingsfase ligt een omvangrijke opgave op het gebied van ontwerp, onderzoeken, conditionering en vergunningen. Deze werkzaamheden zijn te groot en te specialistisch om als waterschap zelfstandig uit te voeren. Daarom wordt – volgens het principe “schoenmaker, blijf bij je leest” – ingezet op een duidelijke rolverdeling: het waterschap richt zich op regie, omgeving en waterveiligheid, het ingenieursbureau op onderzoeken, planproducten en ontwerp, en de aannemer op uitvoering, planning en (waar mogelijk) optimalisaties en innovaties.

