
Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat


Kritieke pad planning A27HH Noord/Zuid

Project:	A27 Houten – Hooipolder
Opsteller:	Bastijn Kocks
Vertrouwelijkheid:	Tbv marktconsultatie maart '20
Status:	Indicatief – geen officiële status



Deterministische planning Contract Zuid

Gunning t/m openstelling 2e nieuwe Merwedebrug

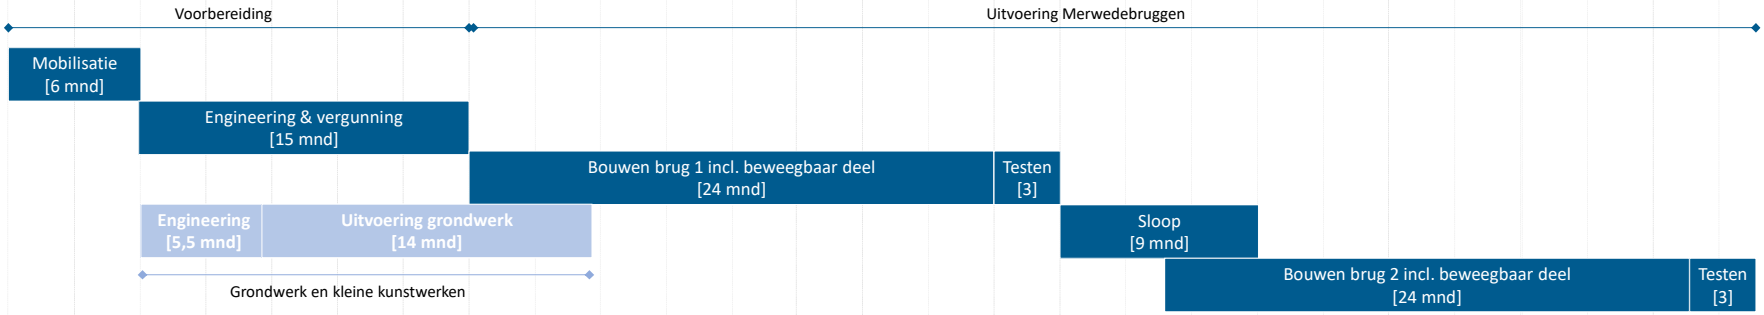


Planningsuitgangspunten Contract Zuid:

- Mobilisatieperiode van 6 maanden vanaf gunning
- Periode engineering en vergunning van de Merwedebrug van 15 maanden
- Parallel daaraan engineering en uitvoering van grondwerk (o.a. aanleg terpen), uitgangspunt is toepassen zettings-versnellende maatregelen
- Bouwtijd per brug van 24 maanden, incl. aanbruggen en beweegbaar deel
- Testen vindt voor beide bruggen deels parallel aan de bouw plaats en voor 3 maanden op het kritieke pad
- Na de helft van de totale 9 maanden slooptijd voor de bestaande brug, start de bouw van de tweede nieuwe Merwedebrug
- Stuwing- en stremmingseisen tijdens de bouw en sloop worden kritiek geacht voor de bouwfasering

Deterministische planning Contract Noord

Gunning t/m openstelling 2e nieuwe Hagesteinsebrug

Gunning Contract Noord valt later in tijd dan gunning Contract Zuid

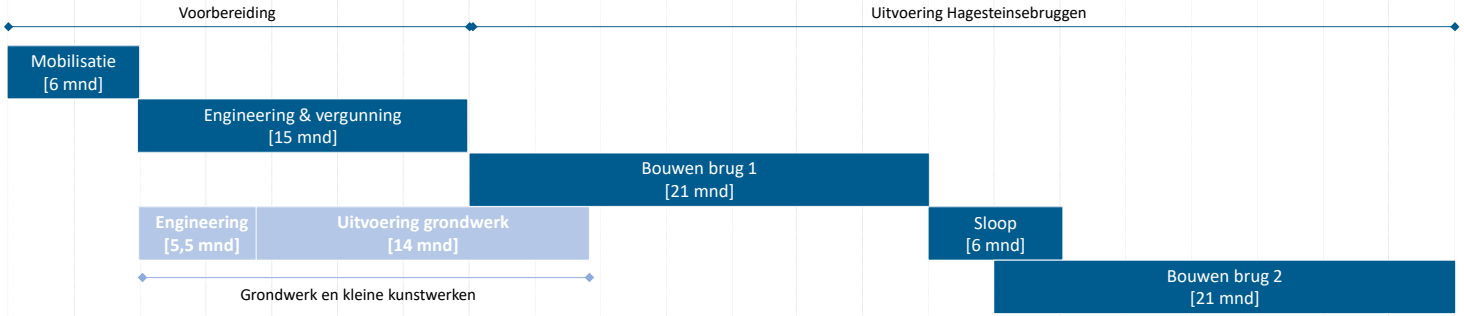

Planningsuitgangspunten Contract Noord:

- Gunning contract Noord valt later in tijd dan gunning Contract Zuid
- Mobilisatieperiode van 6 maanden vanaf gunning
- Periode engineering en vergunning van de Hagestesteinsebrug van 15 maanden
- Parallel daaraan engineering en uitvoering van grondwerk (o.a. aanleg terpen), uitgangspunt is toepassen zettings-versnellende maatregelen
- Bouwtijd per brug van 21 maanden, aanbruggen worden parallel aan de hoofdoverspanning gebouwd
- Na 3 maand van de 6 maanden slooptijd voor de bestaande brug, start de bouw van de tweede nieuwe Hagesteinsebrug
- Stuwing- en stremmingseisen tijdens de bouw en sloop worden kritiek geacht voor de bouwfasering
