PLANNING OLYMPIA COLLEGE INDICATIEF
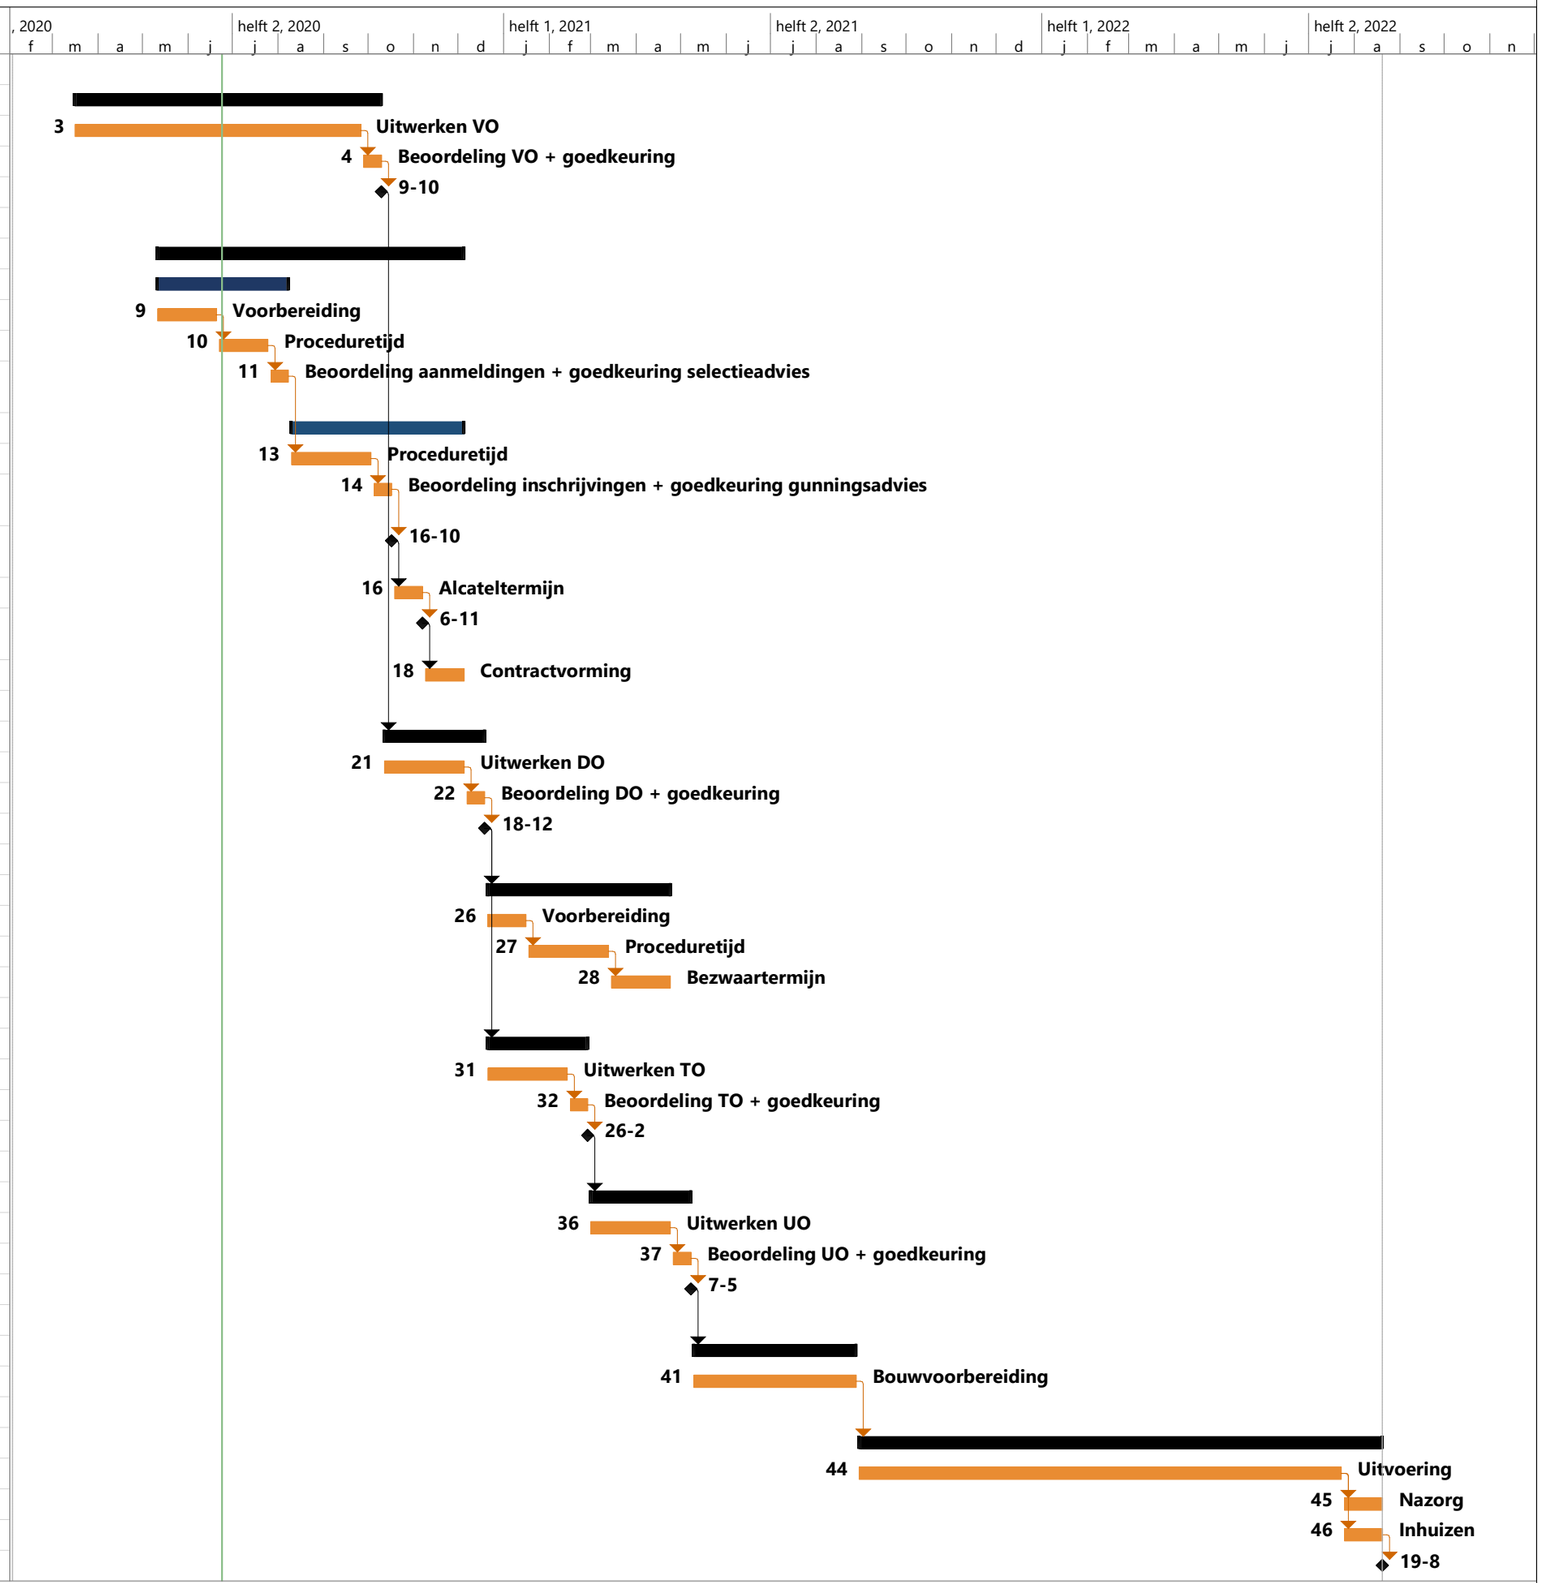
Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1					
2		**1 VO fase**	**30 wkn**	**maa 16-3-20**	**vri 9-10-20**
3		1.1 Uitwerken VO	28 wkn	maa 16-3-20	vri 25-9-20
4		1.2 Beoordeling VO + goedkeuring	2 wkn	maa 28-9-20	vri 9-10-20
5		1.3 GO/NO GO - Besluitvorming VO	0 wkn	vri 9-10-20	vri 9-10-20
6					
7		**2 Aanbesteding (Europese aanbesteding)**	**30 wkn**	**maa 11-5-20**	**vri 4-12-20**
8		**2.1 Selectiefase**	**13 wkn**	**maa 11-5-20**	**vri 7-8-20**
9		2.1.1 Voorbereiding	6 wkn	maa 11-5-20	vri 19-6-20
10		2.1.2 Proceduretijd	5 wkn	maa 22-6-20	vri 24-7-20
11		2.1.3 Beoordeling aanmeldingen + goedkeuring selectieadvies	2 wkn	maa 27-7-20	vri 7-8-20
12		**2.2 Gunningsfase**	**17 wkn**	**maa 10-8-20**	**vri 4-12-20**
13		2.2.1 Proceduretijd	8 wkn	maa 10-8-20	vri 2-10-20
14		2.2.2 Beoordeling inschrijvingen + goedkeuring gunningsadvies	2 wkn	maa 5-10-20	vri 16-10-20
15		2.2.3 Bekendmaking voorlopige gunning	0 wkn	vri 16-10-20	vri 16-10-20
16		2.2.4 Alcateltermijn	3 wkn	maa 19-10-20	vri 6-11-20
17		2.2.5 Bekendmaking definitieve gunning	0 wkn	vri 6-11-20	vri 6-11-20
18		2.2.6 Contractvorming	4 wkn	maa 9-11-20	vri 4-12-20
19					
20		**3 DO fase**	**10 wkn**	**maa 12-10-20**	**vri 18-12-20**
21		3.1 Uitwerken DO	8 wkn	maa 12-10-20	vri 4-12-20
22		3.2 Beoordeling DO + goedkeuring	2 wkn	maa 7-12-20	vri 18-12-20
23		3.3 GO/NO GO - Besluitvorming DO	0 wkn	vri 18-12-20	vri 18-12-20
24					
25		**4 Procedure aanvraag omgevingsvergunning**	**18 wkn**	**maa 21-12-20**	**vri 23-4-21**
26		4.1 Voorbereiding	4 wkn	maa 21-12-20	vri 15-1-21
27		4.2 Proceduretijd	8 wkn	maa 18-1-21	vri 12-3-21
28		4.3 Bezwaartermijn	6 wkn	maa 15-3-21	vri 23-4-21
29					
30		**5 TO fase**	**10 wkn**	**maa 21-12-20**	**vri 26-2-21**
31		5.1 Uitwerken TO	8 wkn	maa 21-12-20	vri 12-2-21
32		5.2 Beoordeling TO + goedkeuring	2 wkn	maa 15-2-21	vri 26-2-21
33		5.3 GO/NO GO - Besluitvorming TO	0 wkn	vri 26-2-21	vri 26-2-21
34					
35		**6 UO fase**	**10 wkn**	**maa 1-3-21**	**vri 7-5-21**
36		6.1 Uitwerken UO	8 wkn	maa 1-3-21	vri 23-4-21
37		6.2 Beoordeling UO + goedkeuring	2 wkn	maa 26-4-21	vri 7-5-21
38		6.3 GO/NO GO - Besluitvorming UO	0 wkn	vri 7-5-21	vri 7-5-21
39					
40		**7 Bouwvoorbereiding**	**16 wkn**	**maa 10-5-21**	**vri 27-8-21**
41		7.1 Bouwvoorbereiding	16 wkn	maa 10-5-21	vri 27-8-21
42					
43		**8 Realisatie**	**51 wkn**	**maa 30-8-21**	**vri 19-8-22**
44		8.1 Uitvoering	47 wkn	maa 30-8-21	vri 22-7-22
45		8.2 Nazorg	4 wkn	maa 25-7-22	vri 19-8-22
46		8.3 Inhuizen	4 wkn	maa 25-7-22	vri 19-8-22
47		8.4 Ingebruikname	0 wkn	vri 19-8-22	vri 19-8-22
