Project: Revitalisatie Pius X te Almelo - Planfase 1
Nummer: 2P1705001
Datum: 18-12-2020
Gewijzigd:

concept OVERALL-PLANNING

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum
1	**BOUWPROCES**	**maa 12-7-21**	**don 29-9-22**
2	**P09 - Uitvoering - Directievoering**	**maa 16-8-21**	**din 27-9-22**
3	P09-10 - Realiseren	maa 16-8-21	maa 26-9-22
4	P09-10 - Realiseren - sloop en gevelwerkzaamheden	maa 20-9-21	don 25-8-22
5	P09-20 - Directie Voeren & Toezicht Houden	maa 16-8-21	din 27-9-22
6	**Bouwfasering**	**maa 12-7-21**	**vri 26-8-22**
7	**Fase 1 - Oostgevel**	**maa 12-7-21**	**vri 17-12-21**
8	Gevelwerkzaamheden	maa 16-8-21	woe 1-12-21
9	**Derde verdieping**	**maa 12-7-21**	**din 19-10-21**
10	Uithuizen	maa 12-7-21	vri 16-7-21
11	Sloop / verwijderen	maa 16-8-21	vri 27-8-21
12	Opbouw	maa 30-8-21	vri 17-9-21
13	Afbouw / afwerking	maa 20-9-21	din 12-10-21
14	In gebruikname lokalen	woe 13-10-21	din 19-10-21
15	Lokalen buiten gebruik	maa 12-7-21	din 19-10-21
16	**Tweede verdieping**	**maa 16-8-21**	**woe 24-11-21**
17	Uithuizen	maa 23-8-21	vri 27-8-21
18	Sloop / verwijderen	maa 30-8-21	vri 10-9-21
19	Opbouw	maa 13-9-21	vri 1-10-21
20	Afbouw / afwerking	maa 4-10-21	din 19-10-21
21	In gebruikname lokalen	don 18-11-21	woe 24-11-21
22	Lokalen buiten gebruik	maa 16-8-21	woe 24-11-21
23	**Eerste verdieping**	**maa 30-8-21**	**vri 10-12-21**
24	Uithuizen	vri 3-9-21	don 9-9-21
25	Sloop / verwijderen	maa 13-9-21	vri 1-10-21
26	Opbouw	maa 4-10-21	maa 8-11-21
27	Afbouw / afwerking	din 9-11-21	woe 24-11-21
28	Laboratorium inrichting	maa 29-11-21	vri 10-12-21
29	In gebruikname lokalen	maa 6-12-21	vri 10-12-21
30	lokalen buiten gebruik	maa 30-8-21	vri 10-12-21
31	**Begane grond**	**maa 13-9-21**	**vri 17-12-21**
32	Uithuizen	vri 24-9-21	don 30-9-21
33	Sloop / verwijderen	maa 4-10-21	vri 22-10-21
34	Opbouw	maa 25-10-21	woe 24-11-21
35	Afbouw / afwerking	don 25-11-21	vri 10-12-21
36	In gebruikname lokalen	maa 13-12-21	vri 17-12-21
37	lokalen buiten gebruik	maa 13-9-21	vri 17-12-21
38	**Fase 2a - Middengebied**	**don 23-9-21**	**vri 22-7-22**
39	Gevelwerkzaamheden	don 23-9-21	vri 22-7-22
40	Voorbereiden sloop	don 23-9-21	vri 8-10-21
41	Sloop / verwijderen	maa 11-10-21	vri 22-10-21
42	Opbouw	maa 25-10-21	maa 31-1-22
43	Afbouw / afwerking	din 1-2-22	don 28-4-22
44	Pauzegebied op gedeelte fase 2a	don 23-9-21	don 28-4-22
45	**Fase 2b - Middengebied (pauzegebied)**	**vri 29-4-22**	**maa 18-7-22**
46	Sloop / verwijderen	vri 29-4-22	don 19-5-22
47	Opbouw	vri 20-5-22	vri 17-6-22
48	Afbouw / afwerking	maa 20-6-22	maa 18-7-22
49	Pauzegebied in gedeelte fase 2b en buiten	vri 29-4-22	maa 18-7-22
50	**Fase 3 - Zuidgevel**	**vri 3-12-21**	**din 19-4-22**
51	Gevelwerkzaamheden	maa 13-12-21	vri 25-3-22
52	**Derde verdieping**	**vri 3-12-21**	**woe 2-3-22**
53	Uithuizen	vri 3-12-21	don 9-12-21
54	Sloop / verwijderen	maa 13-12-21	woe 12-1-22
55	Opbouw / gevelwerkzaamheden	don 13-1-22	woe 2-2-22
56	Afbouw / afwerking	don 3-2-22	woe 23-2-22
57	In gebruikname lokalen / kantoren	don 24-2-22	woe 2-3-22
58	Lokalen buiten gebied	vri 3-12-21	woe 2-3-22
59	**Tweede verdieping**	**maa 13-12-21**	**vri 25-3-22**
60	Uithuizen	din 21-12-21	din 11-1-22
61	Sloop / verwijderen	don 13-1-22	vri 28-1-22
62	Opbouw / gevelwerkzaamheden	maa 31-1-22	vri 25-3-22
63	Afbouw / afwerking	don 24-2-22	woe 2-3-22
64	In gebruikname lokalen / kantoren	maa 21-3-22	vri 25-3-22
65	Lokalen buiten gebruik	maa 13-12-21	vri 25-3-22
66	**Eerste verdieping**	**don 13-1-22**	**vri 8-4-22**
67	Uithuizen	vri 21-1-22	don 27-1-22
68	Sloop / verwijderen	maa 31-1-22	din 15-2-22
69	Opbouw / gevelwerkzaamheden	woe 16-2-22	vri 11-3-22
70	Afbouw / afwerking	maa 14-3-22	vri 25-3-22
71	In gebruikname lokalen / kantoren	maa 4-4-22	vri 8-4-22
72	Lokalen buiten gebruik	don 13-1-22	vri 8-4-22
73	**Begane grond**	**maa 31-1-22**	**din 19-4-22**
74	Uithuizen	din 8-2-22	maa 14-2-22
75	Sloop / verwijderen	woe 16-2-22	din 22-2-22
76	Opbouw / gevelwerkzaamheden	woe 23-2-22	don 24-3-22
77	Afbouw / afwerking	maa 28-3-22	vri 8-4-22
78	In gebruikname lokalen / kantoren	maa 11-4-22	din 19-4-22
79	Lokalen buiten gebruik	maa 31-1-22	din 19-4-22
80	**Fase 4 - Noordgevel**	**vri 1-4-22**	**don 11-8-22**
81	Gevelwerkzaamheden	maa 11-4-22	woe 3-8-22
82	**Derde verdieping**	**vri 1-4-22**	**don 23-6-22**
83	Uithuizen	vri 1-4-22	don 7-4-22
84	Sloop / verwijderen	maa 11-4-22	din 26-4-22
85	Opbouw / gevelwerkzaamheden	don 28-4-22	woe 18-5-22
86	Afbouw / afwerking	don 19-5-22	don 9-6-22
87	In gebruikname lokalen / kantoren	vri 17-6-22	don 23-6-22
88	Lokalen/kantoren buiten gebruik	vri 1-4-22	don 23-6-22
89	**Tweede verdieping**	**maa 11-4-22**	**don 14-7-22**
90	Uithuizen	din 19-4-22	maa 25-4-22
91	Sloop / verwijderen	don 28-4-22	woe 11-5-22
92	Opbouw / gevelwerkzaamheden	don 12-5-22	vri 10-6-22
93	Afbouw / afwerking	vri 10-6-22	don 23-6-22
94	In gebruikname lokalen / kantoren	vri 8-7-22	don 14-7-22
95	Lokalen/kantoren buiten gebruik	maa 11-4-22	don 14-7-22
96	**Eerste verdieping**	**don 28-4-22**	**don 4-8-22**
97	Uithuizen	woe 4-5-22	din 10-5-22
98	Sloop / verwijderen	don 12-5-22	woe 25-5-22
99	Opbouw / gevelwerkzaamheden	vri 27-5-22	don 23-6-22
100	Afbouw / afwerking	vri 24-6-22	don 14-7-22
101	In gebruikname lokalen / kantoren	vri 29-7-22	don 4-8-22
102	Lokalen/kantoren buiten gebruik	don 28-4-22	don 4-8-22
103	**Begane grond**	**don 12-5-22**	**don 11-8-22**
104	Uithuizen	woe 18-5-22	din 24-5-22
105	Sloop / verwijderen	vri 27-5-22	don 9-6-22
106	Opbouw / gevelwerkzaamheden	vri 10-6-22	woe 13-7-22
107	Afbouw / afwerking	vri 15-7-22	don 4-8-22
108	In gebruikname lokalen / kantoren	vri 5-8-22	don 11-8-22
109	Lokalen/kantoren buiten gebruik	don 12-5-22	don 11-8-22
110	**Fase X - Corridor**	**vri 8-7-22**	**vri 26-8-22**
111	Uithuizen	vri 8-7-22	don 14-7-22
112	Sloop / verwijderen	maa 18-7-22	vri 29-7-22
113	Opbouw / gevelwerkzaamheden	maa 1-8-22	vri 12-8-22
114	Afbouw / afwerking	maa 15-8-22	vri 26-8-22
115	P09-30 - Opnemen	woe 21-9-22	woe 21-9-22
116	P09-40 - Opleveren	woe 28-9-22	woe 28-9-22
117	P09-50 - Opstellen Fasedocument	don 22-9-22	woe 28-9-22
118	P09-60 - Informeren CvB van SCC	don 29-9-22	don 29-9-22
119	P09-70 - Evalueren	don 29-9-22	don 29-9-22
120	**F10 - Gebruik / Exploitatie**	**woe 28-9-22**	**woe 28-9-22**
121	P10-10 - Opnemen Einde Onderhoudstermijn(en)	woe 28-9-22	woe 28-9-22
122	P10-20 - Exploitatie	woe 28-9-22	woe 28-9-22
123	**BOUWPROCES - TERREIN**	**don 29-9-22**	**don 29-9-22**
124	F10 - Gebruik / Exploitatie	don 29-9-22	don 29-9-22
125			
126	**schoolvakanties regio Noord 2021**	**maa 22-2-21**	**vri 26-8-22**
127	voorjaarsvakantie	maa 22-2-21	vri 26-3-21
128	meivakantie	maa 3-5-21	vri 7-5-21
129	zomervakantie	maa 12-7-21	vri 20-8-21
130	herfstvakantie	maa 18-10-21	vri 22-10-21
131	kerstvakantie 2021-2022	don 23-12-21	maa 10-1-22
132	zomervakantie 2022	maa 18-7-22	vri 26-8-22
133			
134	**bouwvakvakantie 2020**	maa 20-7-20	vri 7-8-20
135	**bouwvakvakantie 2021**	maa 26-7-21	vri 13-8-21
136	**bouwvakvakantie 2022**	maa 1-8-22	vri 19-8-22

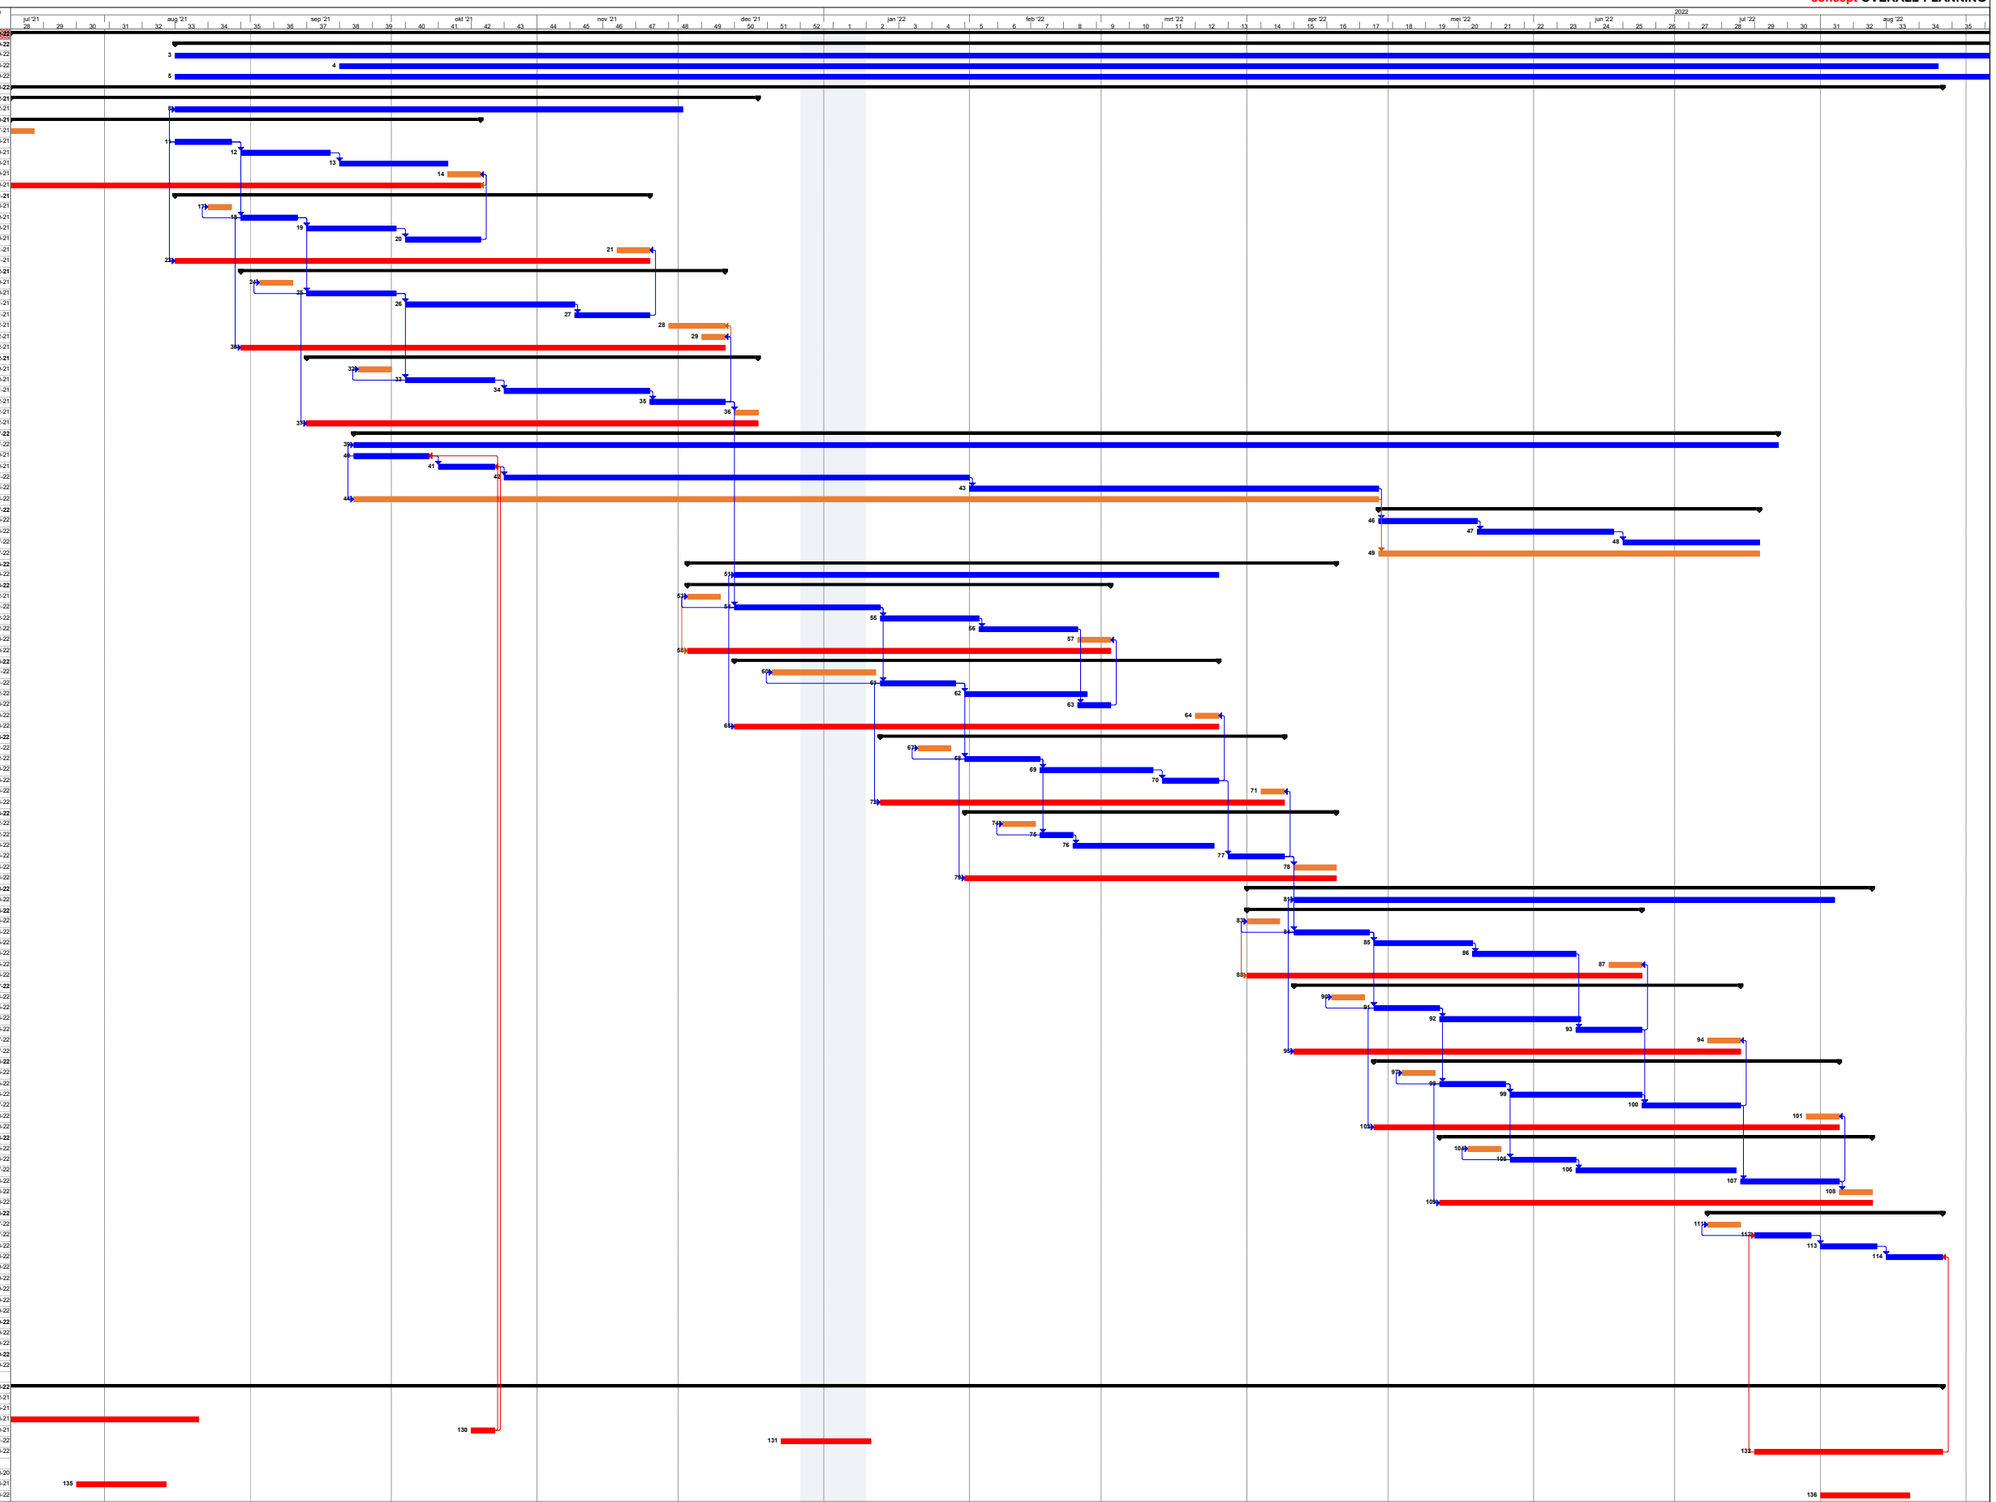

Taak | Mijlpaal | Projectsamenvatting | Externe mijlpaal | Inactieve samenvatting | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Alleen einddatum | Externe mijlpaal | Deadline
Splitsing | Samenvatting | Externe taken | Inactieve mijlpaal | Handmatig taak | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Externe taken | Voortgang
