Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1						
2		**EFRO Circulair water**	**682 dagen**	**don 20-8-20**	**vri 31-3-23**	
3		Werkpakket 1	357 dagen	don 20-8-20	vri 31-12-21	
4		Werkpakket 2	456 dagen	vri 1-1-21	vri 30-9-22	
5		Werkpakket 3	327 dagen	vri 1-10-21	zon 1-1-23	
6		Werkpakket 4	393 dagen	don 1-7-21	zat 31-12-22	
7		Werkpakket 5	391 dagen	vri 1-10-21	vri 31-3-23	
8		Werkpakket 6	682 dagen	don 20-8-20	vri 31-3-23	
9						
10		**Klanten LAB**	**653 dagen**	**don 1-4-21**	**din 3-10-23**	
11		Bouw Somerset	196 dagen	don 1-4-21	don 30-12-21	
12		Ingebruikname Somers	0 dagen	vri 31-12-21	vri 31-12-21	25;11
13		Bouw Fase 1 Klant X	197 dagen	zat 1-1-22	zat 1-10-22	
14		Ingebruikname Fase 1 X	0 dagen	maa 3-10-22	maa 3-10-22	13
15		Bouw fase 2 Klant X	197 dagen	zon 1-1-23	maa 2-10-23	
16		Ingebruikname Fase 2 X	0 dagen	din 3-10-23	din 3-10-23	15
17						
18		Realisatie				
19		**Werkzaamheden LAB**	**438 dagen**	**din 1-12-20**	**don 4-8-22**	
20		Voorbereiding	64 dagen	din 1-12-20	vri 26-2-21	
21		Marktconsultatie	4 wkn	maa 1-3-21	vri 26-3-21	20
22		PvE	44 dagen	maa 29-3-21	don 27-5-21	21
23		Challenge/aanbestedin	3 mndn	vri 28-5-21	don 19-8-21	22
24		standstill	10 dagen	vri 20-8-21	don 2-9-21	23
25		Uitvoering I	3 mndn	vri 3-9-21	don 25-11-21	24
26		Uitvoering II	3 mndn	vri 26-11-21	don 17-2-22	25
27		Uitvoering III	6 mndn	vri 18-2-22	don 4-8-22	26

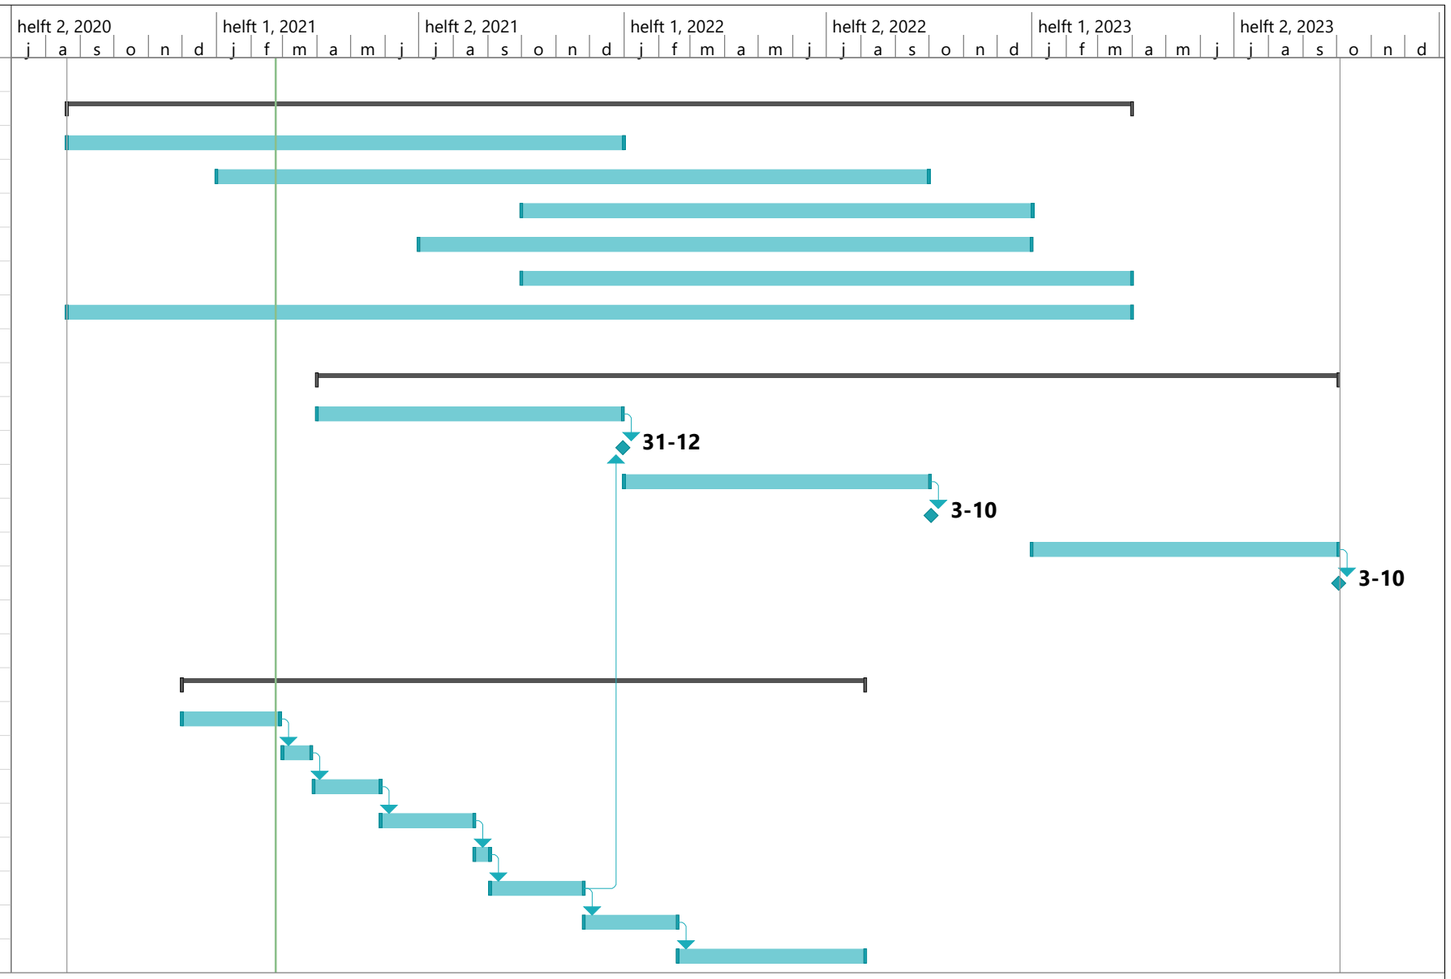

Project: Planning Circulair wate
Datum: din 23-2-21

Taak	Projectsamenvatting	Handmatig taak	Alleen begindatum	Deadline
Splitsing	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum	Voortgang
Mijlpaal	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang, handmatig
Samenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Externe mijlpaal	
