
ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
0		**Planning Provinciehuis Flevoland - Duurzaam Gastvrij**	**211 days**	**Fri 9-11-18**	**Fri 4-10-19**	
1						
2		**1 Aanbesteding Bouwkundig (o.a. sloop / plafonds / wanden / vloeren en schilderwerk)**	**41 days**	**Fri 9-11-18**	**Fri 18-1-19**	
3		1.1 Offerte uitvraag	5 days	Fri 9-11-18	Thu 15-11-18	
4		1.2 Werkbezichtiging	1 day	Fri 16-11-18	Fri 16-11-18	3
5		1.3 Nota van Inlichtingen 1	1 day	Wed 28-11-1	Wed 28-11-18	
6		1.4 Nota van Inlichtingen 2	1 day	Fri 7-12-18	Fri 7-12-18	
7		1.5 Sluiting inschrijvingstermijn	1 day	Mon 17-12-1	Mon 17-12-18	
8		1.6 Beoordeling offertes	5 days	Tue 18-12-18	Mon 7-1-19	7
9		1.7 Pitch en interview	1 day	Mon 7-1-19	Mon 7-1-19	
10		1.8 Bekendmaking gunning	1 day	Fri 11-1-19	Fri 11-1-19	
11		1.9 Definitieve gunning	1 day	Fri 18-1-19	Fri 18-1-19	
12						
13		**2 Realisatie**	**170 days**	**Mon 21-1-19**	**Fri 4-10-19**	
14		2.1 Kick Off met opdrachtnemer	9 days	Mon 21-1-19	Thu 31-1-19	11
15		2.2 Werkvoorbereiding opdrachtnemer	20 days	Fri 1-2-19	Thu 28-2-19	14
16		2.3 Levertijd wanden	30 days	Fri 1-2-19	Thu 14-3-19	14
17		2.4 Aanpassen stukken (indien nodig)	5 days	Fri 1-3-19	Thu 7-3-19	15
18		2.5 2e verd. - Demontage wanden	5 days	Fri 1-2-19	Thu 7-2-19	14
19		2.6 2e verd. - Installatie aanpassingen	30 days	Fri 8-2-19	Thu 21-3-19	18
20		2.7 2e verd. - Vloer afwerking	5 days	Fri 22-2-19	Thu 28-2-19	18FS+10 days
21		2.8 2e verd. - Wanden plaatsen	10 days	Fri 15-3-19	Thu 28-3-19	16
22		2.9 2e verd. - Meubeltimmerwerk	5 days	Fri 29-3-19	Thu 4-4-19	21
23		**2.10 Deeloplevering 2e etage**	1 day	Fri 5-4-19	Fri 5-4-19	22
24		2.11 2e verd. - Nazorg /Restpunten aannemer	5 days	Fri 5-4-19	Thu 11-4-19	22
25		2.12 2e verd. - Werkplekmeubilair / Signing / AV	5 days	Fri 5-4-19	Thu 11-4-19	22
26		**2.13 Ingebruikname 2e verdieping**	**1 day**	**Fri 12-4-19**	**Fri 12-4-19**	**25**
27		2.14 4e verd. - Demontage wanden	5 days	Fri 12-4-19	Thu 18-4-19	25
28		2.15 4e verd. - Installatie aanpassingen	25 days	Fri 19-4-19	Thu 23-5-19	27
29		2.16 4e verd. - Vloer afwerking	5 days	Fri 3-5-19	Thu 9-5-19	27FS+10 days
30		2.17 4e verd. - Wanden plaatsen	5 days	Fri 10-5-19	Thu 16-5-19	29
31		2.18 4e verd. - Meubeltimmerwerk	5 days	Fri 17-5-19	Thu 23-5-19	30
32		2.19 BG - Vloerafwerking	10 days	Mon 15-4-19	Fri 26-4-19	26
33		2.20 BG - Wanden	5 days	Mon 29-4-19	Fri 3-5-19	32
34		**2.21 Deeloplevering 4e etage en BG**	1 day	Fri 24-5-19	Fri 24-5-19	31
35		2.22 BG - AV aanpassingen	15 days	Fri 24-5-19	Thu 13-6-19	31
36		2.23 4e verd. / BG - Nazorg / Restpunten aannemer	5 days	Fri 24-5-19	Thu 30-5-19	31
37		2.24 4e verd. / BG - Werkplekmeubilair / Signing / AV	5 days	Fri 24-5-19	Thu 30-5-19	31
38		**2.25 Ingebruikname 4e verdieping**	1 day	Fri 31-5-19	Fri 31-5-19	37
39		2.26 3e verd. - Demontage wanden	5 days	Fri 31-5-19	Thu 6-6-19	37
40		2.27 3e verd. - Installatie aanpassingen	30 days	Fri 7-6-19	Thu 18-7-19	39
41		2.28 3e verd. - Vloer afwerking	5 days	Fri 21-6-19	Thu 27-6-19	39FS+10 days
42		2.29 3e verd. - Wanden plaatsen	10 days	Fri 28-6-19	Thu 11-7-19	41
43		2.30 3e verd. - Meubeltimmerwerk	5 days	Fri 12-7-19	Thu 18-7-19	42
44		**2.31 Deeloplevering 3e etage**	1 day	Fri 19-7-19	Fri 19-7-19	43
45		2.32 3e verd. - Nazorg / Restpunten aannemer	5 days	Fri 12-7-19	Thu 18-7-19	42
46		2.33 3e verd. - Werkplekmeubilair / Signing / AV	5 days	Fri 12-7-19	Thu 18-7-19	42
47		**2.34 Ingebruikname 3e verdieping**	1 day	Fri 19-7-19	Fri 19-7-19	46
48		2.35 1e verd. - Demontage wanden	5 days	Fri 19-7-19	Thu 25-7-19	46
49		2.36 1e verd. - Installatie aanpassingen	30 days	Fri 26-7-19	Thu 26-9-19	48
50		2.37 1e verd. - Vloer afwerking	5 days	Fri 30-8-19	Thu 5-9-19	48FS+10 days
51		2.38 1e verd. - Wanden plaatsen	10 days	Fri 6-9-19	Thu 19-9-19	50
52		2.39 1e verd. - Meubeltimmerwerk	5 days	Fri 20-9-19	Thu 26-9-19	51
53		**2.40 Eindoplevering project**	1 day	Fri 27-9-19	Fri 27-9-19	52
54		2.41 1e verd. - Nazorg / Restpunten	5 days	Fri 27-9-19	Thu 3-10-19	52
55		2.42 1e verd. - Werkplekmeubilair / Signing / AV	5 days	Fri 27-9-19	Thu 3-10-19	52
56		**2.43 Ingebruikname 1e verdieping**	1 day	Fri 4-10-19	Fri 4-10-19	55

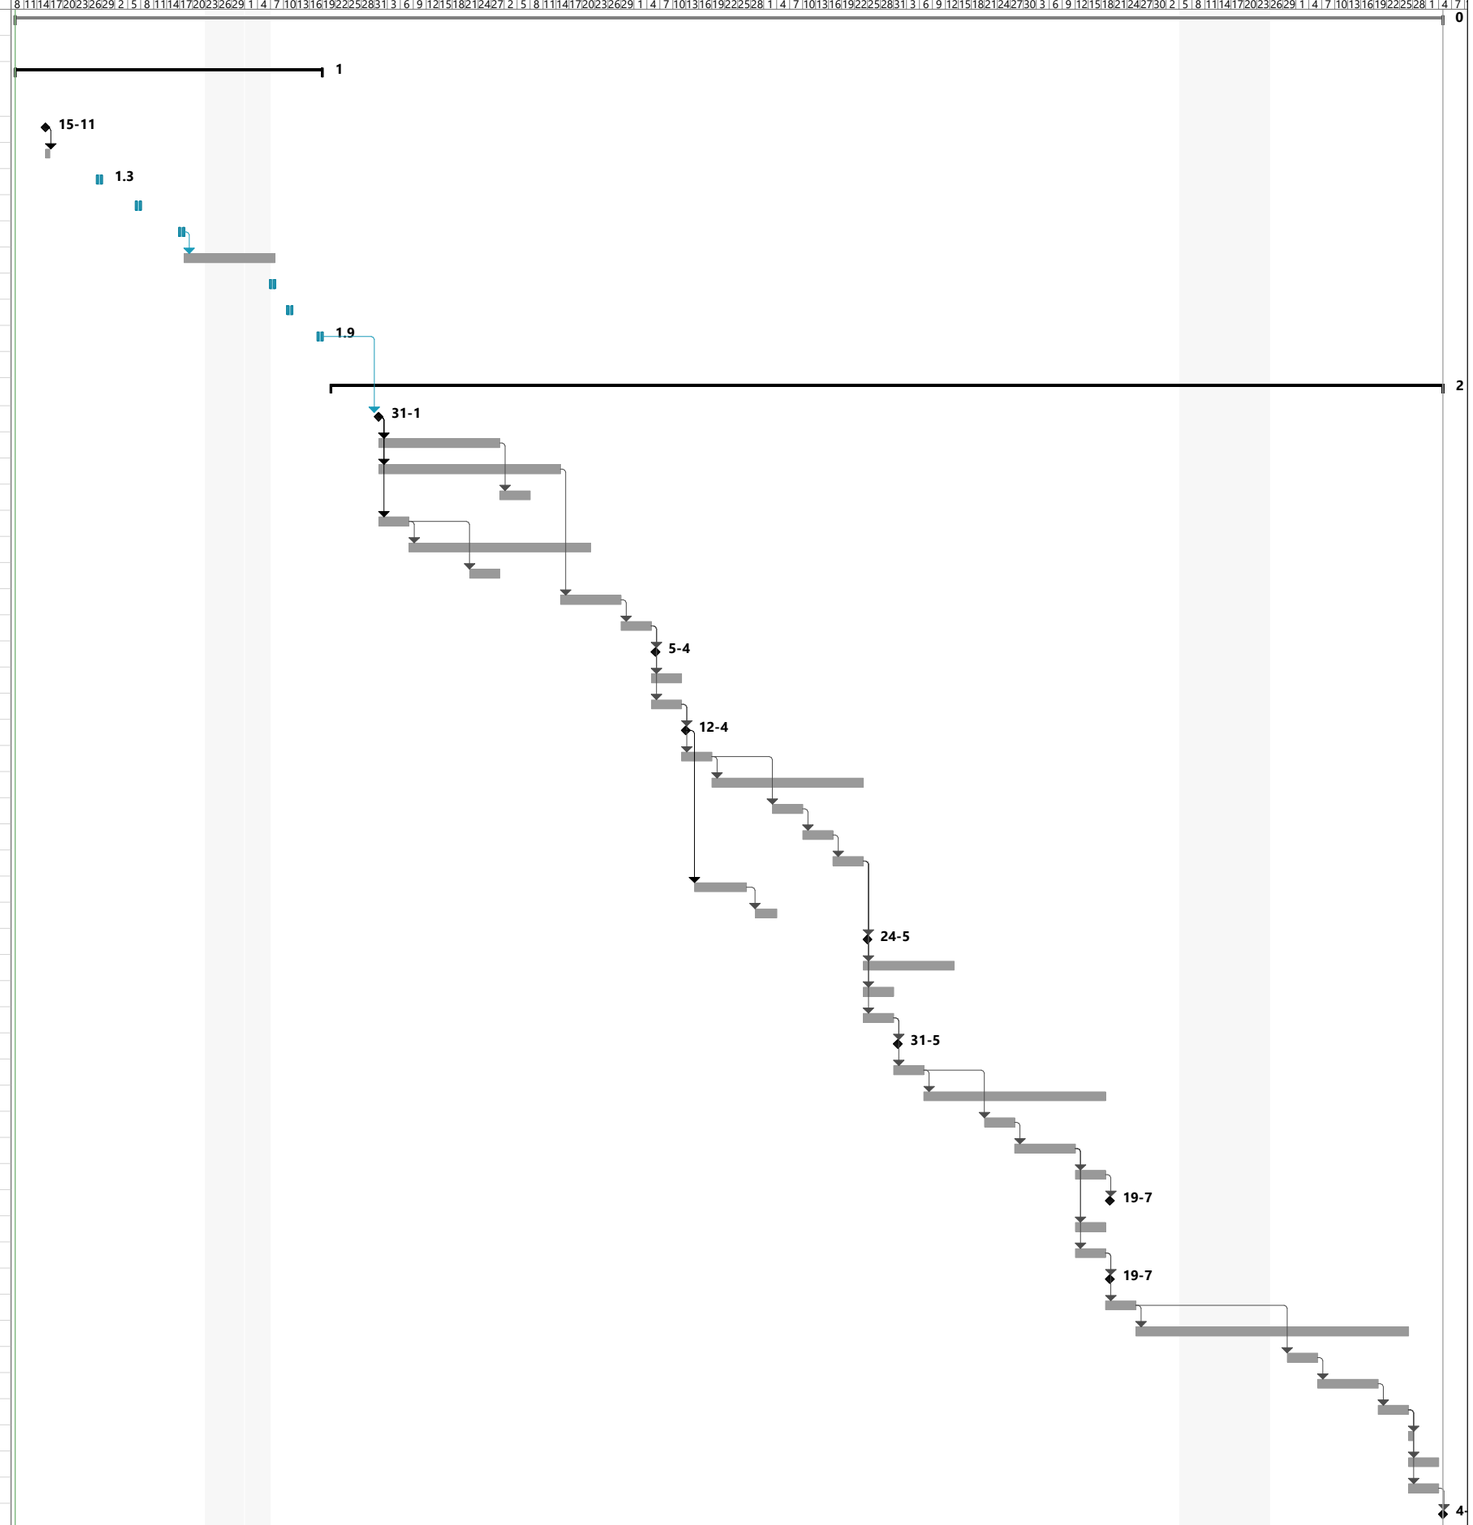

Project: Planning Provinciehuis
Date: Fri 9-11-18

Task
Split
Milestone
Summary
Project Summary
Inactive Task
Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only
Finish-only
External Tasks
External Milestone
Deadline
Progress
Manual Progress
