MB2.0

Rijkswaterstaat Cluster ZN B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten

STATUSDATUM: 21-05-21
AANTAL PAGINA'S: 1 of 2
DATUM & TUD: 07-07-21 09:32

Activity ID	Activity Name	Start	Original Duration	Finish	Total Float
MB2.0		17-05-19 A	4558	04-11-36	0
Afgesproken Scopemijlpalen (P85)		15-11-22	3646	04-11-36	0
VenR regime		15-11-22	3646	04-11-36	0
VR - 2.60	2.30 Aanvraag realisatiebesluit	15-11-22*	0		0
VR - 2.90	2.40 Besluit beslismoment 2 (Opdracht Beleid)		0	14-07-23*	0
VR - 3.630	3.10 Uitvoeringsbesluit DG-RWS aan HID		0	14-07-23*	0
VR - 3.620	3.20 Inkoopplan vastgesteld		0	02-10-24*	0
VR - 3.610	3.30 Start aanbesteding	06-02-25*	0		0
VR - 3.600	3.40 Gunning (definitieve gunning)		0	07-04-26*	0
VR - 3.590	3.50 Start uitvoering (= schop in de grond)		0	08-06-27*	0
VR - 3.520	4.20 Aanvraag decharge	14-10-36*	0		0
VR - 3.540	3.60 Openstelling		0	14-10-36*	0
VR - 3.530	4.10 Oplevering hoofdcontract = Overdracht aan beheerder		0	04-11-36*	0
Actuele deterministische stuurmijlpalen		18-11-21	3747	01-04-36	156
VenR regime		18-11-21	3747	01-04-36	156
MB-1030	Gunning Ingenieursbureau		0	18-11-21	3750
MB-1040	Start Ingenieursbureau	19-11-21	0		3750
MB-1130	Go/No Go beslissing en opdrachtverlening Fase 2 (einde Fase 1 Ingenieursdier		0	14-03-22	3678
MB-1140	Voorkeursalternatief bepaald		0	17-10-22	3529
MB-1150	Gate Projectbesluit en CIO-toets		0	06-12-22	3493
VR - 2.100	2.40 Besluit beslismoment 2 (Opdracht Beleid)		0	22-12-22	130
VR - 3.160	3.10 Uitvoeringsbesluit DG-RWS aan HID		0	22-12-22	3371
MB-1170	KAD 50-70% gereed		0	25-05-23	3386
MB-1200	KAD 95% gereed		0	29-08-23	3319
MB-1180	Tenderboard definitief inkoopplan		0	12-09-23	3309
MB-1060	3.20 Inkoopplan vastgesteld		0	13-10-23	238
MB-1210	Gate Marktbenadering		0	19-02-24	3205
MB-1070	3.30 Start aanbesteding uitvoeringsfase	20-02-24	0		237
MB-1080	3.40 Gunning		0	02-04-25	246
MB-1090	Start contractbegeleiding/realisatie	03-04-25	0		2928
MB-7000	Herijkingsmoment 2 (Go/NoGo)		0	12-05-26	261
VR - 3.120	3.50 Start uitvoering (= schop in de grond)	08-06-26	0		246
VR - 3.110	3.60 Openstelling	06-11-35	0		261
MB-1110	4.10 Oplevering hoofdcontract = Overdracht aan beheerder		0	26-11-35	246
MB-1120	4.20 Aanvraag decharge	01-04-36	0		140
Faseringen		17-05-19 A	4213	31-03-36	140
Rijkswaterstaat (RWS)		17-05-19 A	4213	31-03-36	140
MB-2005	PU-Planuitwerkingsfase	17-05-19 A	429	16-02-23	252
MB-3110	CV-Contractvoorbereidingsfase	23-12-22	276	19-02-24	157
MB-4010	AG-Aanbesteding & Gunning	20-02-24	277	02-04-25	246
MB-5020	CB-Contractbegeleiding	03-04-25	2637	24-09-35	140
MB-4210	TR-Transitiefase MB1.75 >>> MB2.0	03-04-25	120	25-09-25	140
MB-6020	OV-Overdracht & Decharge	25-09-35	135	31-03-36	140
Planuitwerking		02-12-19 A	839	16-02-23	3578
Rijkswaterstaat (RWS)		02-12-19 A	839	16-02-23	268
Mijlpalen & Fasering		16-02-23	0	16-02-23	252
~		16-02-23	0	16-02-23	252
MB-3020	Finish Planfase		0	16-02-23	252
Aanbesteding uitvraag IB		01-04-21 A	166	18-11-21	6
Mijlpalen & Fasering		01-04-21 A	160	18-11-21	6
MB-2495	Aanbesteding & Gunning IB	01-04-21 A	160	18-11-21	6
MB-2750	Finish Aanbesteding & Gunning		0	18-11-21	6
Aanbestedingsfase		25-05-21	77	08-09-21	7
MB-2650	Voorbereiden ind. Inlichtingen door OG	25-05-21*	4	28-05-21	7
MB-4040	Gesprekken individuele inlichtingen	31-05-21	5	04-06-21	7
MB-2655	Versturen proces verbaal individuele inlichtingen	07-06-21	5	11-06-21	7
MB-2660	Eventueel nota van inlichtingen n.a.v. gesprekken	14-06-21	3	16-06-21	7
MB-2770	2e algemene inlichtingenbijeenkomst	17-06-21	2	18-06-21	7
MB-3320	Versturen Nota van inlichtingen	21-06-21	5	25-06-21	7
MB-2675	Uiterste datum indienen schriftelijke individuele vragen TN		0	28-06-21	7
MB-2735	Beantwoorden individuele schriftelijk vragen TN	29-06-21	6	06-07-21	7
MB-2665	Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen door gegadigden		0	12-07-21	7
MB-2670	Uiterste datum verstrekken nadere inlichtingen		0	19-07-21	7
MB-2680	"Radiostilte" (uiterste datum verzenden inlichtingen)	20-07-21	50	07-09-21	9
MB-2685	Uiterste datum indienen inschrijvingen		0	08-09-21	7
Gunningsfase		09-09-21	51	18-11-21	6
MB-2690	Aanbesteding (open kluis)	09-09-21	1	09-09-21	7
MB-3970	Toetsen geschiktheidseisen	10-09-21	1	10-09-21	7
MB-2695	Individuele beoordeling BPKV	13-09-21	3	15-09-21	7
MB-2700	Concensus overleg BPKV	16-09-21	5	22-09-21	7
MB-2705	Opstellen BPKV motiveringen	23-09-21	4	28-09-21	7
MB-2730	Opstellen gunningsadvies en gunningsbeslissing	23-09-21	4	28-09-21	7
MB-2710	Financiële toetsingscommissie	24-09-21	2	27-09-21	8
MB-2715	Ondertekening gunningsadvies en gunningsbeslissing HID	29-09-21	10	12-10-21	7
MB-2720	Verzenden gunningsbeslissing (voornemen tot gunnen)	13-10-21	1	13-10-21	7
MB-2725	Alcatieltermijn	14-10-21	20	02-11-21	9
MB-3480	Opstellen gunningsadvies deel 2, opdrachtbrief en dienstverleningsovereenkom	25-10-21	8	03-11-21	6
MB-2740	Ondertekenen opdracht door HID	04-11-21	10	17-11-21	6
MB-3960	Verzenden opdracht	18-11-21	1	18-11-21	6
MB-2745	Definitieve gunning		0	18-11-21	6
Fase 1 Ingenieursdiensten		06-12-21	61	14-03-22	6
~		06-12-21	61	14-03-22	6
MB-2805	Projectinitiatiedocument en definitieve prijsaanbieding (Fase 1 Ingenieursdiens	06-12-21	61	14-03-22	6
Uitvoeren "Planuitwerking" door RWS		02-12-19 A	839	16-02-23	268
DAG-proces		19-11-21	269	22-12-22	157
MB-5180	DAG-proces Planuitwerkingsfase	19-11-21	269	22-12-22	157
Stap 1:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen - variantenstudie (fase 1)		01-04-21 A	296	20-06-22	6
MB-2260	K3-1 Ophalen klantbehoefte	01-04-21 A	81	30-07-21	52
MB-2230	K3-2 Formuleren klanteisen (PPO)	02-08-21	105	24-12-21	52
MB-2205	K3-3 Beoordelen klant eisteksten - concept	06-09-21	80	24-12-21	52
MB-2225	K3-4 Definitief maken klant eisteksten - concept	06-09-21	80	24-12-21	52
MB-7650	K3-5 Analyseren klant eisteksten	04-10-21	60	24-12-21	52
MB-2460	K4-1Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief ***	30-05-22	15	20-06-22	6
Stap 1:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen - variantenstudie (fase 1)		01-04-21 A	296	20-06-22	6
MB-7030	K3-1 Ophalen klantbehoefte	01-04-21 A	125	30-09-21	52
MB-7010	K3-2 Formuleren klanteisen	02-08-21*	105	24-12-21	52
MB-7040	K3-3 Beoordelen klant eisteksten - concept	03-09-21*	81	24-12-21	52
MB-7050	K3-4 Definitief maken klant eisteksten - concept	01-10-21	61	24-12-21	52
MB-7670	K3-5 Analyseren klant eisteksten	01-10-21	60	23-12-21	53
MB-7700	K3-1 Ophalen klantbehoefte (na herrijkingsmoment 1)	15-03-22	30	28-04-22	6
MB-7060	K4 - Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief	30-05-22	15	20-06-22	6
Stap 2:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen - voorkeursvariant (fase 2)		30-08-22	5	05-09-22	7
MB-7100	K4 - Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief	30-08-22	5	05-09-22	7
Stap 2:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen - voorkeursvariant (fase 2)		21-06-22	55	05-09-22	7
MB-7830	K3-1 Ophalen klantbehoefte	21-06-22	20	18-07-22	7
MB-7170	K4 - Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief	30-08-22	5	05-09-22	7
KES-proces (stappen K5 t/m K7)		01-04-21 A	373	05-09-22	7
MB-7180	KES-proces (stappen K5 t/m K7)	01-04-21 A	373	05-09-22	7
Interne onderzoeken		02-12-19 A	579	20-06-22	47
MB-2030	Onderzoeken machineveiligheid (MB 1.75)	02-12-19 A	230	25-06-21	168
MB-4335	Projectarchitectuur	15-03-22	25	19-04-22	6
MB-4315	Onderzoek Levensduur (hergebruik) Werktuigbouwkundig/Staalbouwkundig/Civ	20-04-22	40	20-06-22	6
MB-4320	Onderzoeken Planfase (Chroom-6)	20-04-22	15	11-05-22	72
MB-4325	Objectpaspoorten per object (incl. specifieke kenmerken CIV zoals netwerkasp	20-04-22	25	25-05-22	62
MB-4340	Visie service level agreement (SLA) (WP 1435)	20-04-22	40	20-06-22	47
MB-4345	Strategische visie Verkeers Water Management (VWM)	20-04-22	6	28-04-22	81
MB-4355	Leidende principes Verkeers Water Management (VWM) variant instandhouding	20-04-22	6	28-04-22	81
MB-7950	Leidende principes Verkeers Water Management (VWM) variant CBB	20-04-22	6	28-04-22	81
Veiligheid		20-04-22	20	18-05-22	67
MB-4300	Onderzoek Integrale beveiliging	20-04-22	20	18-05-22	67
MB-4305	Onderzoek Elektrische veiligheid	20-04-22	20	18-05-22	67
MB-4310	Onderzoek Brandveiligheid	20-04-22	20	18-05-22	67
MB-4330	Locatiebeveiligingsplan	20-04-22	20	18-05-22	67
Onderzoeken beschikbaarheid bouwblokken		19-11-21	50	10-02-22	134
MB-2755	Onderzoek beschikbaarheid bouwblokken	19-11-21	50	10-02-22	134
Marktconsultatie		15-03-22	51	31-05-22	145
MB-2760	Opstellen marktconsultatie document	15-03-22	20	11-04-22	145
MB-2765	ICT marktoets	15-03-22	20	11-04-22	145
MB-2820	Plenaire marktconsultatie + uitzetten vragen	12-04-22	1	12-04-22	145
MB-2825	Uiterste datum aanmelding marktconsultatie		0	12-04-22	145
MB-2830	Beantwoording vragen markt (schriftelijk)	13-04-22	5	21-04-22	145
MB-2835	Uitnodingen verzenden individuele gesprekken	22-04-22	1	22-04-22	145
MB-2840	Individuele gesprekken markt	25-04-22	10	09-05-22	145
MB-2845	Beoordelen antwoorden marktconsultatie	10-05-22	4	13-05-22	145
MB-2850	Opstellen rapportage marktconsultatie = Marktconsultatie gereed	16-05-22	10	31-05-22	145
MB-2855	Inkoopstrategie gereed		0	31-05-22	145
Voorkeursalternatief		11-10-22	15	31-10-22	38
MB-2905	Voorleggen voorkeursalternatief	11-10-22	5	17-10-22	6
MB-2915	Voorkeursalternatief GO/NOGO		0	17-10-22	6
MB-2920	Communicatie na besluit voorkeursalternatief	18-10-22	10	31-10-22	38
Kostenpooltoets 15%		18-10-22	5	24-10-22	11
MB-2880	Verzamelen stukken kostenpooltoets 15%	18-10-22	5	24-10-22	11
Gate projectbesluit		15-08-22	87	13-12-22	6
MB-2910	Aanvraag gate	15-08-22	1	15-08-22	6
MB-2925	Stukken verzamelen Bureau Gate Review	18-10-22	10	31-10-22	6
MB-2945	Aanleveren documenten voor Gate review	01-11-22	1	01-11-22	6
MB-2970	Interviewsessies Gate Review	16-11-22	5	22-11-22	6
MB-2975	Eindrapportage gereed (GATE projectbeslissing)	23-11-22	10	06-12-22	6
MB-2985	Verbeterplan	07-12-22	5	13-12-22	6
Beslismoment 2		18-10-22	78	16-02-23	252
MB-2890	Inplannen behandeling Beslismoment 2 BS/Beleid	18-10-22	1	18-10-22	36
MB-3035	Ontwerpproces - referentieontwerp t.b.v. BM2	18-10-22	20	14-11-22	27
MB-2895	Opstellen adviesmemo B2 + scope 2 formulier	19-10-22	10	01-11-22	36
MB-2990	Voorleggen beslismoment 2	14-12-22	1	14-12-22	6
MB-3005	2.40 Besluit beslismoment 2 (opdracht beleid)		0	22-12-22*	0
MB-3015	Communicatie na besluit B2	23-12-22	30	16-02-23	252
Ingenieursbureau (IB)		19-11-21	285	22-12-22	3618
Uitvoeren "Planuitwerking" door IB		19-11-21	285	22-12-22	3618
Mijlpalen & Fasering		19-11-21	269	22-12-22	3481
MB-2775	Start Uitvoering Planfase IB	19-11-21	0		6
MB-2780	Uitvoering Planfase IB	19-11-21	269	22-12-22	3481
MB-3010	Finish Uitvoering Planfase IB		0	22-12-22	3481
Uitvoering IB		19-11-21	202	10-10-22	3425
MB-2785	Start ingenieursbureau	19-11-21	0		79
MB-2800	Projectstart up	02-12-21	2	03-12-21	6
MB-3025	Start fase 2 Ingenieursdiensten		0	14-03-22	6
MB-2815	Opstellen kostenraming per alternatief	15-03-22	90	25-07-22	7
MB-2790	Overige onderzoeken t.b.v. variantenstudie	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-2810	Uitwerken adviezen / Varianten ontwerp	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-2875	Onderhoudsdeel MB2.0	15-03-22	105	05-09-22	4028
MB-2860	Onderzoeken Omgeving (Conditionering etc.) t.b.v. variantenstudie	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-2955	Onderzoeken Regio t.b.v. variantenstudie	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-7960	Onderzoeken Techniek t.b.v. variantenstudie	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-7970	Onderzoeken CIV t.b.v. variantenstudie	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-7980	Onderzoek overige veiligheidsdomeinen/Ingetrale veiligheid	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-7990	Rapportages Faseovergang Planuitwerkingsfase - Contractvoorbereidingsfase	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-8000	Projectplan Planuitwerkingsfase - Contractvoorbereidingsfase	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-8010	Beheren scope en Plan van Aanpak Planfase [P6]	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-8020	Tenderboard Planuitwerkngsfase	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-8030	Stakeholderanalyse	15-03-22	105	05-09-22	7
MB-3045	Businesscase variant instandhouding	21-06-22	60	03-10-22	6
MB-3055	Businesscase variant CBB	21-06-22	60	03-10-22	6
MB-2885	Definitief opstellen raming per alternatief volgens SSK systematiek +3mnd na o	26-07-22	15	05-09-22	7
MB-2865	Afwegen varianten (Advies ingenieursbureau)	07-09-22	24	10-10-22	6
Stap 1:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen - variantenstudie (fase 1)		15-03-22	50	25-05-22	6
MB-7690	K3-1 Ophalen klantbehoefte	15-03-22	30	26-04-22	6
MB-2340	K3-2 Formuleren klanteisen	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-2510	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7220	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7230	K3-5 Analyseren klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7240	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	05-05-22	15	25-05-22	6
Stap 1:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen - variantenstudie (fase 1)		05-04-22	35	25-05-22	6
MB-7720	K3-2 Formuleren klanteisen	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7730	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7740	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7750	K3-5 Analyseren klant eisteksten	05-04-22	20	04-05-22	6
MB-7760	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	05-05-22	15	25-05-22	6
Stap 2:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen - voorkeursvariant (fase 2)		21-06-22	50	29-08-22	7
MB-7770	K3-1 Ophalen klantbehoefte	21-06-22	20	18-07-22	7
MB-7780	K3-2 Formuleren klanteisen	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7790	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7800	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7810	K3-5 Analyseren klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7820	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	19-07-22	15	29-08-22	7
Stap 2:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen - voorkeursvariant (fase 2)		19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7840	K3-2 Formuleren klanteisen	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7850	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7860	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7870	K3-5 Analyseren klant eisteksten	19-07-22	15	29-08-22	7
MB-7880	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	19-07-22	15	29-08-22	7
Contractvoorbereiding		07-04-21 A	749	19-02-24	3316
Rijkswaterstaat (RWS)		07-04-21 A	703	19-02-24	3205
Uitvoeren "Contractvoorbereiding" door RWS		07-04-21 A	703	19-02-24	3205
Voorbereiding uitvoeren contractvoorbereiding door RWS		23-12-22	0	23-12-22	157
MB-3100	Start Contract voorbereiding	23-12-22	0		157
Voorbereiding contracten		07-04-21 A	350	06-09-22	3558
MB-3930	Voorbereiding presatiecontract	07-04-21 A	350	06-09-22	3558
MB-3940	Voorbereiding DBM contract	07-04-21 A	350	06-09-22	3558
DAG-proces		23-12-22	276	19-02-24	157
MB-5190	DAG-proces Contractvoorbereidingsfase	23-12-22	276	19-02-24	157
Stap 3:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen (fase 3)		06-03-23	10	17-03-23	201
MB-7640	K4 - Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief	06-03-23	10	17-03-23	201
Stap 3:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen (fase 3)		09-01-23	50	17-03-23	201
MB-7890	K3-1 Ophalen klantbehoefte	09-01-23*	20	03-02-23	201
MB-7570	K4 - Honorering klanteisen (per alternatief) - Definitief	06-03-23	10	17-03-23	201
Inkoopplan (tenderboard)		23-12-22	53	21-03-23	157
MB-4400	Opstellen definitef inkoopplan	23-12-22	30	16-02-23	157
MB-4410	Aanvragen TB	10-02-23	1	10-02-23	157
MB-4420	Inkoopplan gereed TB		0	16-02-23	157
MB-4430	Indienen inkoopplan bij tenderboard	17-02-23	1	17-02-23	157
MB-4440	Beoordeling inkoopplan door tenderboard	06-03-23	1	06-03-23	157
MB-4450	Ontvangst adviesmemo TB	07-03-23	1	07-03-23	157
MB-4460	Verwerken opmerkingen TB + opstellen & bespreken advies	08-03-23	10	21-03-23	157
MB-4470	Inkoopplan gereed		0	21-03-23	157
Inventarisatie vergunningen		23-12-22	110	16-06-23	172
MB-3050	Benodigde vergunningen verzamelen	23-12-22	110	16-06-23	172
MB-3060	Verzamelen wet- en regelgeving kaders en richtlijnen	23-12-22	110	16-06-23	172
MB-3070	Conditionering (flora & fauna, NGE, milieu, bodem)	23-12-22	110	16-06-23	172
Inventarisatie Kabels en Leidngen (K&L)		23-12-22	90	16-05-23	192
MB-3080	Opstellen regelingenschema K&L derden	23-12-22	90	16-05-23	192
Benodigde documenten KAD 50-70% - Presatiecontract		23-12-22	50	16-03-23	3431
MB-6770	Algemene memo stavaza per discipline + projectspecifieke vragen	23-12-22	31	17-02-23	179
MB-6780	Probalistische planning (PPI)	23-12-22	10	19-01-23	200
MB-6790	Risicodossier (OG+ON)	23-12-22	20	02-02-23	190
MB-6800	Toevoegen Inkoopstrategie en inkoopplan aan bundelen contractdocumenten	23-12-22	2	09-01-23	3479
MB-6810	Opstellen Contractbeheersingsplan (voor gunning)	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-6820	BPKV- EMVI criteria	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6830	Stakeholdersanalyse+ strategie	23-12-22	20	02-02-23	190
MB-6840	Klanteisenspecificatie totaal	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6850	Opstellen Basisovereenkomst	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6860	Opstellen Vraagspecificatie Proces	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-6870	Opstellen Vraagspecificatie Eisen	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-6880	Overzicht en status ontwerpanalyse	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-6890	Overzicht en status benodigde areaalonderzoeken (annex 13 Informatie)	23-12-22	40	02-03-23	170

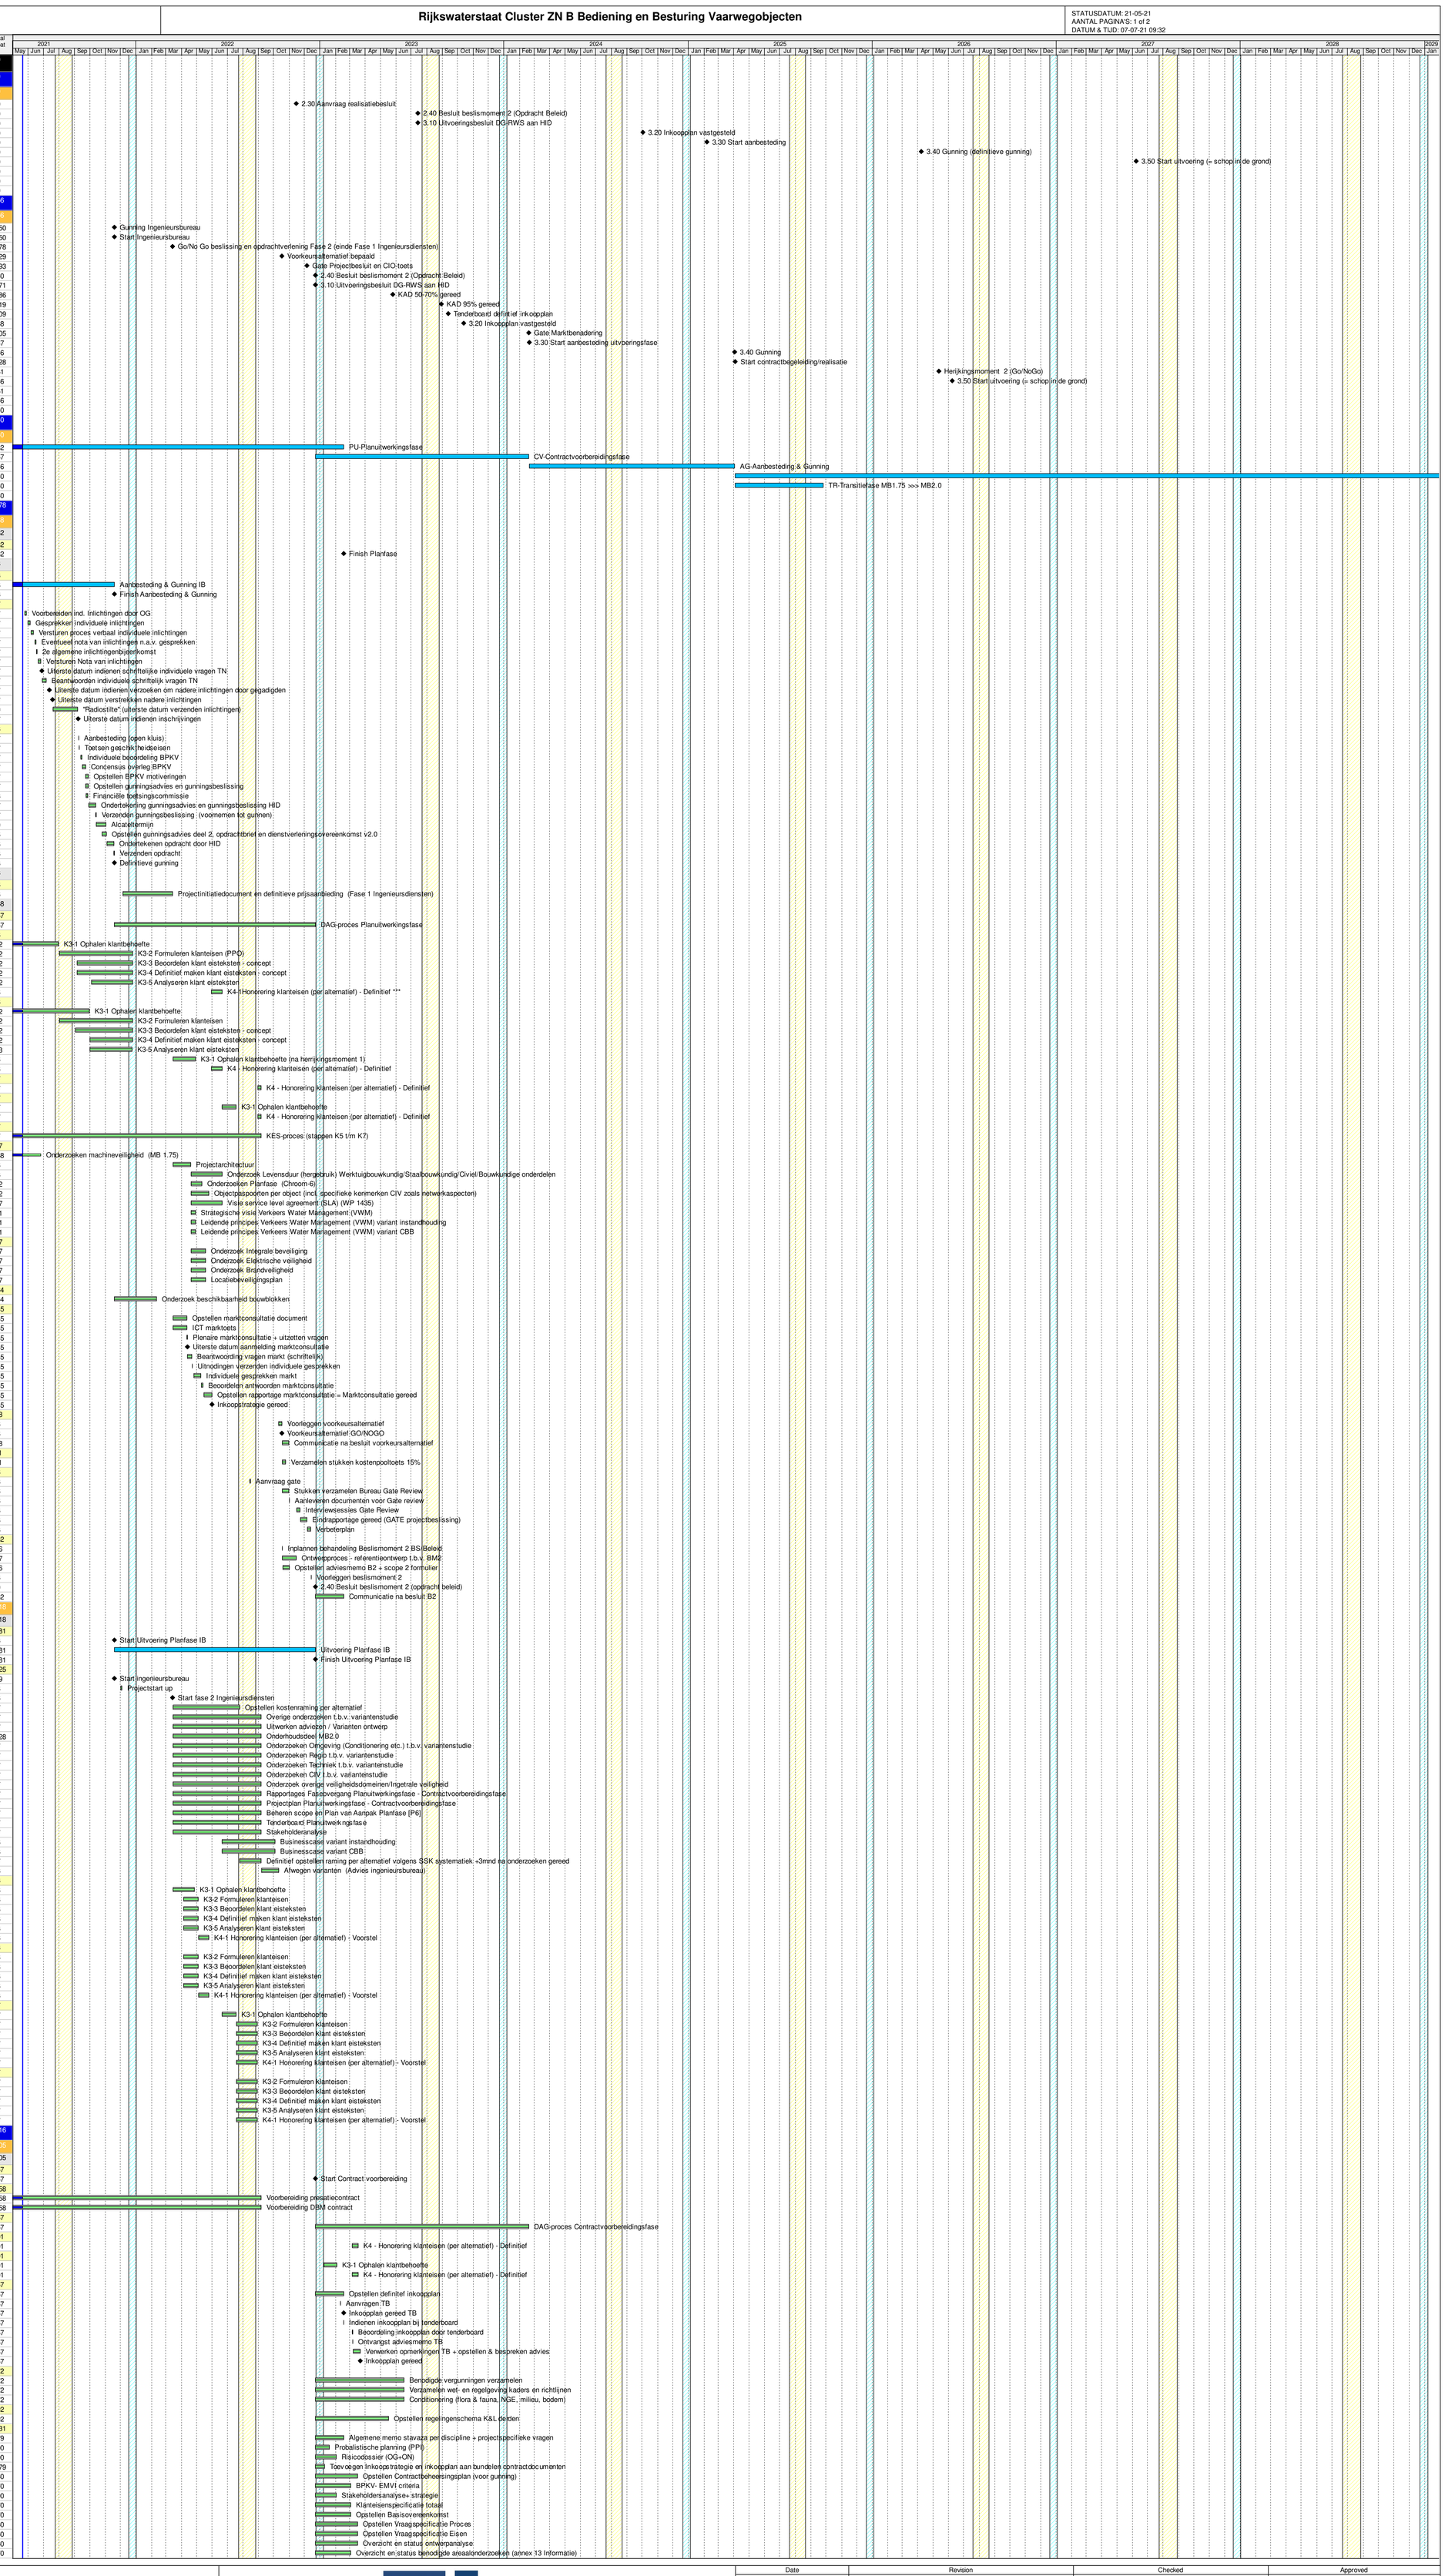

Remaining Level of Effort
Critical Remaining Work
Actual Level of Effort
Milestone
Primary Baseline
Actual milestone
Actual Work
Baseline Milestone
Remaining Work

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Date	Revision	Checked	Approved
21-05-2021	MB2.0 - Versie 1.1	Ricardo Beversluis	Definitief

MB2.0

Rijkswaterstaat Cluster ZN B Bediening en Besturing Vaarwegobjecten

STATUSDATUM: 21-05-21
AANTAL PAGINA'S: 2 of 2
DATUM & TUD: 07-07-21 09:32

Activity ID	Activity Name	Start	Original Duration	Finish	Total Float
MB-6900	Overzicht en status benodigde conditioneringsonderzoeken (annex 13 Informatie)	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6910	Overzicht status benodigde vergunningen	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6920	Overzicht minder hinder, SLOT's, werkbare uren, hinder scheepvaart (bijlagen H	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6930	Bijlage P Geodetische werkzaamheden + areaalgegevens	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6940	Opstellen Integraal veiligheidsplan	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6950	Object RI&E's	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6960	Raming SSK	23-12-22	40	02-03-23	170
Benodigde documenten KAD 50-70% - DBM		23-12-22	50	16-03-23	160
MB-3120	Algemene memo stavaza per discipline + projectspecifieke vragen	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3130	Probalistische planning (PPI)	23-12-22	10	19-01-23	200
MB-3140	Risicodossier (OG+ON)	23-12-22	20	02-02-23	190
MB-3150	Toevoegen Inkoopstrategie en inkoopplan aan bundelen contractdocumenten	23-12-22	2	09-01-23	208
MB-3160	Opstellen Contractbeheersingsplan (voor gunning)	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-3170	BPKV- EMVI criteria	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3180	Stakeholdersanalyse+ strategie	23-12-22	20	02-02-23	190
MB-3190	Klanteisenspecificatie totaal	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3200	Opstellen Basisovereenkomst	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3210	Opstellen Vraagspecificatie Proces	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-3220	Opstellen Vraagspecificatie Eisen	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-3230	Overzicht en status ontwerpanalyse	23-12-22	50	16-03-23	160
MB-3240	Overzicht en status benodigde areaalonderzoeken (annex 13 Informatie)	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3250	Overzicht en status benodigde conditioneringsonderzoeken (annex 13 Informatie)	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3260	Overzicht status benodigde vergunningen	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3270	Overzicht minder hinder, SLOT's, werkbare uren, hinder scheepvaart (bijlagen H	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3280	Bijlage P Geodetische werkzaamheden + areaalgegevens	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3290	Opstellen Integraal veiligheidsplan	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3300	Object RI&E's	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-3310	Raming SSK	23-12-22	40	02-03-23	170
MB-6980	Syteem ontwerp	23-12-22	30	16-02-23	180
Contractdocumenten KAD 50%-70%		13-12-22	83	24-04-23	157
MB-3030	Aanvragen Kad 50-70% (3 maanden voor KAD)	13-12-22	0		157
MB-3040	Intake KAD 50-70%	13-12-22	5	19-12-22	157
MB-3340	Opstellen documenten tbv KAD 50-70%	20-12-22	66	04-04-23	157
MB-3430	Bundelen contractdocumenten t.b.v. KAd 50% - 70% toets	22-03-23	10	04-04-23	157
MB-3440	Reviewronde/ controleren kwaliteit	05-04-23	10	20-04-23	157
MB-3460	Contractstukken 50-70% gereed		0	20-04-23	157
MB-3490	verzamelen + aanleveren documenten KAD 50-70%	21-04-23	2	24-04-23	157
KAD 50%-70% ter besluitvorming		10-05-23	25	16-06-23	323
MB-3530	KAD 50-70% bij KAD team ter besluitvorming	10-05-23	10	25-05-23	157
MB-3630	Claimscan	26-05-23	15	16-06-23	323
Contractdocumenten KAD 95%		05-04-23	76	27-07-23	157
MB-3540	Aanvragen Kad 95% (3 maanden voor KAD)	05-04-23	0		157
MB-3550	Intake KAD 95%	05-04-23	5	13-04-23	157
MB-3570	Opstellen documenten tbv KAD 95%	14-04-23	66	20-07-23	157
MB-3580	Opstellen basisovereenkomst 95%	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3750	Opstellen VSE 95%	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3760	Opstellen VSP 95%	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3590	Opstellen contractbijlagen + annexen	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3600	Opstellen I&B documenten	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3610	Contractbeheersplan	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3620	Verwerken opmerkingen KAD	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-6990	Syteem ontwerp (DBM !)	26-05-23	30	07-07-23	157
MB-3780	Contractraming gereed		0	07-07-23	157
MB-3790	Reviewronde / controleren kwaliteit	10-07-23	9	20-07-23	157
MB-3800	Contractstukken KAD 95% gereed		0	20-07-23	157
MB-3810	verzamelen + aanleveren documenten KAD 95%	21-07-23	5	27-07-23	157
KAD 95% ter besluitvorming		16-08-23	20	12-09-23	187
MB-3820	KAD 95% bij KAD team ter besluitvorming	16-08-23	10	29-08-23	157
MB-3700	Eventuele aanpassingen inkoopplan	30-08-23	10	12-09-23	187
MB-3830	Verwerken commentaar KAD 95%	30-08-23	10	12-09-23	187
MB-3840	Contractstukken gereed voor tenderboard		0	12-09-23	187
Aanbestedingsleidraad		23-12-22	39	01-03-23	252
MB-3090	Opstellen aanbestedingsleidraad	23-12-22	30	16-02-23	252
MB-3380	Opstellen definitieve aanbestedingsleidraad	17-02-23	5	23-02-23	252
MB-3390	Verwerken toetscommentaren	24-02-23	3	28-02-23	252
MB-3400	Vasstellen contractdocumenten door IPM-team	01-03-23	1	01-03-23	252
SSK raming (kostenpooltoets 10%)		21-04-23	45	28-06-23	164
MB-3470	Aanvraag kostenpooltoets (4wk voor uitvoeren toets)	21-04-23	5	28-04-23	164
MB-3500	Verzamelen stukken kostenpooltoets 10%	01-05-23	5	05-05-23	164
MB-3520	Aanleveren stukken kostenpooltoets	08-05-23	5	12-05-23	164
MB-3560	Uitvoeren kostenpooltoets	15-05-23	10	31-05-23	164
MB-3650	Terugkoppelen + bespreken resultaten concept toetsrapport	01-06-23	5	07-06-23	164
MB-3660	Aanpassen raming obv conceptversie	08-06-23	5	14-06-23	164
MB-3670	Terugkoppelen + bespreken resultaten definitieve versie	15-06-23	5	21-06-23	164
MB-3690	Definitief maken SSK-raming	22-06-23	5	28-06-23	164
Aanbestedingsdocumenten naar tenderboard		08-08-23	49	13-10-23	187
MB-3640	Aanvragen TB	08-08-23	1	08-08-23	187
MB-3720	Indienen aanbestedingsdocumenten naar tenderboard + verwerking adviesmem	13-09-23	2	14-09-23	187
MB-3980	Beoordeling door Tenderboard	29-09-23	1	29-09-23	187
MB-3730	Verwerken opmerkingen TB + opstellen & bespreken advies	02-10-23	10	13-10-23	187
MB-3770	Aanbestedingsdocumenten en definitief inkoopplan gereed		0	13-10-23	187
Gate Marktbenadering		27-09-23	94	19-02-24	157
MB-3850	Aanvraag Gate	27-09-23	4	02-10-23	157
MB-3950	Stukken voorbereiden Gate Review	27-11-23	10	08-12-23	157
MB-3880	Aanleveren documenten voor Gate review	11-12-23	1	11-12-23	157
MB-3860	Gate marktbenadering (1 mnd na KAD 95%)	09-01-24	30	19-02-24	157
MB-3870	Interviewsessies Gate Review 3B	09-01-24	15	29-01-24	157
MB-3890	Eindrapportage gereed	30-01-24	10	12-02-24	157
MB-3900	Verbeterplan	13-02-24	5	19-02-24	157
MB-3910	Finish Contract voorbereiding		0	19-02-24	157
Ingenieursbureau (IB)		09-01-23	40	03-03-23	187
Uitvoeren "Contractvoorbereiding" door IB		09-01-23	40	03-03-23	187
Stap 3:KES intern - K3 - Inventariseren klanteisen(fase 3) (IB)		09-01-23	40	03-03-23	187
MB-7580	K3-1 Ophalen klantbehoefte	09-01-23*	20	03-02-23	187
MB-7600	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7610	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7590	K3-2 Formuleren klanteisen	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7620	K3-5 Analyseren klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7630	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	06-02-23	20	03-03-23	187
Stap 3:KES extern - K3 - Inventariseren klanteisen(fase 3) (IB)		06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7900	K3-3 Beoordelen klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7910	K3-4 Definitief maken klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7920	K3-2 Formuleren klanteisen	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7930	K3-5 Analyseren klant eisteksten	06-02-23	20	03-03-23	187
MB-7940	K4-1 Honorering klanteisen (per alternatief) - Voorstel	06-02-23	20	03-03-23	187
Aanbesteding & Gunning		20-02-24	418	25-09-25	153
Rijkswaterstaat (RWS)		20-02-24	418	25-09-25	153
Aanmeldingsfase		20-02-24	27	27-03-24	157
Mijlpalen & Fasering		20-02-24	27	27-03-24	157
MB-4020	AANMELDINGSFASE	20-02-24	27	27-03-24	157
MB-4030	Start aanmeldingsfase	20-02-24	0		157
MB-4050	Finish aanmeldingsfase		0	27-03-24	157
Publicatie		20-02-24	1	20-02-24	157
MB-6140	Verzenden van Aankondiging (publicatie)	20-02-24	1	20-02-24	157
Aanmeldfase		27-02-24	22	27-03-24	157
MB-6150	Algemene inlichtingenbijeenkomst	27-02-24	1	27-02-24	157
MB-6160	1e nota van inlichtingen aanmeldingsfase	28-02-24	5	05-03-24	157
MB-6690	Indienen verzoeken om nadere inlichtingen	06-03-24	5	12-03-24	157
MB-6170	Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen		0	12-03-24	157
MB-6700	Verstrekken nadere inlichtingen (Nota van inlichtingen aanmeldingsfase)	13-03-24	5	19-03-24	157
MB-6180	Uiterlijk verstrekken nadere inlichtingen (Nota van inlichtingen aanmeldingsfase)		0	19-03-24	157
MB-6190	Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming		0	27-03-24	157
Selectiefase		28-03-24	25	01-05-24	160
Mijlpalen & Fasering		28-03-24	23	01-05-24	157
MB-4060	SELECTIEFASE	28-03-24	23	01-05-24	157
MB-4070	Start selectiefase	28-03-24	0		157
MB-4090	Finish selectiefase		0	01-05-24	157
Selectie markpartijen		28-03-24	25	01-05-24	160
MB-6200	Openen aanmeldingen digitale kluis	28-03-24	1	28-03-24	157
MB-6210	Beoordelen aanmeldingen (geschiktheid)	02-04-24	3	04-04-24	157
MB-6220	Opstellen mededeling uitsluiting / afwijzing en uitnodiging tot deelneming dialoog	05-04-24	3	09-04-24	157
MB-6230	Ondertekenen selectieadvies en brieven door DG	10-04-24	10	23-04-24	157
MB-6240	Verzenden uitsluiting, afwijzing en/of uitnodiging tot inschrijving	24-04-24	1	24-04-24	157
MB-6250	Bezwaartermijn	25-04-24	7	01-05-24	224
Dialoogfase		02-05-24	149	26-11-24	156
Mijlpalen & Fasering		02-05-24	131	26-11-24	142
MB-4100	DIALOOGFASE	02-05-24	131	26-11-24	142
MB-4110	Start dialoog fase	02-05-24	0		142
MB-4130	Finish dialoogfase		0	26-11-24	142
Eerste fase dialoog		02-05-24	81	22-08-24	152
MB-6260	Opstellen en ondertekenen uitnodiging tot dialoog door PM	02-05-24	1	02-05-24	142
MB-6270	Verzenden uitnodiging dialoog		0	02-05-24	142
MB-6280	Inlichtingenbijeenkomst	14-05-24	1	14-05-24	142
MB-6290	Verzenden 2e nota van inlichtingen	15-05-24	5	22-05-24	142
MB-6710	Indienen verzoeken om nadere inlichtingen	23-05-24	5	29-05-24	142
MB-6300	Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen		0	29-05-24	142
MB-6720	Verstrekken nadere inlichtingen (3e NvI dialoogfase)	30-05-24	5	05-06-24	142
MB-6310	Uiterlijk verstrekken nadere inlichtingen (3e NvI dialoogfase)		0	05-06-24	142
MB-6320	Uiterste datum indienen trechteringsproduct d.m.v. TN, Berichten		0	13-06-24	142
MB-6330	Openen trechteringsproducten	14-06-24	1	14-06-24	142
MB-6340	Beoordelen trechteringsproduct individueel	17-06-24	5	21-06-24	142
MB-6350	Beoordelen trechteringsproduct consensusoverleg	24-06-24	5	28-06-24	142
MB-6360	Opstellen trechteringsadvies trechteringsbeslissing	01-07-24	2	02-07-24	142
MB-6370	Ondertekenen trechteringsadvies en trechteringsbeslissing door DG	03-07-24	15	23-07-24	157
MB-6380	Verzenden trechteringsbeslissing	23-07-24	1	23-07-24	142
MB-6390	Bezwaartermijn	24-07-24	7	30-07-24	233
MB-6400	Loting (indien van toepassing)	19-08-24	1	19-08-24	144
MB-6410	Bezwaartermijn loting (indien van toepassing)	20-08-24	3	22-08-24	214
Tweede fase dialoog		23-08-24	68	26-11-24	142
MB-6420	Opstellen uitnodiging tot dialooggesprekken en ondertekenen door PM	23-08-24	1	23-08-24	142
MB-6430	Verzenden uitnodiging tot dialooggesprekken	26-08-24	1	26-08-24	142
MB-6440	Lezen en door ON indienen van concept agenda 1e ronde	27-08-24	15	16-09-24	142
MB-6450	Voorbereiding OG gesprekken	17-09-24	5	23-09-24	142
MB-6460	Dialooggesprekken 1e ronde en verslag	24-09-24	2	25-09-24	142
MB-6730	Lezen en door ON indienen van concept agenda 2e ronde	26-09-24	18	21-10-24	142
MB-6740	Voorbereiding OG gesprekken	22-10-24	5	28-10-24	142
MB-6750	Dialooggesprekken 2e ronde en verslag	29-10-24	2	30-10-24	142
MB-6640	evt. aanvullende NvI nav dialooggesprekken	31-10-24	5	06-11-24	142
MB-6470	Uiterste datum indienen verzoeken om nadere inlichtingen		0	19-11-24	142
MB-6760	Verstrekken nadere inlichtingen (eindnota)	20-11-24	5	26-11-24	142
MB-6480	Uiterste datum verstrekken nadere inlichtingen (eindnota)		0	26-11-24	142
MB-6490	Afsluiten dialoog		0	26-11-24	142
Inschrijffase		27-11-24	17	19-12-24	156
Mijlpalen & Fasering		27-11-24	17	19-12-24	140
MB-6660	INSCHRIJFFASE	27-11-24	17	19-12-24	140
MB-6680	Start inschrijf fase	27-11-24	0		140
MB-6670	Finish inschrijffase		0	19-12-24	140
Inschrijving		27-11-24	17	19-12-24	156
MB-6650	Verzenden uitnodiging tot inschrijving	27-11-24	1	27-11-24	140
MB-6500	"Radiostilte" (uiterste datum verzenden inlichtingen)	28-11-24	21	18-12-24	218
MB-6510	Indienen inschrijvingen	19-12-24	1	19-12-24	140
Gunningsfase		20-12-24	74	02-04-25	264
Mijlpalen & Fasering		20-12-24	64	02-04-25	246
MB-4140	GUNNINGSFASE	20-12-24	64	02-04-25	246
MB-4150	Start gunningsfase	20-12-24	0		140
MB-4180	Definitieve gunning		0	02-04-25	140
MB-4190	Verzenden van de opdrachtverlening = Finish gunningsfase		0	02-04-25	246
Gunning		20-12-24	74	02-04-25	146
MB-6520	Aanbesteding (opening inschrijvingen)	20-12-24	1	20-12-24	140
MB-6530	Individuele beoordeling BPKV	06-01-25	3	08-01-25	140
MB-6540	Plenaire	09-01-25	4	14-01-25	140
MB-6550	Financiële toetsingscommissie	15-01-25	2	16-01-25	140
MB-6560	Voornemen tot gunning en gunningsadvies deel 1 opstellen	17-01-25	4	22-01-25	140
MB-6570	Ondertekening gunningsadvies deel 1 en gunningsbeslissing door DG	23-01-25	20	19-02-25	140
MB-6580	Verzenden voornemen tot gunnen	20-02-25	1	20-02-25	140
MB-6590	Alcateltermijn	21-02-25	20	12-03-25	204
MB-6600	Opstellen gunningsadvies deel 2	13-03-25	1	13-03-25	140
MB-6610	Ondertekenen gunningsadvies deel 2 en opdracht door DG	14-03-25	14	02-04-25	140
MB-6630	Definitieve gunning		0	02-04-25	140
Transitiefase MB1.75 >>> MB2.0		03-04-25	120	25-09-25	140
Mijlpalen		03-04-25	120	25-09-25	140
MB-4200	Start transitiefase	03-04-25	0		140
MB-4230	Finish transitiefase		0	25-09-25	140
Transitie		03-04-25	120	25-09-25	140
MB-4220	Transitiefase	03-04-25	120	25-09-25	140
Contractbegeleiding		03-04-25	2667	05-11-35	261
Rijkswaterstaat (RWS)		03-04-25	2637	24-09-35	140
Contractbegeleiding		03-04-25	2637	24-09-35	140
MB-5010	Start Contractbegeleiding	03-04-25	0		246
MB-5120	Finish Contractbegeleiding		0	24-09-35	140
Realisatie van de werken door ON		03-04-25	2667	05-11-35	261
Realisatie prestatiecontract		26-09-25	2527	08-10-35	140
MB-5040	Start onderhoud	26-09-25	0		140
MB-5050	Onderhoudsperiode (10 Jaar)	26-09-25	2517	24-09-35	140
MB-5110	Finish onderhoud		0	24-09-35	140
MB-6000	Restpunten	25-09-35	10	08-10-35	140
Voorbereiding V en R		03-04-25	285	05-06-26	246
MB-5160	Uitvoeren onderzoeken	03-04-25	64	09-07-25	246
MB-5130	Voorontwerp (VO, RWS/ID/ON)	10-06-25	60	01-09-25	246
MB-5150	Opstellen definitieve Systeem- en Management eisen	10-07-25	190	17-04-26	262
MB-5030	Definitief ontwerp (DO, RWS/ID/ON)	01-08-25	190	12-05-26	246
MB-5140	Overeenkomen prijs voor V en R	13-05-26	15	05-06-26	246
MB-5060	Herijkingsmoment 2 (Go/NoGo)		0	05-06-26	246
Uitvoering V en R		08-06-26	1384	07-01-32	1259
MB-5070	Uitvoeringsontwerp (alle objecten, 18 stuks)	08-06-26	800	06-09-29	1843
MB-5090	Start voorbereiding uitvoering V en R (3.50)	08-06-26	0		246
MB-5170	Voorbereiding (1ste deel UO, voorbereiding uitvoering, software, inkoop, etc.)	08-06-26	120	20-11-26	1108
MB-5080	Realisatiefase (schop in de grond) / Uitvoering V en R	23-11-26	1264	07-01-32	1108
MB-5100	Finish voorbereiding uitvoering V en R		0	07-01-32	1259
Testen		09-10-35	20	05-11-35	140
MB-6030	Testen	09-10-35	20	05-11-35	140
Openstelling		05-11-35	0	05-11-35	140
MB-6040	Openstelling		0	05-11-35	140
Overdracht & Decharge		25-09-35	135	31-03-36	156
Rijkswaterstaat (RWS)		25-09-35	135	31-03-36	156
Voorbereiding uitvoeren overdracht en decharge door RWS		25-09-35	135	31-03-36	156
MB-6010	Start Oplevering & Overdracht	25-09-35	0		291
MB-6070	Gate oplevering		0	26-11-35	230
MB-6080	Aanvaarding werk door OG		0	26-11-35	230
MB-6050	4.10 oplevering hoofdcontract = overdracht beheerder		0	26-11-35	246
MB-6100	Interne afronding	27-11-35	90	31-03-36	140
Decharge		31-03-36	0	31-03-36	140
MB-6110	4.20 Aanvraag decharge		0	31-03-36	140
MB-6120	Finish Oplevering & Overdracht		0	31-03-36	140
Opdrachtnemer (ON)		05-11-35	15	26-11-35	230
Voorbereiding uitvoeren overdracht en decharge door ON		05-11-35	15	26-11-35	230
MB-6060	Oplevering		0	05-11-35	245
MB-6090	Verzoek tot oplevering	06-11-35	15	26-11-35	140

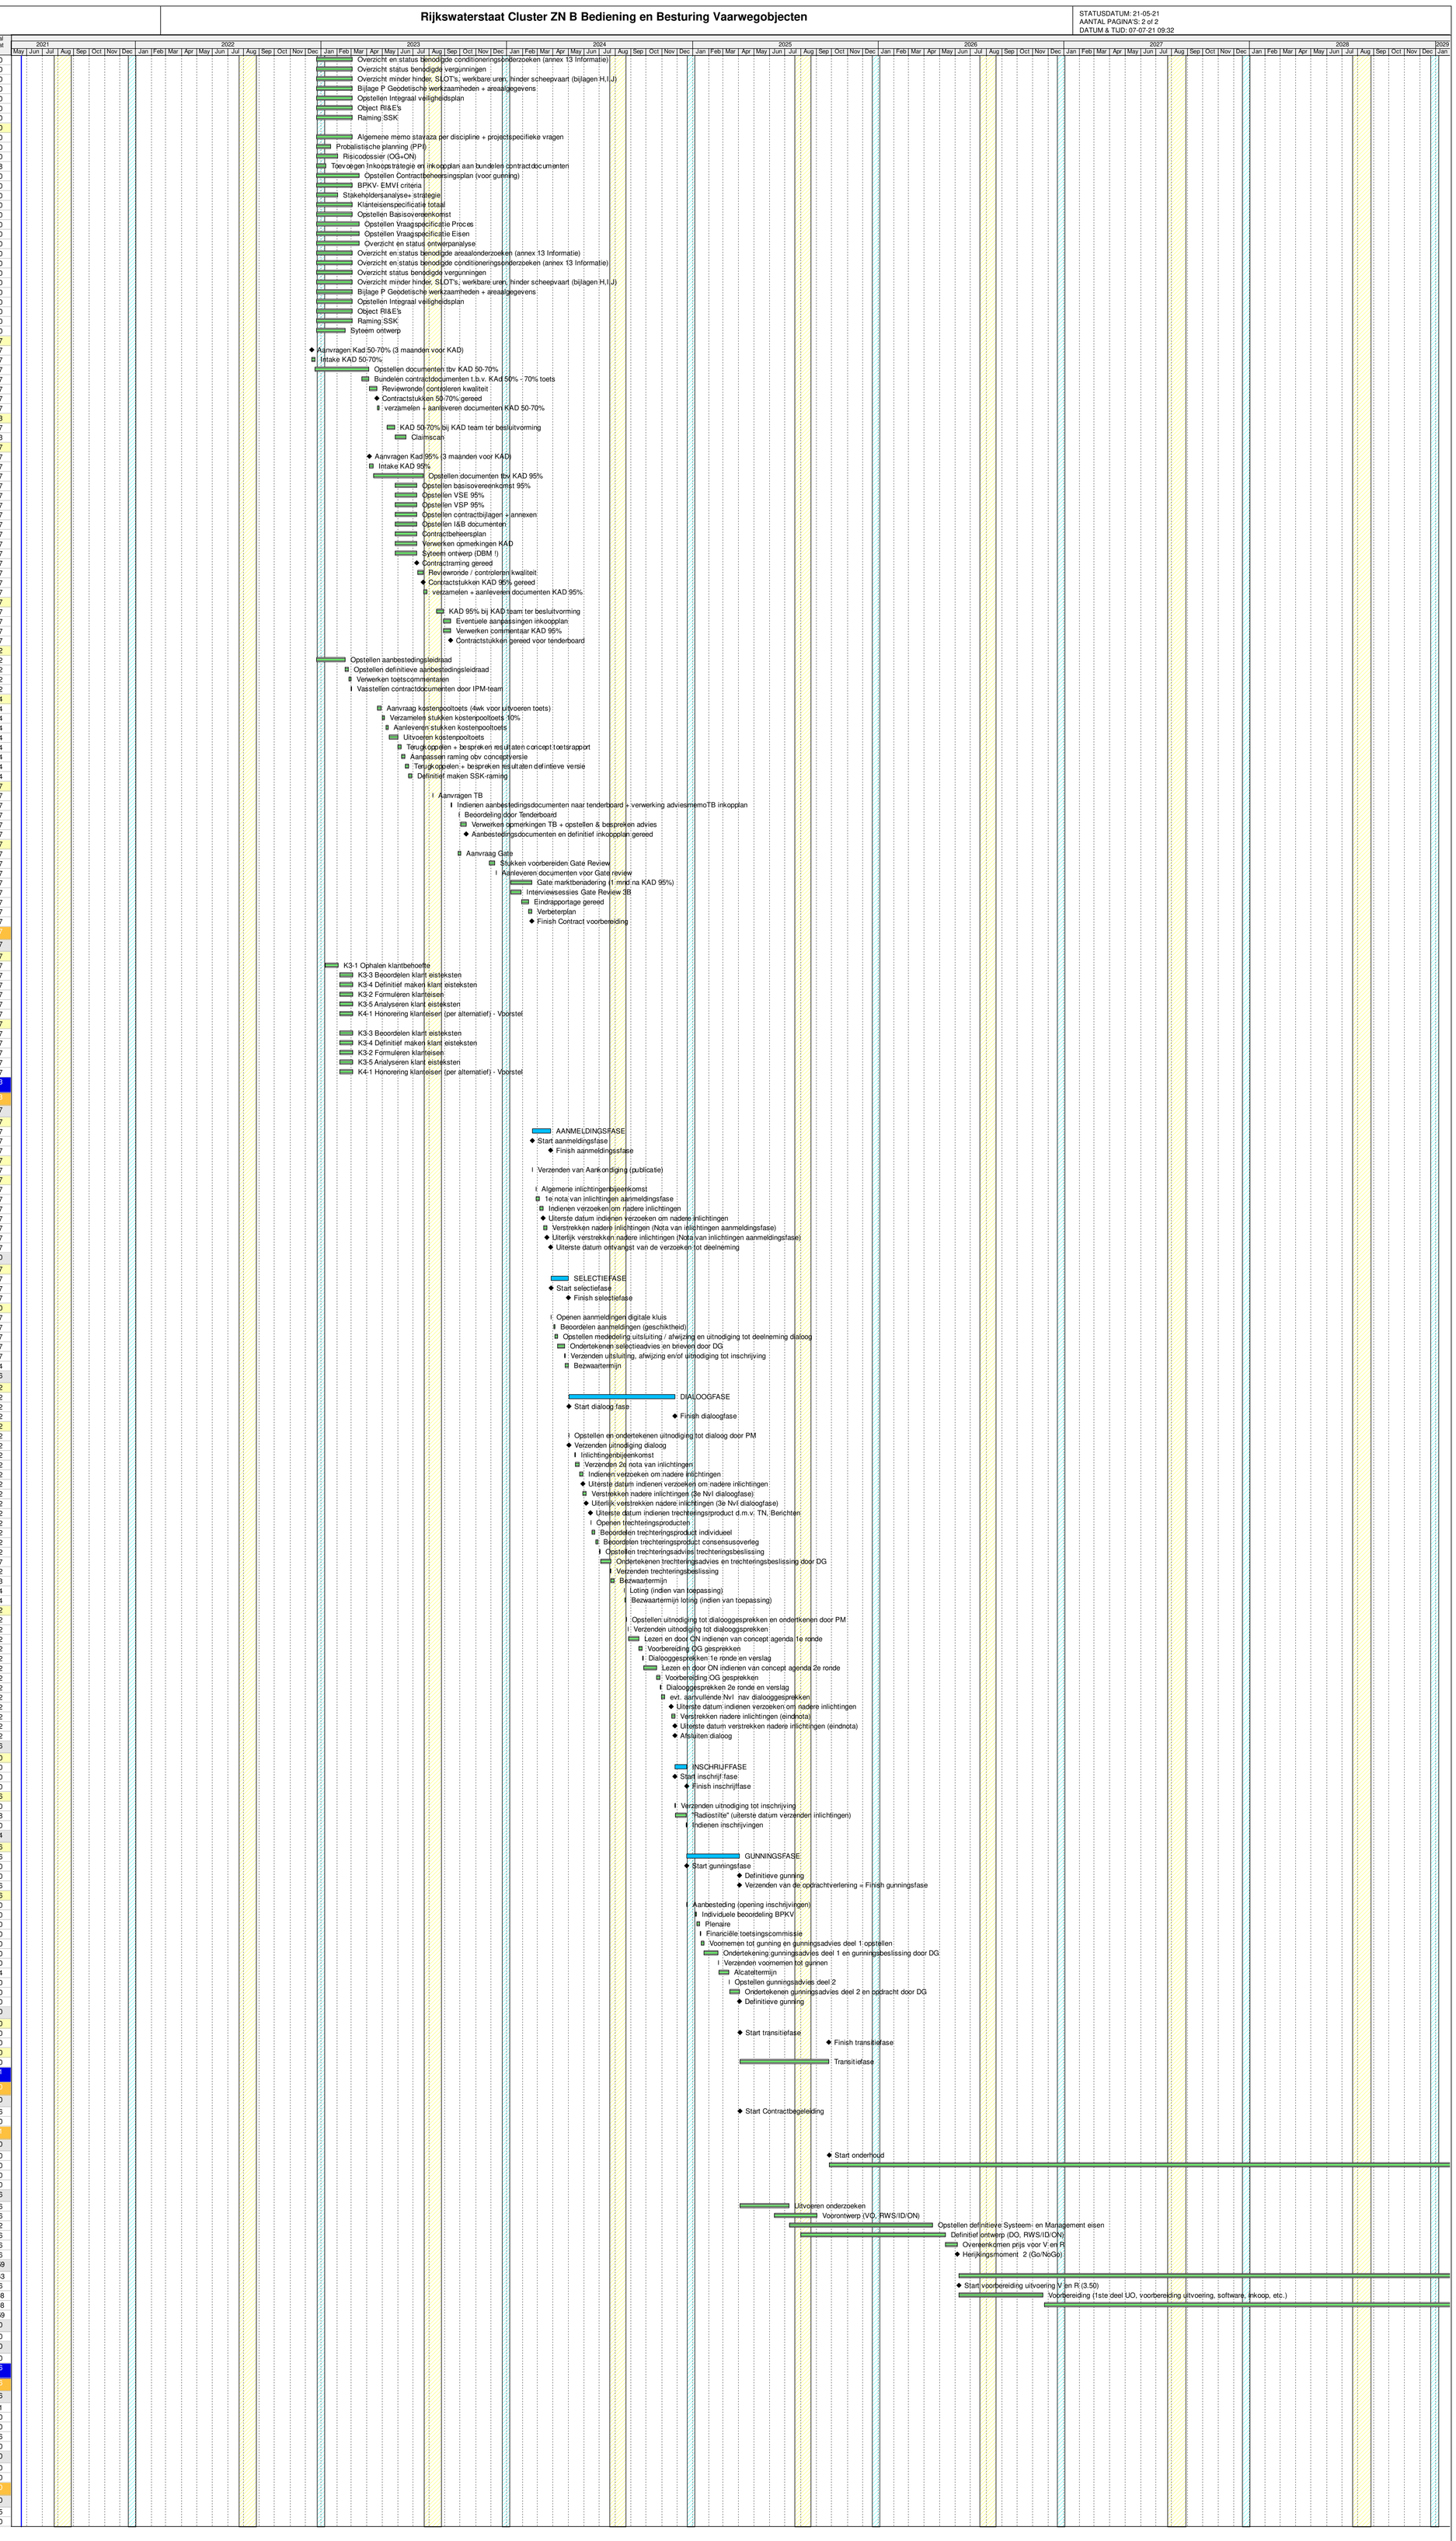

Remaining Level of Effort
Critical Remaining Work
Actual Level of Effort
Milestone
Primary Baseline
Actual milestone
Actual Work
Baseline Milestone
Remaining Work

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Date	Revision	Checked	Approved
21-05-2021	MB2.0 - Versie 1.1	Ricardo Beversluis	Definitief
