Id	Taakmod	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1		**Herziene planning Tijdelijke Huisvesting Buiksloterham**				
2						
3		**Initiatieffase**	**148 dagen**	**maa 12-10-2(**	**woe 19-5-21**	
4		Inventariseren randvoorwaarden Gemeente en Stedenbouw	20,4 wkn	maa 12-10-20	din 16-3-21	
5		Inventariseren wensen en eisen scholen	8 wkn	maa 8-3-21	vri 30-4-21	
6		Opstellen programma van eisen (inhoudelijke en gezamelijke visie + ruimtelijk)	10 wkn	woe 10-3-21	din 18-5-21	
7		Opstellen stichtingskostenraming	1 wk	maa 8-3-21	vri 12-3-21	
8		Vaststellen projectbudget	1 dag	woe 19-5-21	woe 19-5-21	6
9						
10		**Prijs- en contractvorming school**	**151 dagen**	**din 18-8-20**	**din 30-3-21**	
11		Voorbereiding aanbesteding	4 wkn	din 18-8-20	din 15-9-20	12EB
12		Aankondiging van opdracht	6 wkn	din 15-9-20	maa 26-10-2(	
13		Europese aanbesteding	8 wkn	din 27-10-20	maa 4-1-21	12
14		voorlopige gunning	0 dagen	din 19-1-21	din 19-1-21	
15		Mock-up maken en beoordelen	6 wkn	din 19-1-21	maa 1-3-21	14
16		Bezwaartermijn	20 dagen	din 2-3-21	maa 29-3-21	15
17		Gunning werk, contract en opdrach	1 dag	din 30-3-21	din 30-3-21	16
18						
19		**Prijs- en contractvorming Gymzaal**	**87 dagen?**	**vri 23-7-21**	**maa 22-11-2:**	
20		Voorbereiding aanbesteding	4 wkn	vri 23-7-21	vri 20-8-21	21EB
21		Aankondiging van opdracht	22 dagen?	vri 20-8-21	maa 20-9-21	
22		Europese aanbesteding	27 dagen?	vri 24-9-21	maa 1-11-21	21
23		voorlopige gunning	1 dag?	woe 10-11-2:	woe 10-11-2:	
24		Bezwaartermijn	7 dagen	don 11-11-21	vri 19-11-21	23
25		Gunning werk, contract en opdrach	1 dag	maa 22-11-2:	maa 22-11-2:	24
26						
27		**Ontwerpfase**	**141 dagen**	**maa 19-7-21**	**maa 31-1-22**	
28		Inpassingsstudie	5 wkn	maa 19-7-21	vri 20-8-21	
29		Selecteren architect voor uitwerkin	2 wkn	din 20-7-21	maa 2-8-21	
30		Opstellen ontwerp en vergunnings tekeningen school	10 wkn	din 3-8-21	maa 11-10-21	29
31		Opstellen ruimtelijke onderbouwing	4 wkn	din 3-8-21	maa 30-8-21	30EB+4 wkn
32		Opstellen tekenwerk gymzaal	10 wkn	din 23-11-21	maa 31-1-22	25
33		Uitvoeren bodemonderzoek/sonderingen ??	3 wkn	din 3-8-21	maa 23-8-21	29
34		Stikstofonderzoek	3 wkn	din 3-8-21	maa 23-8-21	29
35						
36		**Vergunningsaavraag reguliere procedure school**	**85 dagen?**	**din 21-9-21**	**maa 17-1-22**	
37		Voorbereiden bouwvergunning	3 wkn	din 21-9-21	din 12-10-21	38EB
38		Bouwvergunning	8 wkn	din 12-10-21	maa 6-12-21	30
39		Bezwaartermijn	6 wkn	din 7-12-21	maa 17-1-22	38
40		Definitieve bouwvergunning	0 dagen	maa 17-1-22	maa 17-1-22	39
41						
42		**Vergunningsaavraag reguliere procedure gymzaal**	**85 dagen?**	**din 11-1-22**	**maa 9-5-22**	
43		Voorbereiden bouwvergunning	3 wkn	din 11-1-22	din 1-2-22	44EB
44		Bouwvergunning	8 wkn	din 1-2-22	maa 28-3-22	32
45		Bezwaartermijn	6 wkn	din 29-3-22	maa 9-5-22	44
46		Definitieve bouwvergunning	0 dagen	maa 9-5-22	maa 9-5-22	45
47						
48		**Vergunningsaavraag Uitgebreide procedure**	**160 dagen**	**din 12-10-21**	**maa 23-5-22**	
53						
54		**Uitvoering**	**270 dagen**	**din 26-10-21**	**maa 7-11-22**	
55		Bouwvoorbereiding	8 wkn	din 23-11-21	din 18-1-22	59EB
56		Aanvraag NUTS bij een reguliere procedure	26 wkn	din 10-5-22	maa 7-11-22	40;46
57		Reserveren productiecapaciteit gymzaal	12 wkn	din 23-11-21	maa 14-2-22	25
58		Reserveren productiecapaciteit school incl voorbereiding	12 wkn	din 26-10-21	din 18-1-22	59EB
59		Productie school	14 wkn	din 18-1-22	maa 25-4-22	40
60		Productie Gymzaal	7 wkn	din 10-5-22	maa 27-6-22	46
61		Bouwrijpmaken/voorbereidingen terrein	2 wkn	din 12-4-22	din 26-4-22	62EB
62		Bouwuitvoering school	12 wkn	din 26-4-22	maa 18-7-22	59
63		Bouwuiktvoering gymzaal	6 wkn	din 28-6-22	maa 8-8-22	60
64		Oplevering	1 dag?	din 19-7-22	din 19-7-22	62
65		Nalopen opleverpunten	2 wkn	woe 20-7-22	din 2-8-22	64
66						
67		**Maaiveldinrichting**	**235 dagen**	**maa 13-9-21**	**vri 5-8-22**	
68		Inventariseren wensen vanuit de scholen en Gemeente	4 wkn	maa 13-9-21	vri 8-10-21	
69		Vertalen wensen in een maaiveldontwerp SO/VO/DO	12 wkn	maa 11-10-21	vri 31-12-21	68
70		**Aanbesteden terreininrichting**	**57 dagen**	**maa 6-12-21**	**din 22-2-22**	
71		Voorbereiding aanbesteding	4 wkn	maa 6-12-21	maa 3-1-22	72EB
72		Meervoudig onderhandse aanbesteding	21 dagen	maa 3-1-22	maa 31-1-22	69
73		Voorlopige gunning	1 wk	din 1-2-22	maa 7-2-22	72
74		Bezwaartermijn	2 wkn	din 8-2-22	maa 21-2-22	73
75		Gunning werk, contract en opdra	1 dag	din 22-2-22	din 22-2-22	74
76		Werkvoorbereiding, bestelling en levering	12 wkn	woe 23-2-22	din 17-5-22	75
77		**Realisatie maaiveldinrichting**	**46 dagen**	**vri 3-6-22**	**vri 5-8-22**	
78		Opschonen bouwterrein	2 dagen	vri 3-6-22	maa 6-6-22	62EB+6 w
79		Uitvullen met schoonzand	3 dagen	din 7-6-22	don 9-6-22	78
80		Profileren/egaliseren/verdichten	2 dagen	vri 10-6-22	maa 13-6-22	79
81		Aanbrengen straatlaag	3 dagen	din 14-6-22	don 16-6-22	80
82		Aanbrengen straatkolken	2 dagen	vri 17-6-22	maa 20-6-22	81
83		Aanbrengen kolkaansluiting	2 dagen	din 21-6-22	woe 22-6-22	82
84		aanbrengen bestrating	7 dagen	don 23-6-22	vri 1-7-22	83
85		Aanbrengen hekwerken	10 dagen	maa 4-7-22	vri 15-7-22	84
86		Plaatsen speeltoestellen	10 dagen	maa 4-7-22	vri 15-7-22	84
87		Plaatsen beplanting	14 dagen	maa 4-7-22	don 21-7-22	84
88		Aanbrengen pleinplakkers	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22	85
89		Oplevering terrein en nalopen respunten	2 wkn	maa 25-7-22	vri 5-8-22	88
90						
91		**omgevingsvergunning brandveilig gebruik**	**175 dagen?**	**woe 6-10-21**	**woe 8-6-22**	
92		opstellen documenten tbv aanvraa	2 wkn	woe 6-10-21	woe 20-10-2:	93EB
93		indienen aanvraag	1 wk	woe 20-10-2:	woe 27-10-2:	94EB
94		beslistermijn 26 weken	26 wkn	woe 27-10-2:	woe 27-4-22	95EB
95		awb termijn 6 weken	6 wkn	woe 27-4-22	woe 8-6-22	96EB
96		vergunning onherroepelijk (bij geer	0 dagen	woe 8-6-22	woe 8-6-22	64BE-6 wk
97						
98		**Inhuizen en ingebruikname**	**31 dagen?**	**maa 18-7-22**	**maa 29-8-22**	
99		Inhuizen	3 wkn	woe 3-8-22	din 23-8-22	65
100		Zomervakantie	31 dagen?	maa 18-7-22	maa 29-8-22	
101		Ingebruikname	1 dag	maa 29-8-22	maa 29-8-22	

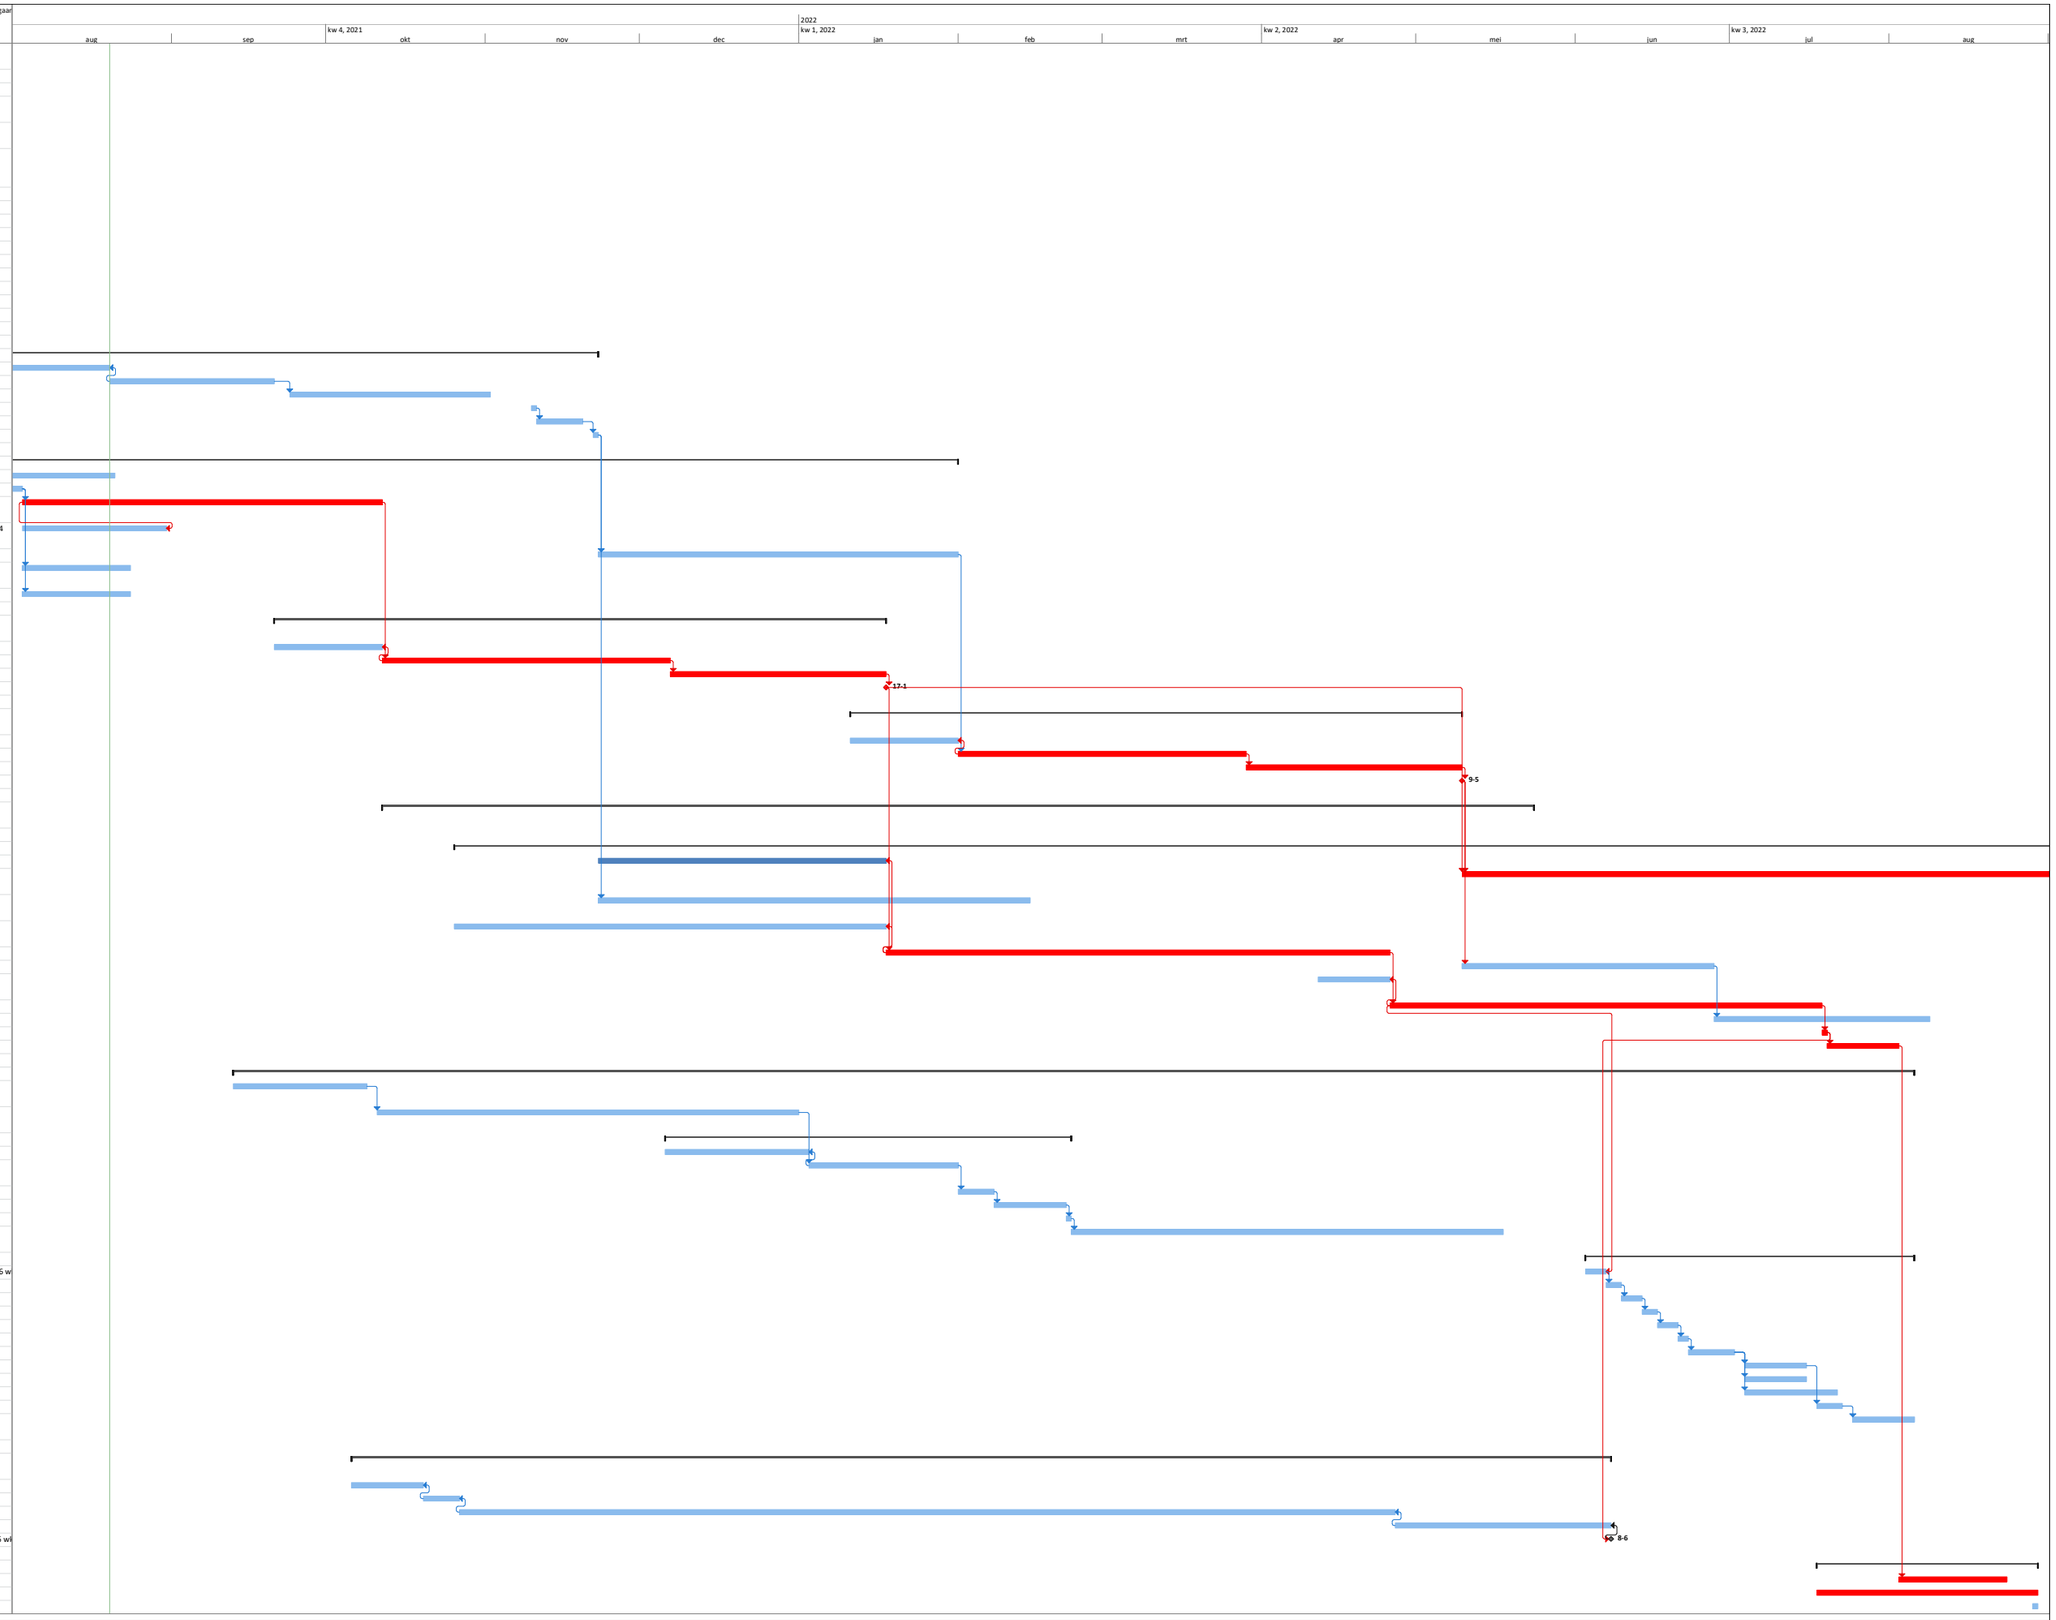

Project: Tijdelijke school Buiksloter
Datum: vri 20-8-21

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Externe taken | Externe mijlpaal | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Deadline | Voortgang | Voortgang, handmatig
