Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Detailplanning tijdelijke huisvesting ISU**			
2	Voorbereiding aanbesteding	12 wkn	din 14-12-21	maa 7-3-22
3	Opstellen programma van eisen	9 wkn	din 14-12-21	maa 14-2-22
4	Opstellen gunningsleidraad	9 wkn	din 14-12-21	maa 14-2-22
5	Opstellen contracten	6 wkn	din 4-1-22	maa 14-2-22
6	**Tenderboard (aanleveren strategie)**	**2 wkn**	**woe 29-12-21**	**din 11-1-22**
7	Aanleveren documenten bij Tenderboard	0 wkn	woe 29-12-21	woe 29-12-21
8	Vergadering Tenderboard	0 wkn	din 11-1-22	din 11-1-22
9	**Afronding documenten**	**3 wkn**	**din 15-2-22**	**maa 7-3-22**
10	Vewerken laatste aanpassingen programma van eisen en gunningsleidraad	3 wkn	din 15-2-22	maa 7-3-22
11	Programma van eisen, gunningsleidraad en contracten gereed	0 wkn	maa 7-3-22	maa 7-3-22
12	Aanbesteding ontwerp & uitvoering (Europees niet openbaar)	26 wkn	maa 14-2-22	vri 12-8-22
13	**Publicatie TenderNed**	**4,2 wkn**	**maa 14-2-22**	**maa 14-3-22**
14	Publicatie TenderNed	1 wk	maa 14-2-22	vri 18-2-22
15	Nota van inlichtingen (vragen)	1 wk	maa 28-2-22	vri 4-3-22
16	Nota van inlichtingen (antwoorden)	1 wk	din 8-3-22	maa 14-3-22
17	**Ontvangst aanmelgingen**	**4 wkn**	**zon 20-3-22**	**vri 15-4-22**
18	Ontvangst aanmeldingen	0 wkn	zon 20-3-22	zon 20-3-22
19	Controle aanmeldingen	1 wk	maa 21-3-22	vri 25-3-22
20	Beoordelen aanmeldingen	1 wk	maa 28-3-22	vri 1-4-22
21	Voorlopige selectie / voorlopige afwijzing	1 wk	maa 4-4-22	vri 8-4-22
22	Bezwaartermijn (niet wettelijk verplicht)	1 wk	maa 11-4-22	vri 15-4-22
23	**Versturen inschrijvingsleidraad geselecteerde partijen**	**5,6 wkn**	**din 19-4-22**	**vri 27-5-22**
24	Versturen inschrijvingsleidraad geselecteerde partijen	0 wkn	din 19-4-22	din 19-4-22
25	Nota van inlichtingen 1 (vragen)	1 wk	maa 2-5-22	vri 6-5-22
26	Nota van inlichtingen 1 (antwoorden)	1 wk	maa 9-5-22	vri 13-5-22
27	Nota van inlichtingen 2 (vragen)	1 wk	maa 16-5-22	vri 20-5-22
28	Nota van inlichtingen 2 (antwoorden)	1 wk	maa 23-5-22	vri 27-5-22
29	**Indienen inschrijvingen / openen kluis**	**7 wkn**	**maa 6-6-22**	**vri 22-7-22**
30	Indienen inschrijvingen / openen kluis	1 wk	maa 6-6-22	vri 10-6-22
31	Controle inschrijvingen	1 wk	maa 6-6-22	vri 10-6-22
32	Beoordeling door team	1 wk	maa 13-6-22	vri 17-6-22
33	Gunning / afwijzingsbrieven	1 wk	maa 20-6-22	vri 24-6-22
34	Voorlopige gunning / start Alcatel	1 wk	maa 27-6-22	vri 1-7-22
35	Alcatel	3 wkn	maa 4-7-22	vri 22-7-22
36	Verificatiegesprek	1 wk	maa 18-7-22	vri 22-7-22
37	**Definitieve gunning**	**2 wkn**	**maa 1-8-22**	**vri 12-8-22**
38	Definitieve gunning	1 wk	maa 1-8-22	vri 5-8-22
39	Contractondertekening	1 wk	maa 8-8-22	vri 12-8-22
40	Ontwerp	8 wkn	maa 15-8-22	vri 7-10-22
41	**Voorlopig ontwerp (VO)**	**4 wkn**	**maa 15-8-22**	**vri 9-9-22**
42	Opstellen VO (let op, zomervakantie)	2 wkn	maa 15-8-22	vri 26-8-22
43	Afstemming VO (let op, zomervakantie)	2 wkn	maa 29-8-22	vri 9-9-22
44	**Definitief ontwerp (DO)**	**6 wkn**	**maa 29-8-22**	**vri 7-10-22**
45	Opstellen DO + afstemmen (let op, zomervakantie)	6 wkn	maa 29-8-22	vri 7-10-22
46	Vergunning	18 wkn	maa 12-9-22	vri 13-1-23
47	Opstellen vergunningstekeningen (parallel aan DO)	4 wkn	maa 12-9-22	vri 7-10-22
48	Indienen vergunning	0 wkn	vri 7-10-22	vri 7-10-22
49	Behandeltermijn	8 wkn	maa 10-10-22	vri 2-12-22
50	~~Eventuele verlenging behandeltermijn~~	~~6 wkn~~	~~maa 5-12-22~~	~~vri 13-1-23~~
51	Bezwaar	6 wkn	maa 5-12-22	vri 13-1-23
52	Realisatie	45 wkn	maa 10-10-22	vri 18-8-23
53	Aanvragen NUTS voorziening	26 wkn	maa 10-10-22	vri 7-4-23
54	Bouwvoorbereiding o.a. bestellen materialen en opstellen uitvoeringsontwerp (parallel aan behandeling vergunning)	14 wkn	maa 10-10-22	vri 13-1-23
55	Bouw tijdelijke huisvesting	17 wkn	maa 10-4-23	vri 4-8-23
56	Verhuizen	2 wkn	maa 7-8-23	vri 18-8-23

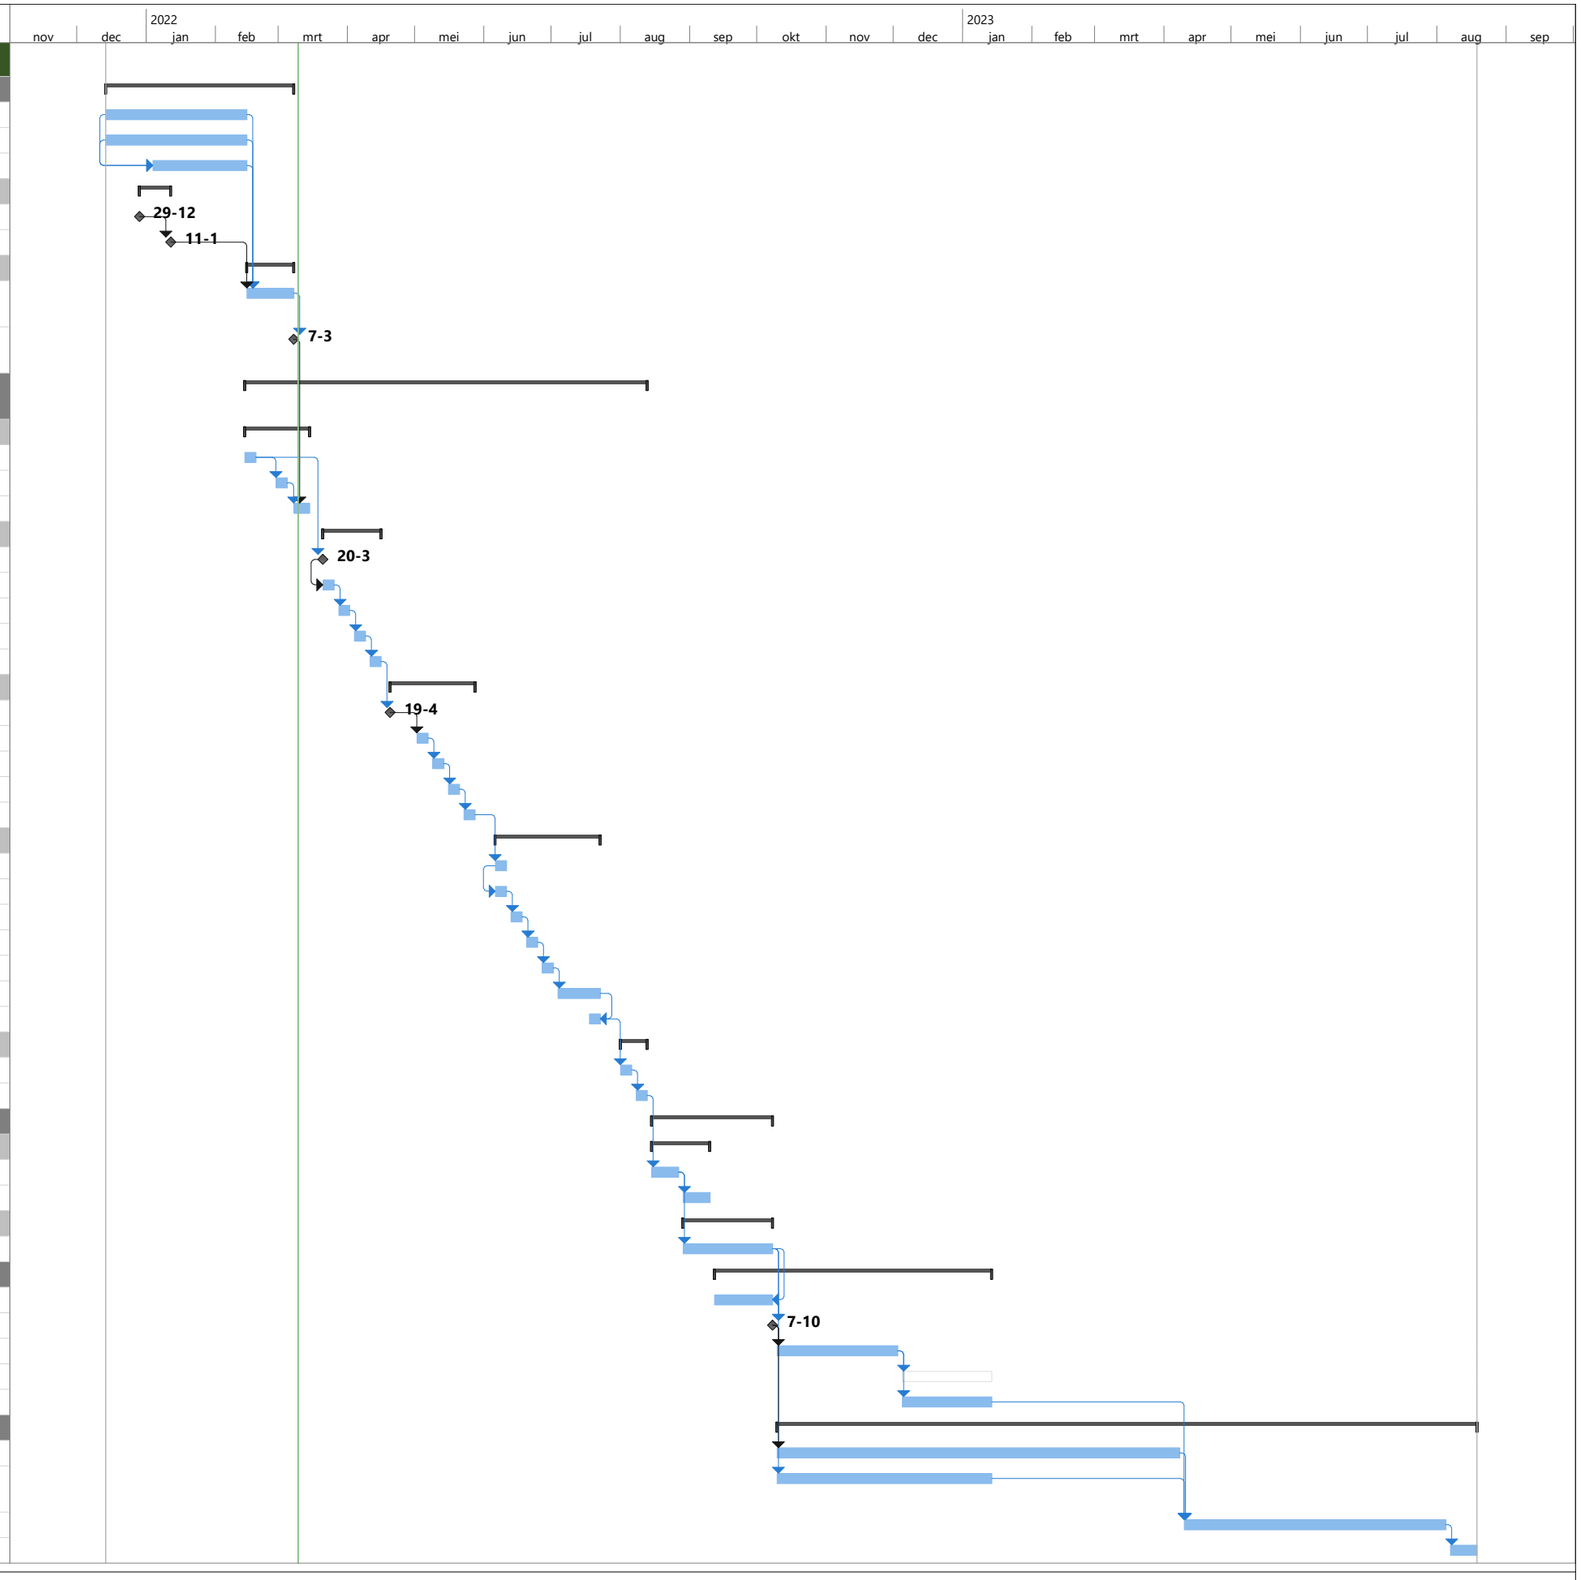

Project: 20220301 detailplannin
Datum: don 10-3-22

Taak Mijlpaal Samenvatting
