BIJLAGE 1 - PLANNING DE KLEINE VLIEGENIER
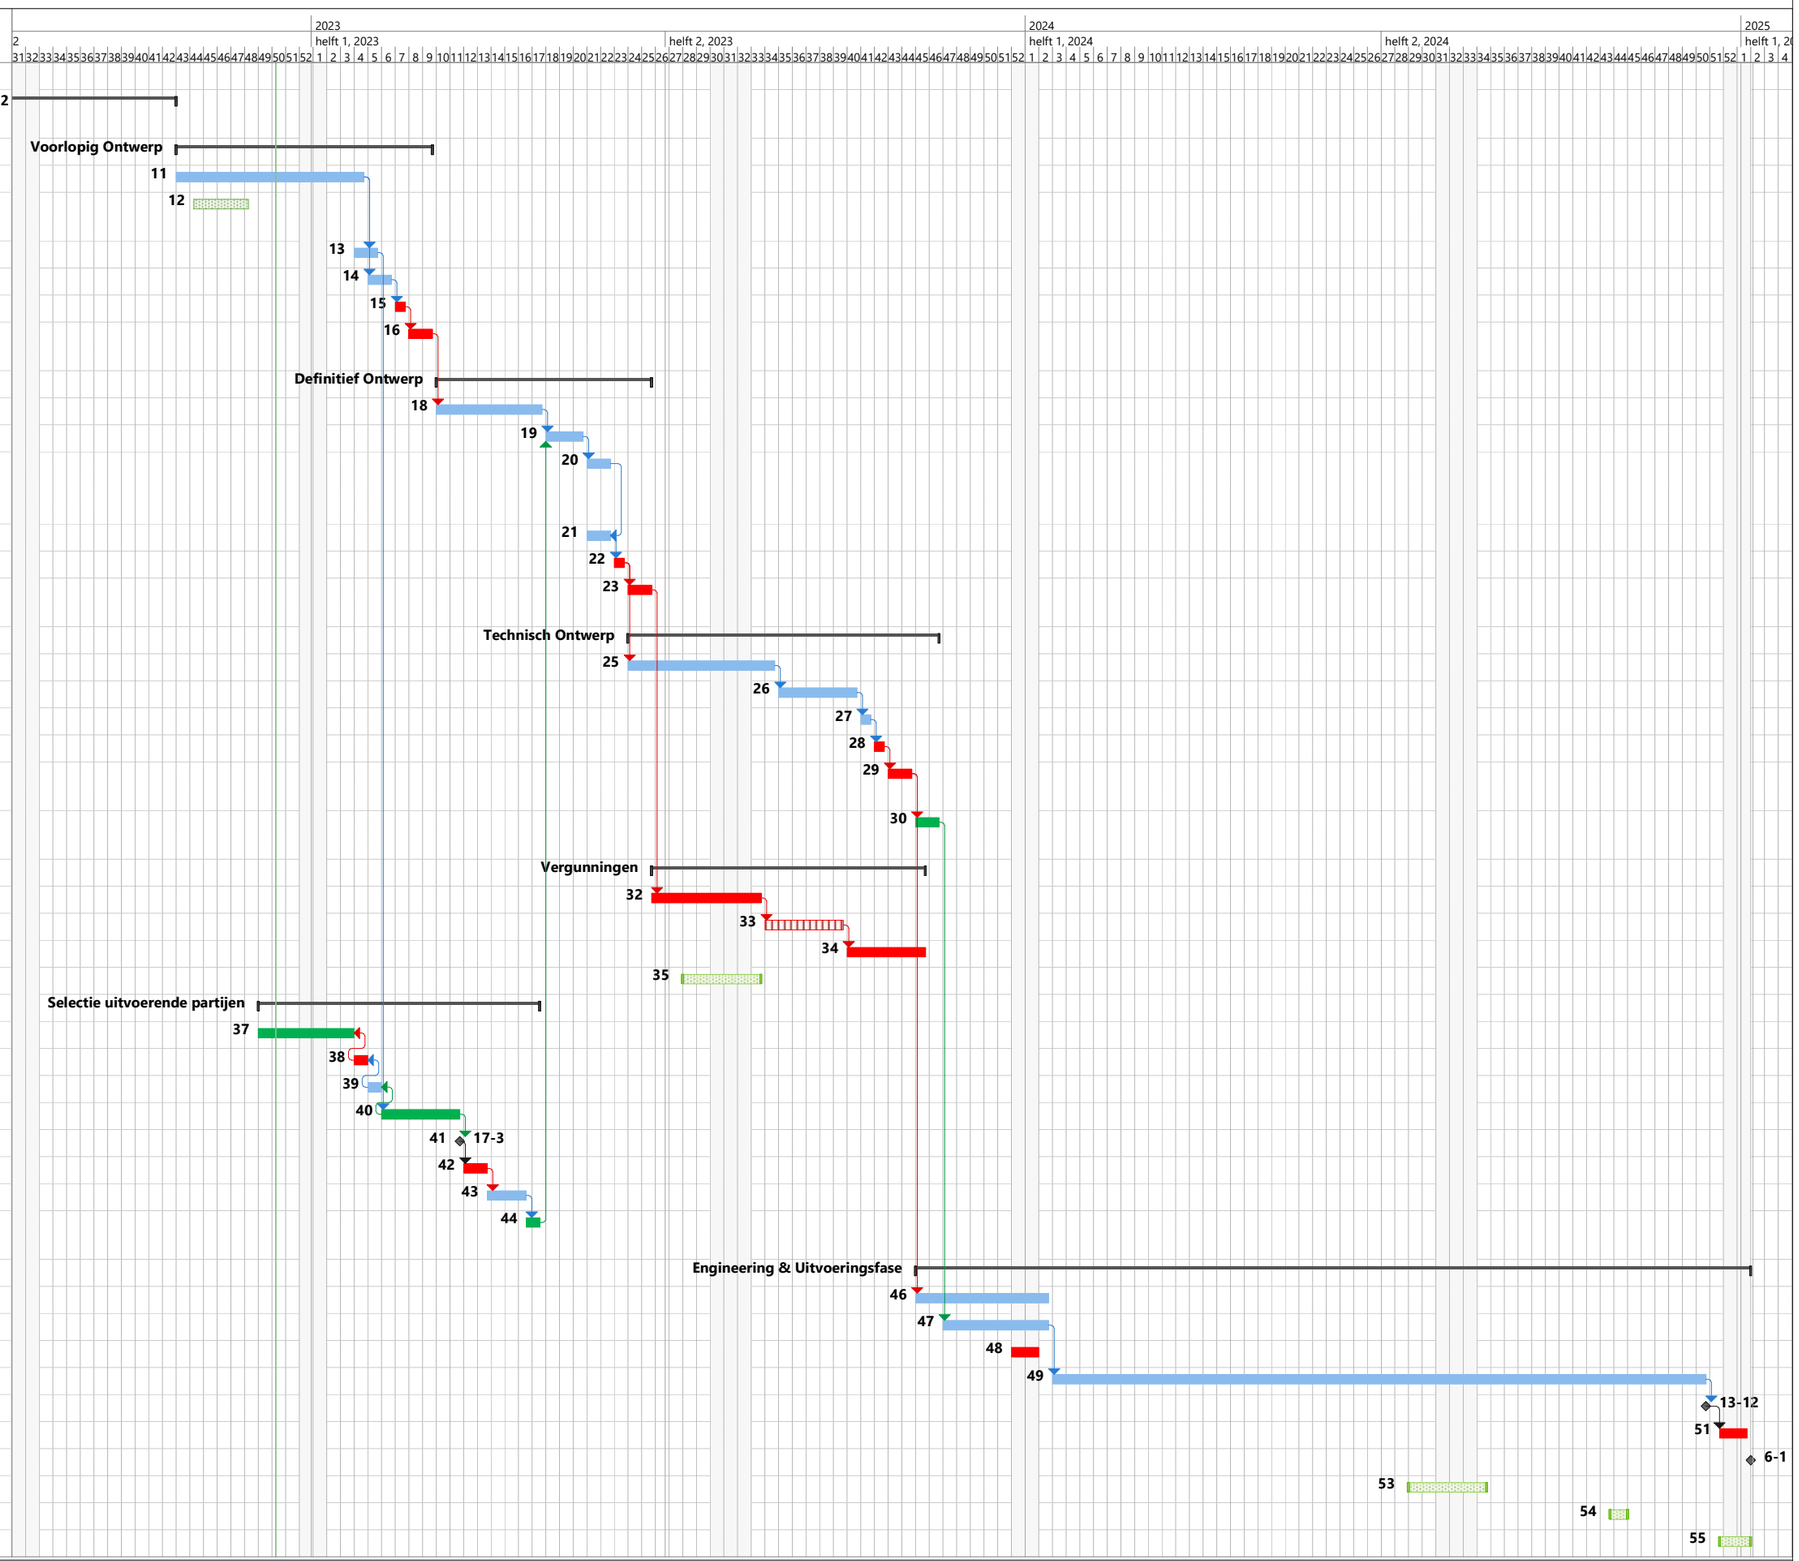
Id	Taa	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1		uitwerken Plan van Aanpak	8 wkn	maa 18-4-22	vri 10-6-22
2		**Selectie integraal ontwerpteam (Europees)**	**16 wkn**	**maa 13-6-22**	**maa 24-10-22**
10		**Voorlopig Ontwerp**	**17 wkn**	**maa 24-10-2**	**vri 3-3-23**
11		Voorlopig Ontwerp	12 wkn	maa 24-10-2	vri 27-1-23
12		Inspectie (geen ontwerpteamoverleggen)	4 wkn	woe 2-11-22	din 29-11-22
13		kostenraming	2 wkn	maa 23-1-23	vri 3-2-23
14		opstellen fasedocument	2 wkn	maa 30-1-23	vri 10-2-23
15		goedkeuring SG PCOU	1 wk	maa 13-2-23	vri 17-2-23
16		Goedkeuring fasedocument gemeente	2 wkn	maa 20-2-23	vri 3-3-23
17		**Definitief Ontwerp**	**16 wkn**	**maa 6-3-23**	**vri 23-6-23**
18		Definitief Ontwerp	8 wkn	maa 6-3-23	vri 28-4-23
19		kostenraming bouwteamaannemer	3 wkn	maa 1-5-23	vri 19-5-23
20		Definitief Ontwerp (verwerken optimalisaties/ terugkoppeling aannemer n.a.v. begroting)	2 wkn	maa 22-5-23	vri 2-6-23
21		opstellen fasedocument	2 wkn	maa 22-5-23	vri 2-6-23
22		goedkeuring SG PCOU	1 wk	maa 5-6-23	vri 9-6-23
23		Goedkeuring fasedocument gemeente	2 wkn	maa 12-6-23	vri 23-6-23
24		**Technisch Ontwerp**	**20 wkn**	**maa 12-6-23**	**vri 17-11-23**
25		Technisch Ontwerp	8 wkn	maa 12-6-23	vri 25-8-23
26		begroting aannemer	6 wkn	maa 28-8-23	vri 6-10-23
27		opstellen fasedocument	1 wk	maa 9-10-23	vri 13-10-23
28		goedkeuring SG PCOU	1 wk	maa 16-10-2	vri 20-10-23
29		Goedkeuring fasedocument gemeente	2 wkn	maa 23-10-23	vri 3-11-23
30		prijs- en contractvorming (aannemingsovereenkomst)	2 wkn	maa 6-11-23	vri 17-11-23
31		**Vergunningen**	**17 wkn**	**vri 23-6-23**	**vri 10-11-23**
32		Omgevingsvergunning	8 vwkn	vri 23-6-23	vri 18-8-23
33		mogelijke verleninging	6 wkn	maa 21-8-23	vri 29-9-23
34		bezwaar	6 wkn	maa 2-10-23	vri 10-11-23
35		zomervakantie 2023	5,63 vwkn	maa 10-7-23	vri 18-8-23
36		**Selectie uitvoerende partijen**	**18,8 wkn**	**maa 5-12-22**	**don 27-4-23**
37		selectiefase	5 wkn	maa 5-12-22	maa 23-1-23
38		besluitvorming	1 wk	maa 23-1-23	maa 30-1-23
39		bezwaar	1 wk	maa 30-1-23	maa 6-2-23
40		inschrijvingsfase	6 wkn	maa 6-2-23	vri 17-3-23
41		indienen stukken	0 dagen	vri 17-3-23	vri 17-3-23
42		presentatie + besluitvorming	2 wkn	maa 20-3-23	vri 31-3-23
43		bezwaar	20 vdagen	vri 31-3-23	don 20-4-23
44		opdrachtverstrekking (bouwteamovereenkomst)	1 wk	vri 21-4-23	don 27-4-23
45		**Engineering & Uitvoeringsfase**	**54 wkn**	**maa 6-11-23**	**maa 6-1-25**
46		UO-fase	8 wkn	maa 6-11-23	vri 12-1-24
47		werkvoorbereiding aannemer	6 wkn	maa 20-11-2	vri 12-1-24
48		uithuizing school	2 vwkn	maa 25-12-2	maa 8-1-24
49		uitvoering	45 wkn	maa 15-1-24	vri 13-12-24
50		oplevering	0 dagen	**vri 13-12-24**	vri 13-12-24
51		Inhuizen school	2 vwkn	**vri 20-12-24**	vri 3-1-25
52		ingebruikname	0 dagen	**maa 6-1-25**	maa 6-1-25
53		schoolvakantie 2024	5,63 vwkn	maa 15-7-24	vri 23-8-24
54		herfstvakantie 2024	1,2 vwkn	zat 26-10-24	zon 3-11-24
55		kerstvakantie 2024	2,2 vwkn	zat 21-12-24	zon 5-1-25
