Project: IKEC te Hoorn

Opgesteld door: R. Henzen
Datum: 12 oktober 2022
Gewijzigd:

CONCEPT
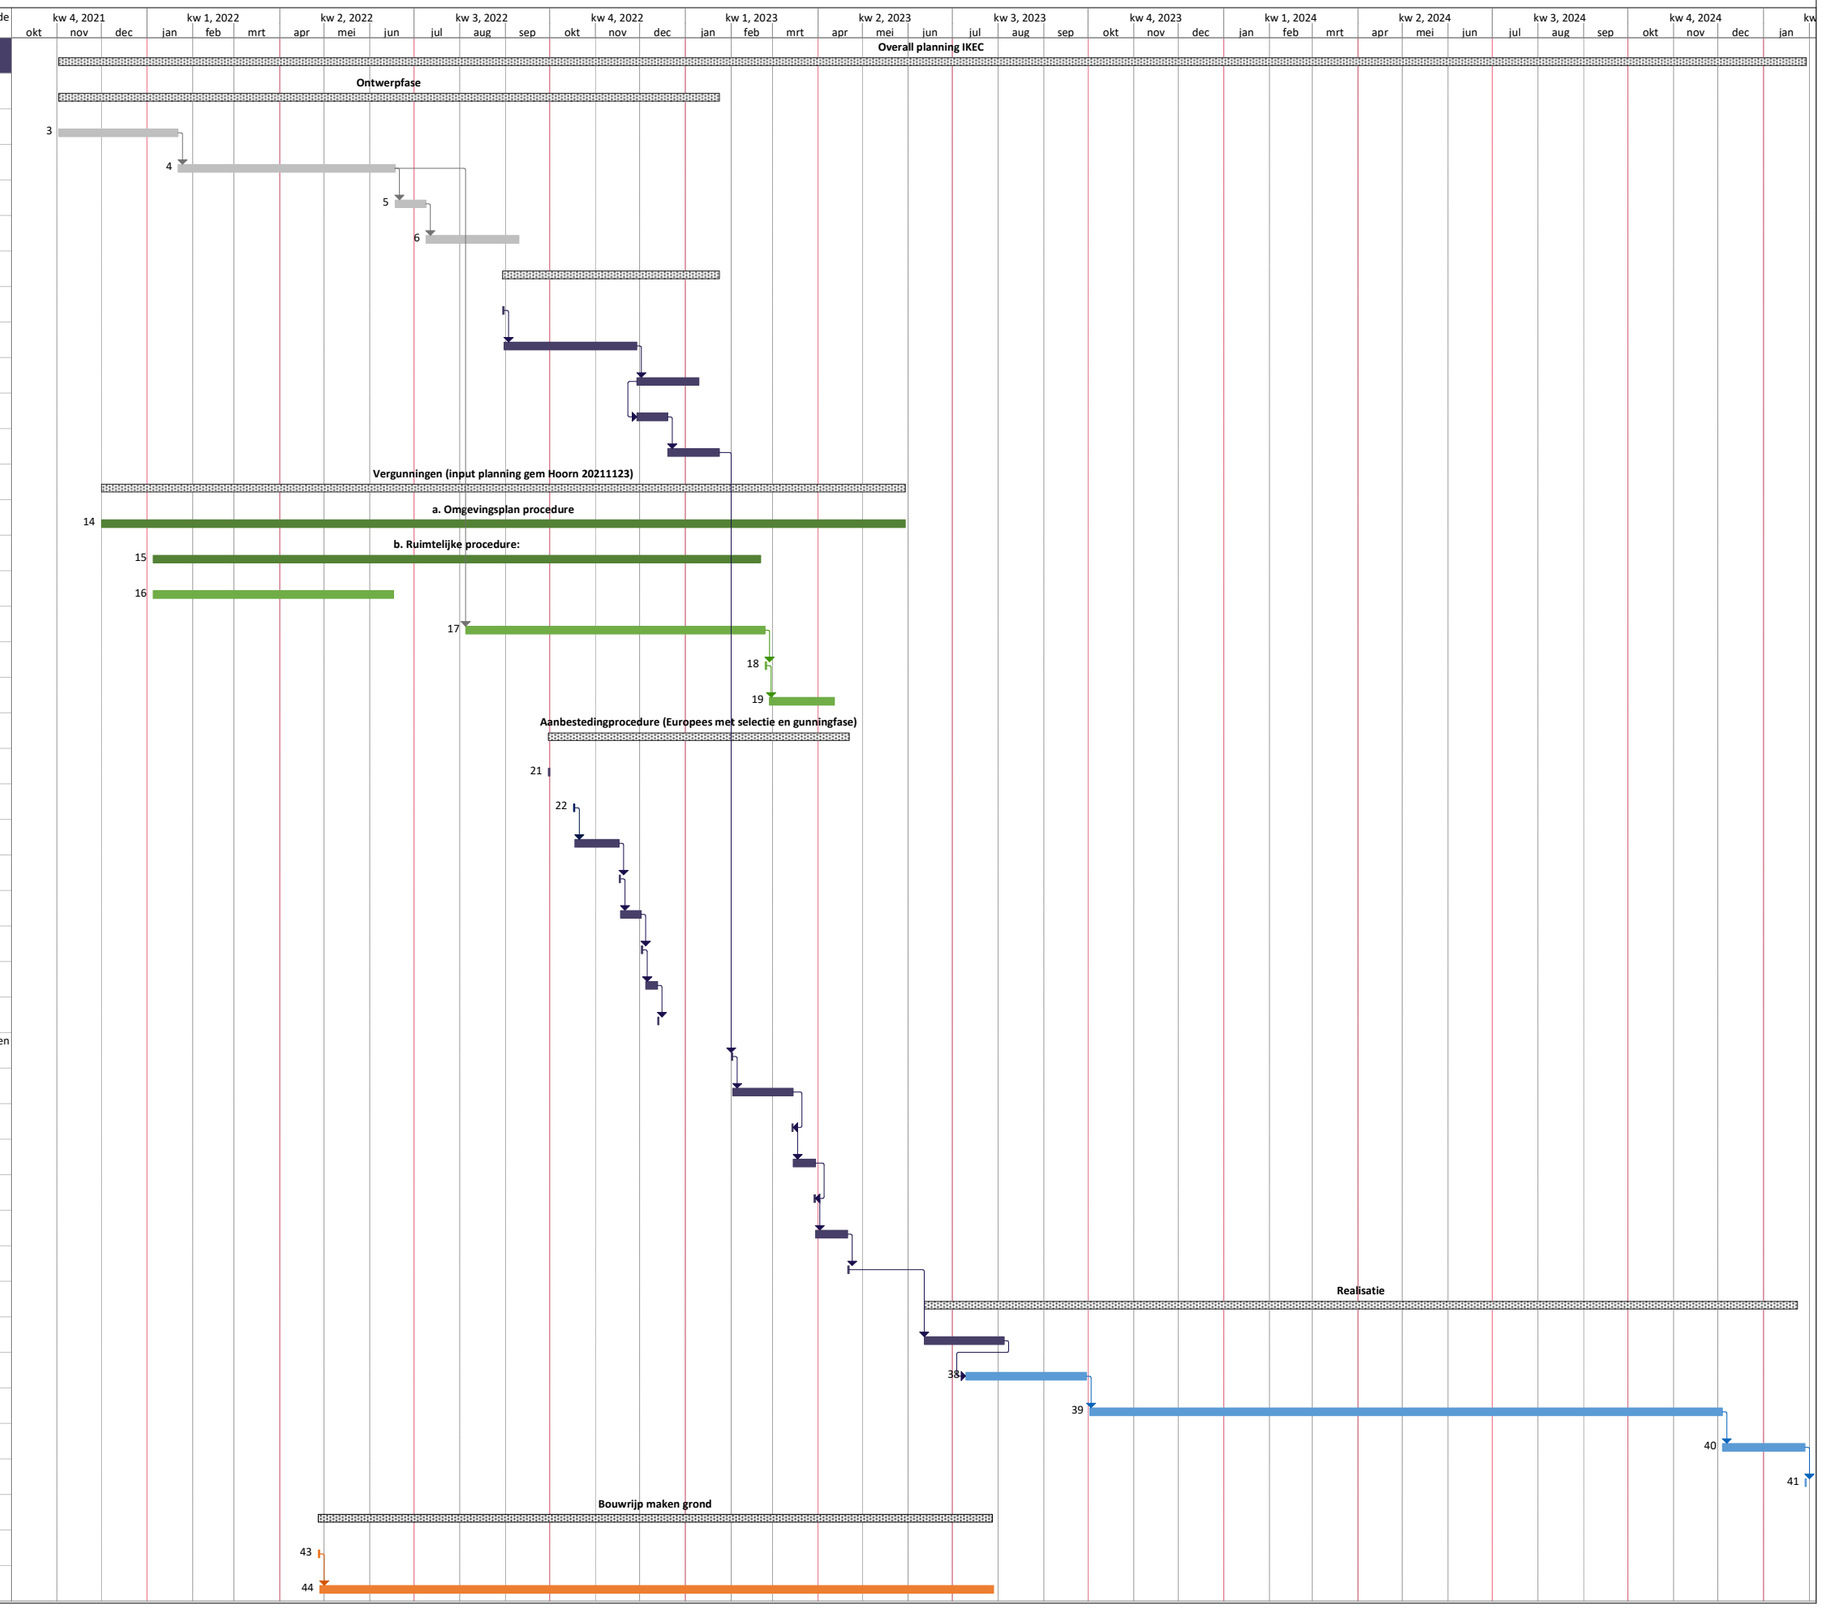
Id	Naam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**Overall planning IKEC**	**847,5 dagen?**	**maa 1-11-21**	**woe 29-1-25**	
2	**Ontwerpfase**	**320,5 dagen**	**maa 1-11-21**	**maa 23-1-23**	
3	VO++ fase	50 dagen	maa 1-11-21	vri 21-1-22	
4	DO/DO plus fase	105 dagen	vri 21-1-22	vri 17-6-22	3
5	Fasedocument	15 dagen	vri 17-6-22	vri 8-7-22	4
6	Goedkeuring fasedocument DO SG, gem Hoorn	45 dagen	vri 8-7-22	vri 9-9-22	5
7	**Bestek/TO-fase**	**95 dagen**	**din 30-8-22**	**maa 23-1-23**	
8	1e ontwerpteamoverleg	1 dag	din 30-8-22	din 30-8-22	
9	TO-fase	64 dagen	woe 31-8-22	maa 28-11-22	8
10	Besteksraming	20 dagen	din 29-11-22	maa 9-1-23	9
11	Fasedocument	15 dagen	din 29-11-22	maa 19-12-22	10GB
12	Goedkeuring fasedocument SG en gem Hoorn	15 dagen	din 20-12-22	maa 23-1-23	11
13	**Vergunningen (input planning gem Hoorn 20211123)**	**389 dagen**	**woe 1-12-21**	**maa 29-5-23**	
14	a. Omgevingsplan procedure	361 dagen	woe 1-12-21	maa 29-5-23	
15	b. Ruimtelijke procedure:	278 dagen	woe 5-1-22	maa 20-2-23	
16	onderbouwing en voorbereiding WABO	111 dagen	woe 5-1-22	don 16-6-22	
17	indienen/aanvraag uitgebreide WABO procedure	135 dagen	vri 5-8-22	don 23-2-23	4
18	vergunning verleend (uitgaande van geen bezwaren)	1 dag	vri 24-2-23	vri 24-2-23	17
19	bezwaarperiode 6 weken	30 dagen	maa 27-2-23	din 11-4-23	18
20	**Aanbestedingprocedure (Europees met selectie en gunningfase)**	**134 dagen**	**vri 30-9-22**	**vri 21-4-23**	
21	Startbijeenkomst	1 dag	vri 30-9-22	vri 30-9-22	
22	Publicatie selectiefase	1 dag	maa 17-10-22	maa 17-10-22	
23	Aanmeldingstermijn	22 dagen	din 18-10-22	woe 16-11-22	22
24	Aanmelding	1 dag	don 17-11-22	don 17-11-22	23
25	Beoordeling	10 dagen	vri 18-11-22	don 1-12-22	24
26	Voorlopige selectie	1 dag	vri 2-12-22	vri 2-12-22	25
27	Stand still termijn (10 kalenderdagen)	6 dagen	maa 5-12-22	maa 12-12-22	26
28	Definitieve selectie	1 dag	din 13-12-22	din 13-12-22	27
29	Versturen uitvraag ikv Gunningsfase	1 dag	woe 1-2-23	woe 1-2-23	12BE+6 dagen
30	Inschrijvingstermijn	29 dagen	don 2-2-23	din 14-3-23	29
31	Ontvangst inschrijvingen	1 dag	din 14-3-23	din 14-3-23	30GE
32	Beoordeling inschrijvingen	9 dagen	woe 15-3-23	woe 29-3-23	31
33	Voorlopige gunningsbeslissing	1 dag	woe 29-3-23	woe 29-3-23	32GE
34	Alcatal termijn (20 kalenderdagen)	16 dagen	don 30-3-23	don 20-4-23	33
35	Definitieve gunning	1 dag	vri 21-4-23	vri 21-4-23	34
36	**Realisatie**	**304 dagen?**	**maa 12-6-23**	**don 23-1-25**	
37	Uitwerken werktekeningen en goedkeuringstermijn	40 dagen	maa 12-6-23	vri 4-8-23	35
38	bouwvoorbereiding	60 dagen	maa 10-7-23	vri 29-9-23	37BE-20 dagen
39	bouw	295 dagen	maa 2-10-23	din 3-12-24	38
40	Inhuizen	30 dagen	woe 4-12-24	din 28-1-25	39
41	Ingebruikname	1 dag	woe 29-1-25	woe 29-1-25	40
42	**Bouwrijp maken grond**	**310 dagen?**	**woe 27-4-22**	**don 27-7-23**	
43	overdracht grond aan gemeente	1 dag	woe 27-4-22	woe 27-4-22	
44	bestek, aanbesteding en bouwrijp maken	310 dagen	don 28-4-22	vri 28-7-23	43
