Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
0		Unilocatie Grevenbicht-Obbicht	192 wkn	maa 4-4-22	vri 27-3-26		
1		1 Structuur ontwerpfase	8,2 wkn	maa 4-4-22	vri 3-6-22		
2		1.1 Integraal structuurontwerp	6,4 wkn	maa 4-4-22	vri 20-5-22		
3		1.2 Opstellen fasedocument structuurontwerp	0,6 wkn	maa 23-5-22	woe 25-5-22	2	
4		1.3 Vaststellen fasedocument structuurontwerp	1 wk	maa 30-5-22	vri 3-6-22	3	
5		2 Voorlopig ontwerpfase	38,8 wkn	din 7-6-22	vri 31-3-23		
6		2.1 Integraal voorlopig ontwerp	15,8 wkn	din 7-6-22	vri 14-10-22	4	
7		2.2 Toets voorlopig ontwerp aan PVE en budget	1 wk	maa 17-10-22	vri 21-10-22	6	
8		2.3 Opstellen fasedocument voorlopig ontwerp	1 wk	maa 24-10-22	vri 28-10-22	7	
9		2.4 Vaststellen fasedocument voorlopig ontwerp	1 wk	maa 31-10-22	vri 4-11-22	8	
10		2.5 Informeren gemeenteraad bouwkostenraming	4 wkn	maa 7-11-22	vri 2-12-22	9	
11		2.6 Optimalisatieronde	14 wkn	maa 5-12-22	vri 17-3-23	10	
12		2.7 Goedkeuring wethouder	1 wk	maa 20-3-23	vri 24-3-23	11	
13		2.8 Vaststellen aangepast voorlopig ontwerp met gebruikers	1 wk	maa 27-3-23	vri 31-3-23	12	
14		3 Definitief ontwerp gebouw	14 wkn	maa 3-4-23	vri 14-7-23		
15		3.1 Integraal definitief ontwerp	10 wkn	maa 3-4-23	vri 16-6-23	13	
16		3.2 Toets definitief ontwerp aan PVE en budget	1 wk	maa 19-6-23	vri 23-6-23	15	
17		3.3 Opstellen fasedocument definitief ontwerp	1 wk	maa 26-6-23	vri 30-6-23	16	
18		3.4 Vaststellen fasedocument definitief ontwerp	2 wkn	maa 3-7-23	vri 14-7-23	17	
19		4 Technisch ontwerp gebouw	19 wkn	maa 17-7-23	vri 15-12-23		
20		4.1 Opstellen technisch ontwerp	12 wkn	maa 17-7-23	vri 27-10-23	18	
21		4.2 Goedkeuring ARK	2 wkn	maa 30-10-23	vri 10-11-23	20	
22		4.3 Afronden technisch ontwerp	2 wkn	maa 13-11-23	vri 24-11-23	21	
23		4.4 Vaststellen technisch ontwerp	2 wkn	maa 4-12-23	vri 15-12-23	22BE+1 wk	
24		5 Definitief en technisch ontwerp terrein	22 wkn	maa 23-10-23	vri 5-4-24		
25		5.1 Vaststellen uitgangspunten	2 wkn	maa 23-10-23	vri 3-11-23		
26		5.2 Opstellen VO+	4 wkn	maa 6-11-23	vri 1-12-23	25	
27		5.3 Goedkeuring VO+	2 wkn	maa 4-12-23	vri 15-12-23	26	
28		5.4 Opstellen DO/BO incl. RAW-be	12 wkn	maa 18-12-23	vri 22-3-24	27	
29		5.5 Goedkeuring BO en bestek	2 wkn	maa 25-3-24	vri 5-4-24	28	
30		6 Omgevingsvergunning	24 wkn	maa 13-11-23	vri 10-5-24		
31		6.1 Voorbereiden aanvraag omgevingsvergunning	4 wkn	maa 13-11-23	vri 8-12-23	21	
32		6.2 Indienen aanvraag omgevingsvergunning	1 wk	maa 18-12-23	vri 22-12-23	31;23	
33		6.3 Behandeling aanvraag omgevingsvergunning (incl. verlenging termijn)	14 wkn	maa 25-12-23	vri 29-3-24	32	
34		6.4 Verlening omgevingsvergunning	0 wkn	vri 29-3-24	vri 29-3-24	33	
35		6.5 Bezwaartermijn omgevingsvergunning	6 wkn	maa 1-4-24	vri 10-5-24	34	
36		6.6 Omgevingsvergunning onherroepelijk (geen bezwaar)	0 wkn	vri 10-5-24	vri 10-5-24	35	
37		7 Aanbesteding hoofdaannemer (openbare procedure)	23 wkn	maa 30-10-23	vri 19-4-24		
38		7.1 Opstellen aanbestedingsdocumenten	7 wkn	maa 30-10-23	vri 15-12-23	20	
39		7.2 Aanbestedingsstrategie agenderen voor directie	0 wkn	vri 15-12-23	vri 15-12-23	38	
40		7.3 Goedkeuring door directie	1 dag	woe 20-12-23	woe 20-12-23	39;23	
41		7.4 Bespreking collegevoorstel 3PHO	1 dag	maa 8-1-24	maa 8-1-24	40	
42		7.5 Aanbestedingsstrategie agenderen voor college	1 dag	woe 10-1-24	woe 10-1-24	41	
43		7.6 Behandeling door college	1 dag	din 16-1-24	din 16-1-24	42	
44		7.7 Eventuele tweede behandeling door college	1 dag	din 23-1-24	din 23-1-24	43	
45		7.8 Publicatie inschrijvingsleidraad	0 dagen	don 22-2-24	don 22-2-24	38;23;44	
46		7.9 Inschrijftermijn	4 wkn	don 22-2-24	woe 20-3-24	45	
47		7.10 Beoordeling inschrijvingen	1 wk	don 21-3-24	woe 27-3-24	46	
48		7.11 Voorlopige gunning	1 dag	don 28-3-24	don 28-3-24	47	
49		7.12 Standstill termijn	14 dagen	vri 29-3-24	woe 17-4-24	48	
50		7.13 Definitieve gunning	2 dagen	don 18-4-24	vri 19-4-24	49	
51		8 Aanbesteding W- en E-installaties (meervoudig onderhands)	16 wkn	maa 8-1-24	vri 26-4-24		
52		8.1 Opstellen offerteaanvragen	6 wkn	maa 8-1-24	vri 16-2-24	23	
53		8.2 Versturen offerteaanvragen	0 wkn	vri 16-2-24	vri 16-2-24	52	
54		8.3 Inschrijftermijn	5 wkn	maa 19-2-24	vri 22-3-24	53	
55		8.4 Beoordeling offertes	2 wkn	maa 25-3-24	vri 5-4-24	54	
56		8.5 Voorlopige gunning	0 wkn	vri 5-4-24	vri 5-4-24	55;48	
57		8.6 Standstill termijn	3 wkn	maa 8-4-24	vri 26-4-24	56	
58		8.7 Definitieve gunning	0 wkn	vri 26-4-24	vri 26-4-24	57	
59		9 Aanbesteding infra (meervoudig onderhands)	24 wkn	maa 18-12-23	vri 14-6-24		
60		9.1 Opstellen offerteaanvraag	6 wkn	maa 18-12-23	vri 9-2-24	23	
61		9.2 Versturen offerteaanvragen	0 wkn	vri 5-4-24	vri 5-4-24	29;48;60	
62		9.3 Inschrijftermijn	5 wkn	maa 8-4-24	vri 10-5-24	61	
63		9.4 Beoordeling offertes	2 wkn	maa 13-5-24	vri 24-5-24	62	
64		9.5 Voorlopige gunning	0 wkn	vri 24-5-24	vri 24-5-24	63	
65		9.6 Standstill termijn	3 wkn	maa 27-5-24	vri 14-6-24	64	
66		9.7 Definitieve gunning	0 wkn	vri 14-6-24	vri 14-6-24	65	
67		10 Realisatie fase 1	54 wkn	maa 22-4-24	vri 6-6-25		
68		10.1 Bouwvoorbereiding	6 wkn	maa 22-4-24	vri 31-5-24	34;50	
69		10.2 Realisatie ruwbouw	20 wkn	maa 3-6-24	vri 8-11-24	68	
70		10.3 Realisatie afbouw	26 wkn	maa 11-11-24	vri 23-5-25	69	
71		10.4 Realisatie infra	26 wkn	maa 11-11-24	vri 23-5-25	69	
72		10.5 Oplevering	2 wkn	maa 26-5-25	vri 6-6-25	70;71	
73		11 Realisatie fase 2	44 wkn	maa 26-5-25	vri 27-3-26		
74		11.1 Bouwvoorbereiding	6 wkn	maa 26-5-25	vri 4-7-25	50BE+52 wkn	
75		11.2 Realisatie ruwbouw	16 wkn	maa 7-7-25	vri 24-10-25	74	
76		11.3 Realisatie afbouw	20 wkn	maa 27-10-25	vri 13-3-26	75	
77		11.4 Realisatie infra	16 wkn	maa 7-7-25	vri 24-10-25	74	
78		11.5 Oplevering	2 wkn	maa 16-3-26	vri 27-3-26	76;77	

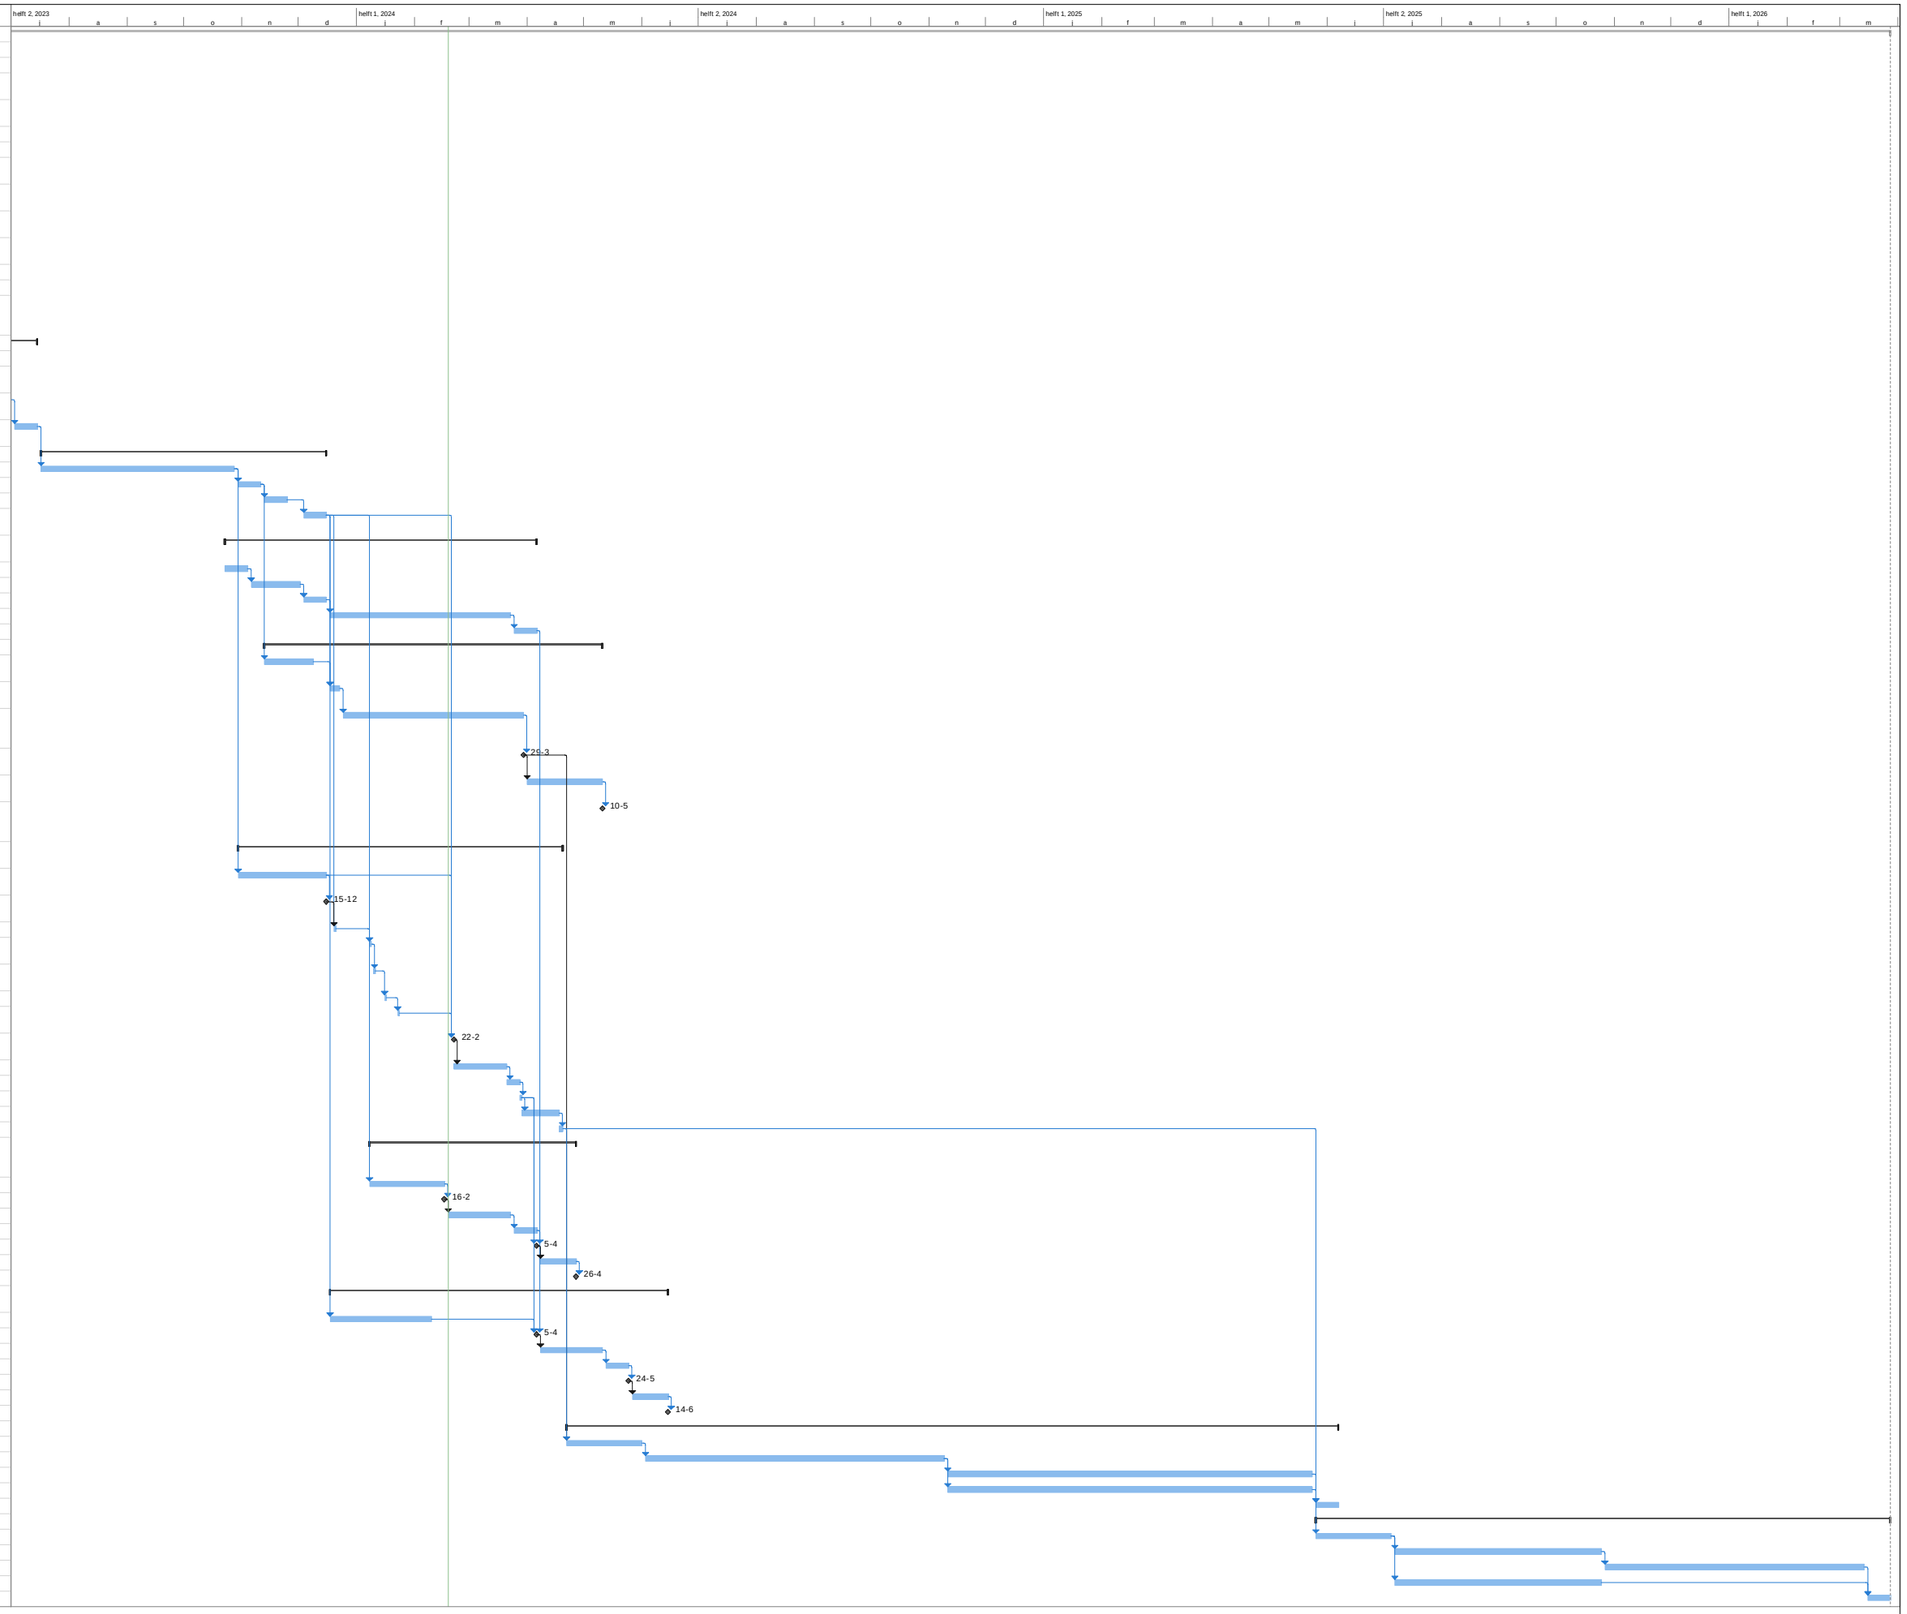

Project: Unilocatie Grevenbicht
Datum: maa 19-2-24

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline | Voortgang | Voortgang, handmatig
