De Groene Tuinen

res & smit

Id	Taak	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
0		**De Groene Tuinen**	**1344 dagen**	**woe 24-3-21**	**din 21-7-26**
1		**Vergaderingen**	**675 dagen**	**woe 24-3-21**	**don 28-12-23**
2		**RvC**	**484 dagen**	**maa 29-11-21**	**maa 11-12-23**
16		**MT**	**430 dagen**	**woe 26-5-21**	**woe 15-2-23**
44		**Projectoverleg**	**330 dagen**	**din 31-8-21**	**din 20-12-22**
80		**KGB bijeenkomst**	**160 dagen**	**don 14-10-21**	**woe 8-6-22**
86		**Initiatieffase**	**60 dagen**	**din 6-7-21**	**maa 27-9-21**
102		**Haalbaarheidsfase**	**399 dagen**	**vri 8-10-21**	**don 18-5-23**
146		**Ontwerpfase**	**938 dagen**	**don 27-10-22**	**din 21-7-26**
147		Opstellen marktconsultatiedocument	7 wkn	don 27-10-22	woe 14-12-22
148		Opstellen aanbestedingsstukken (overeenkomst en leidraad)	15 wkn	don 27-10-22	don 23-2-23
149		Afronden marktconsultatiedocument	8 wkn	don 15-12-22	don 23-2-23
150		Versturen marktconsultatiedocument	0 dagen	woe 1-3-23	woe 1-3-23
151		Marktconsultatie	13 dagen	woe 1-3-23	vri 17-3-23
152		Voorbereiding publicatie finale aanbestedingsstukken (interne toetsing)	5 wkn	maa 20-3-23	vri 21-4-23
153		Publicatie selectiefase (op TenderNED)	4 wkn	woe 10-5-23	din 6-6-23
154		Selectie partijen	2 wkn	woe 7-6-23	din 20-6-23
155		Gunningsfase	8 wkn	woe 21-6-23	din 19-9-23
156		Beoordeling en voorbereiden contractvorming	6 wkn	woe 20-9-23	din 31-10-23
157		Contractvorming naar MT	8 wkn	woe 1-11-23	din 26-12-23
158		**Renovatie**	**416 dagen**	**woe 27-12-23**	**woe 30-7-25**
159		Voorbereiding	10 wkn	woe 27-12-23	din 5-3-24
160		Technisch ontwerp	6 wkn	woe 6-3-24	din 16-4-24
161		Voorbereiden redelijk voorstel	2 wkn	woe 27-3-24	din 9-4-24
162		70% akkoord	6 wkn	woe 10-4-24	din 21-5-24
163		Opstellen uitvoeringsbesluit	3 wkn	woe 22-5-24	din 11-6-24
164		Review manager vastgoed	2 dagen	woe 12-6-24	don 13-6-24
165		Review medelezers	5 dagen	vri 14-6-24	don 20-6-24
166		Terugkoppeling intern + bewoners	3 dagen	vri 21-6-24	din 25-6-24
167		Finaliseren uitvoeringsbesluit	2 dagen	woe 26-6-24	don 27-6-24
168		Documenten gereed MT	1 dag	vri 28-6-24	vri 28-6-24
169		Terugkoppeling MT besluit/ afronding	1 dag	maa 1-7-24	maa 1-7-24
170		Documenten voorbereiden RvC incl. auditcommissie	4 wkn	din 2-7-24	maa 29-7-24
171		Uitvoeringsbesluit RvC	1 dag	din 30-7-24	din 30-7-24
172		Ontheffing Wet Natuurbescherming	1 dag	woe 31-7-24	woe 31-7-24
173		Realisatie	52 wkn	don 1-8-24	woe 30-7-25
174		**Herstructuering**	**936 dagen**	**maa 31-10-22**	**din 21-7-26**
175		Stedenbouwkundig proces	58 wkn	maa 31-10-22	maa 29-1-24
176		Bestemmingsplanprocedure	36 wkn	din 30-1-24	maa 7-10-24
177		Ontwerpfase	26 wkn	din 30-1-24	maa 29-7-24
178		Technisch ontwerp	16 wkn	din 18-6-24	maa 7-10-24
179		Vergunningen	20 wkn	din 30-7-24	maa 16-12-24
180		Opstellen uitvoeringsbesluit	4 wkn	din 8-10-24	maa 4-11-24
181		Review manager vastgoed	2 dagen	din 5-11-24	woe 6-11-24
182		Review medelezers	5 dagen	don 7-11-24	woe 13-11-24
183		Terugkoppeling intern + bewoners	3 dagen	don 14-11-24	maa 18-11-24
184		Finaliseren uitvoeringsbesluit	2 dagen	din 19-11-24	woe 20-11-24
185		Documenten gereed MT	1 dag	don 21-11-24	don 21-11-24
186		Terugkoppeling MT besluit/ afronding	1 dag	vri 22-11-24	vri 22-11-24
187		Documenten voorbereiden RvC incl. auditcommissie	4 wkn	maa 25-11-24	vri 20-12-24
188		Uitvoeringsbesluit RvC	1 dag	maa 23-12-24	maa 23-12-24
189		Ontheffing Wet Natuurbescherming	1 dag	din 24-12-24	din 24-12-24
190		Realisatie	82 wkn	woe 25-12-24	din 21-7-26

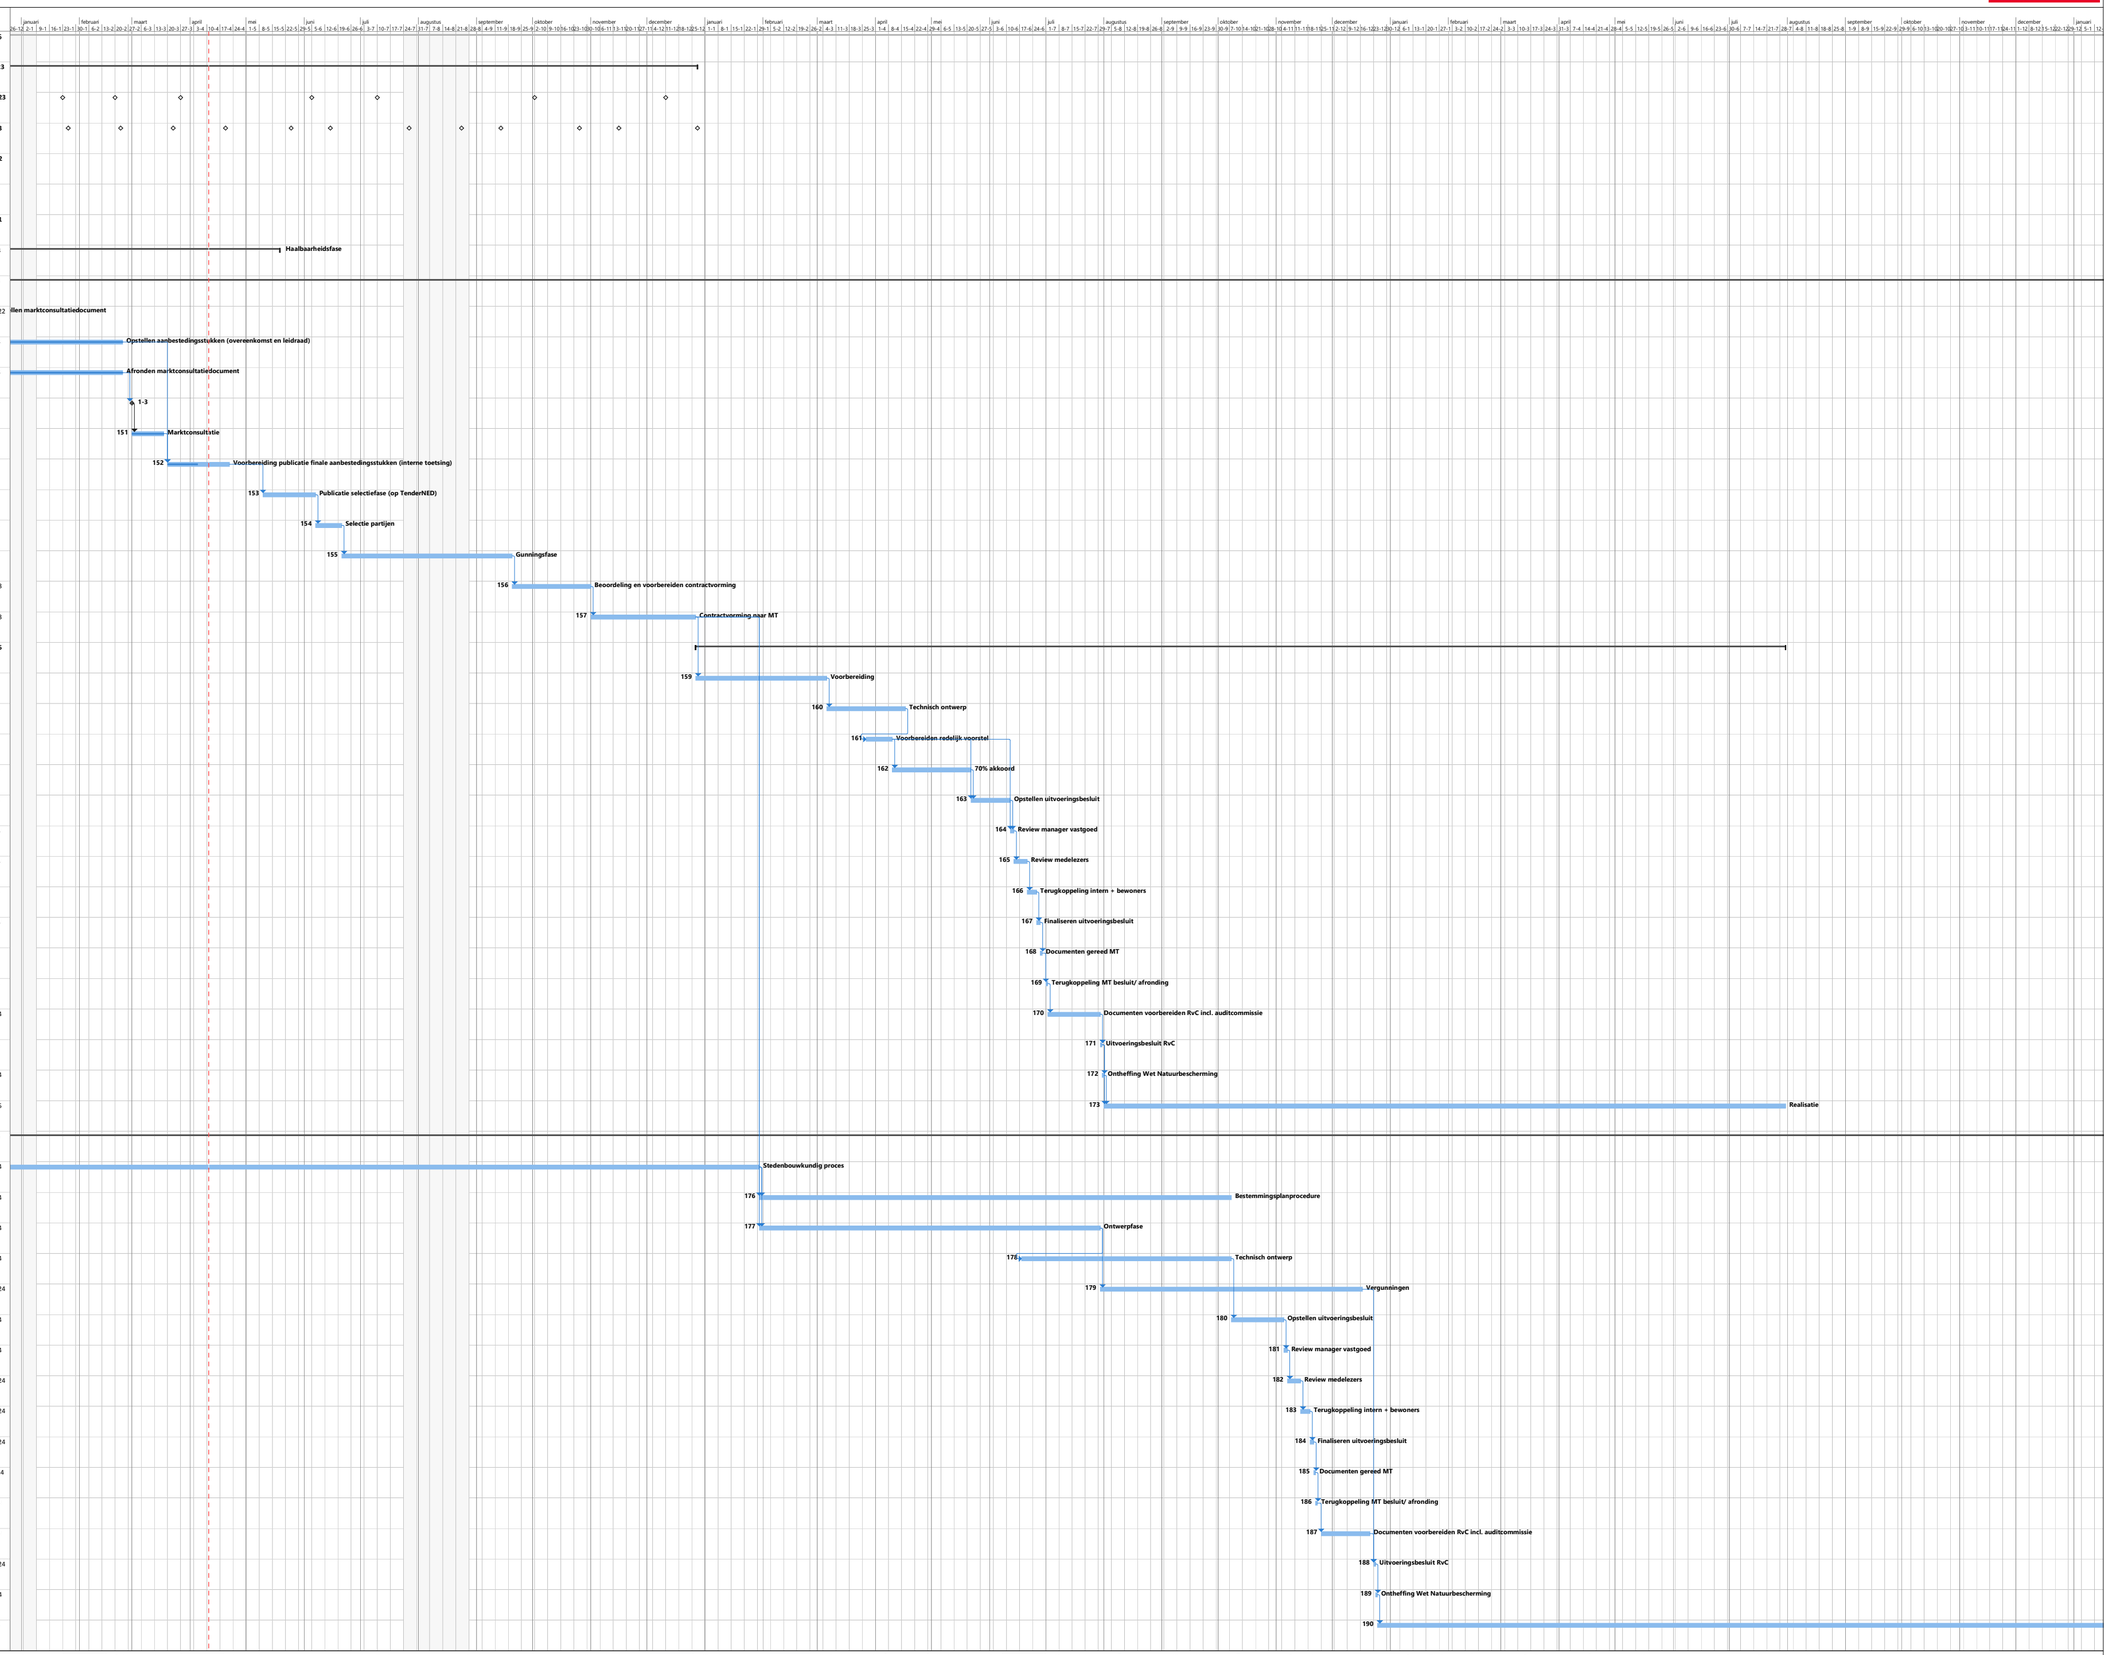

Taak | Splitsing | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Inactieve taken | Inactieve mijlpaal | Inactieve samenvatting | Handmatig taak | Alleen duur | Handmatige samenvatting | Handmatige samenvatting | Alleen begindatum | Alleen einddatum | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline | Voortgang | Voortgang, handmatig
