Planning - PKR in relatie tot Plateauplanning UAM2.0

Stap	Substap	Trekker (Naam)
0. Voorverkenning van PKR in AM2.0		Petra
	0a. Gesprekken met ca. 30 experts	Sjharina
	0b. Opstellen en akkoorderen PVA	Roland B
	0c. Opstellen en akkoorderen Inkoopplannen	Petra
1. Verdiepingsslag informatie en bronnen in de IH-rapportage		Petra
	1a. Blauwe P info aangevuld in de PKR-matrix	Roland B
	1b. Opzet regionale samenwerking aan casussen	Petra
	1c. Opzet samenwerking met AM2.0 experts	Petra
2. De PKR-matrix uitvullen met RWS-experts levert		Petra
	2a. Paarse K info aangevuld in de PKR-matrix	Markt
	2b. Voorzet gebruik PKR-vuistregels met AM2.0 experts	Markt
3. Oefenen met casuistiek in de regio		Petra
	3a. Regionale casussen uitgewerkt	Markt
	3b. Advies oppakken regiorol NWM	Markt
4. Advies over het verrijken van de IH-rapportage		Petra
	4a. Uitgewerkte PKR-vuistregels en matrix	Markt
	4b. Advies verrijken IH-rapportage	Markt
5. Rapportering aan projectmanagement levert		Petra
	5a. Voortgangrapportage evaluatie	Markt
	5b. Uitgewerkt pva in ppt en Word voor 2025-26	Markt
6. Go/no-go besluit aanpak 2025-26 --> MIJLPAAL 1		Sjharina
7. Finetunen van informatie		Petra
8. Bijstellen van planning 2026 met Go/no-go besluit --> MIJLPAAL 2		Sjahrina
9. In gebruik nemen van vuistregels. Training en begeleiding dienstonderdelen		Petra
10. Afronding en advies follow up --> MIJLPAAL 3		Sjahrina

Actie UVA 2024	Activiteit	Trekker (Naam)
3.	**Beleid & Strategie**	
3.3.4	Leren toepassen BWM 1.0 op alle drie netwerken, te beginnen bij enkele schakels WNZ en MN	Roland vL
3.3.5	Informatiegap bepalen met ook op toepassing BWM in programmeerproces o.b.v. leren bij te beginnen WNZ en MN	?
3.3.6	Vormgeven opleiding risicomanagement o.b.v. pilot bij WNZ gericht op "train de trainer" (relatie 3.3.4)	Ilse H
9.	**Monitoren & Analyseren**	
9.2	Huidige monitoring en analyse meer in samenhang brengen (kleine verbeterstappen bijv afstemmen hoofdboodschappen Svdl, SLA, Programmering en VenR)	Marieke H
9.3	Impact analyse (monitoorbaarheid) nieuwe prestatie afspraken PINs en TINs - Rapportage(lijnen) in overeenstemming met nieuwe prestatie afspraken	Marieke H
9.8	Uitwerking en implementatie Netwerkmonitoring in operationeel en strategisch AM: input voor PRA bij NWSP en Programmering	?

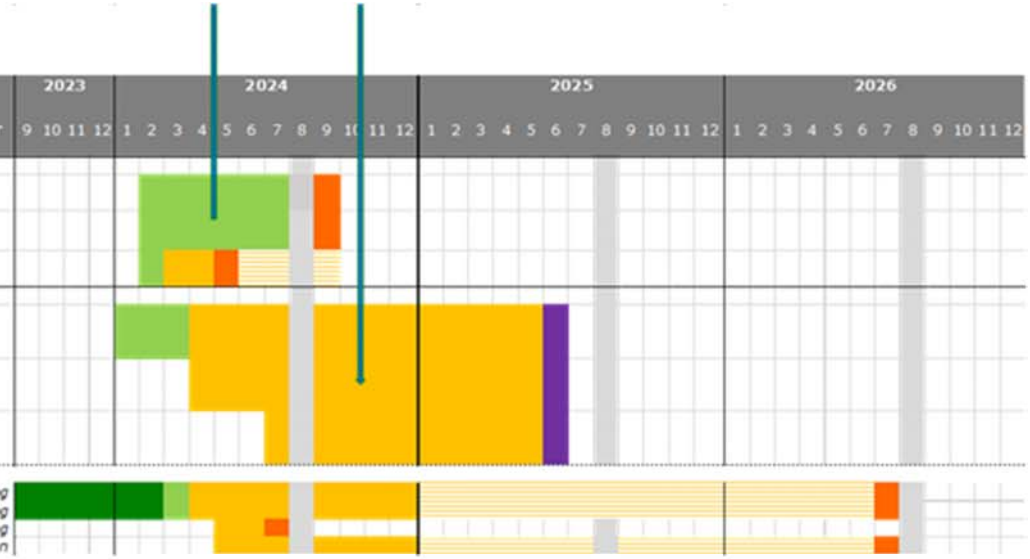

Legenda

- Gedaan
- In uitvoering
- In voorbereiding
- Voorgenomen continuering (te specificeren in update van PVA)
- Afronden
- Einde overzicht Uitvoeringsagenda
- Vakantie

M1 Mijlpaal 1: bijgesteld PVA voor 2025-26, verrijkte PKR-matrix
M2 Mijlpaal 2: bijgesteld PVA 2026, verrijkte PKR-matrix, helder uitrol voorstel
M3 Mijlpaal 3: advies aan LON over uitrol en vervolg

Toont afhankelijkheid van eerdere stap ervoor

Toont verbinding met acties vanuit de plateauplanning

Besteedde opdracht in markt

Product A t/m F — Product in de vraagspecificatie van de besteedde opdracht
