101110 MFA Kats

Projectleider: Patrick Harting

Begindatum: ma. 1 jul 2024

weeknummer

TAAK	VOORTGANG	START	EINDE	gereed	DAGEN
Programma van eisen	100%	1-07-24	31-08-24		62
Wensen stakeholders ophalen	100%	1-07-24	4-07-24		4
Concept PvE opstellen	100%	1-07-24	21-07-24		21
Concept doorspreken met projectteam en gemeente	100%	21-07-24	28-07-24		8
Definitief PvE opstellen	100%	29-07-24	31-08-24		35
Voorbereiding aanbesteding	100%	1-09-24	3-02-25		156
Bepalen inhoud aanbestedingsdocumenten	100%	1-09-24	21-10-24		51
Aanbestedingstukken schrijven en gereed maken	100%	21-10-24	20-11-24		31
Controle- en correctieronde projectteam en gemeente	100%	30-01-25	31-01-25		2
Aanpassen aanbestedingstukken	100%	31-01-25	3-02-25		4
Selectieprocedure	10%	3-02-25	10-03-25		
Aankondiging op TenderNed	100%	3-02-25	3-02-25		1
1 op 1 gesprekken	0%	26-02-25	26-02-25		1
Nota van inlichtingen	0%	4-03-25	6-03-25		3
Indiening van de inschrijving	0%	17-03-25	17-03-25		1
Presentatie van deinschrijving aan het projectteam en de gemeente	0%	26-03-25	26-03-25		1
Beoordeling en selectie partijen	0%	26-03-25	2-04-25		8
Bekendmaken gunningsbesluit	0%	2-04-25	2-04-25		1
Contractvorming	0%	3-04-25	17-04-25		15
Opstellen en afstemming contract met winnende partij	0%	3-04-25	11-04-25		9
Ondertekening contract met geselecteerde partij	0%	24-04-25	24-04-25		1
Voorontwerp (VO)		18-04-25	18-04-25		1
Bouwkundig	0%	1-05-25	31-07-25		92
Installaties	0%	1-07-25	31-07-25		31
Constructies	0%	1-07-25	31-07-25		31
Bouwfysica	0%	1-07-25	31-07-25		31
Definitief ontwerp (DO)	0%	1-09-25	24-12-25		115
Vergunningsaanvraag	0%	1-02-26	31-03-26		59
Bouwvoorbereiding (TO)	0%	1-04-26	30-06-26		91
Aanbesteding aannemer	0%	1-07-26	29-09-26		91
Uitvoeringsontwerop (UO)	0%	30-09-26	30-12-26		92
Uitvoering					
Bouw	0%	31-12-26	31-12-27		366

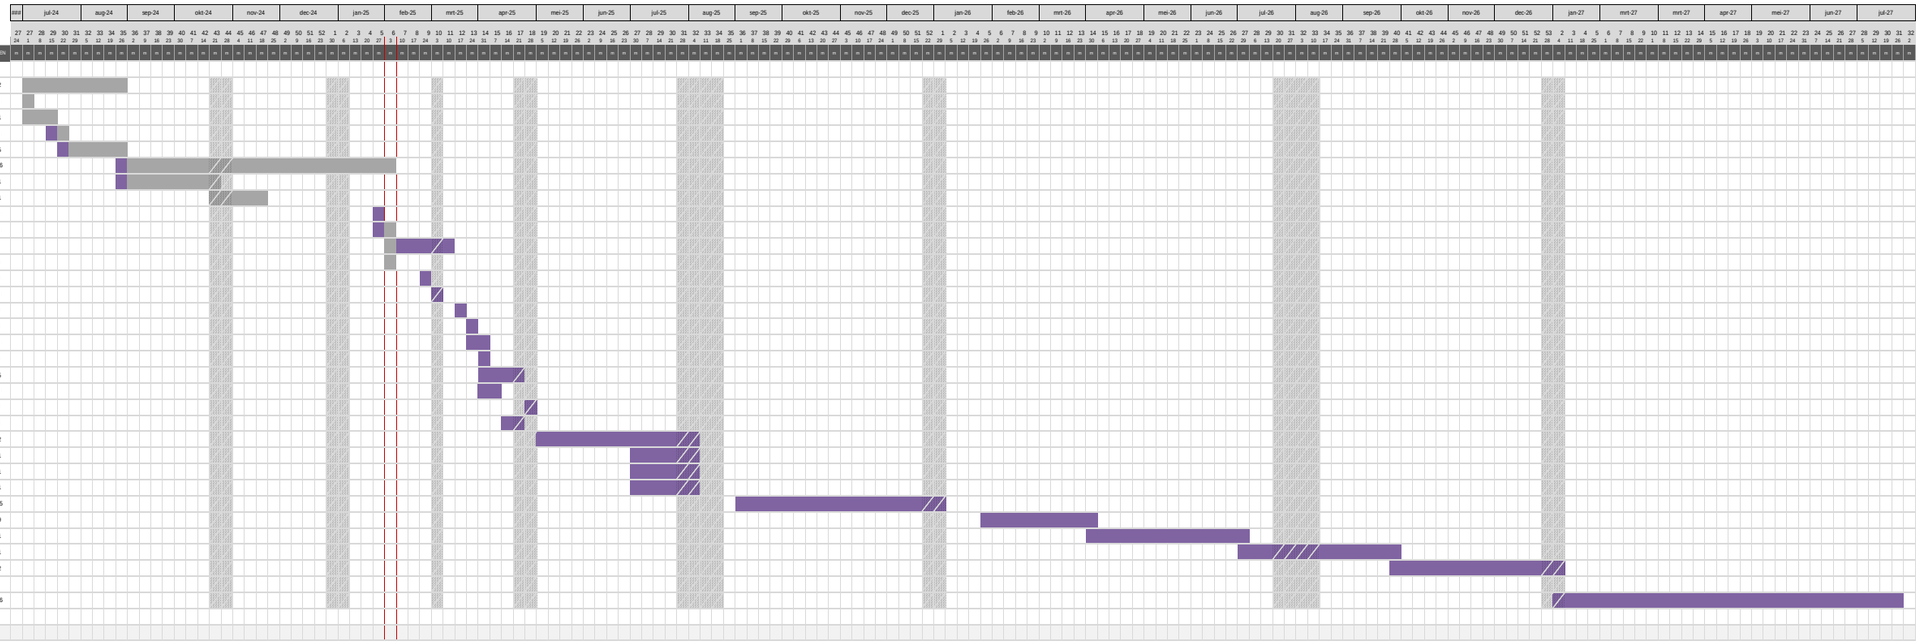

Voeg nieuwe rijen BOVEN deze in
