Gemeente Diemen

Gemeente Diemen - Project huisvesting

Turner & Townsend
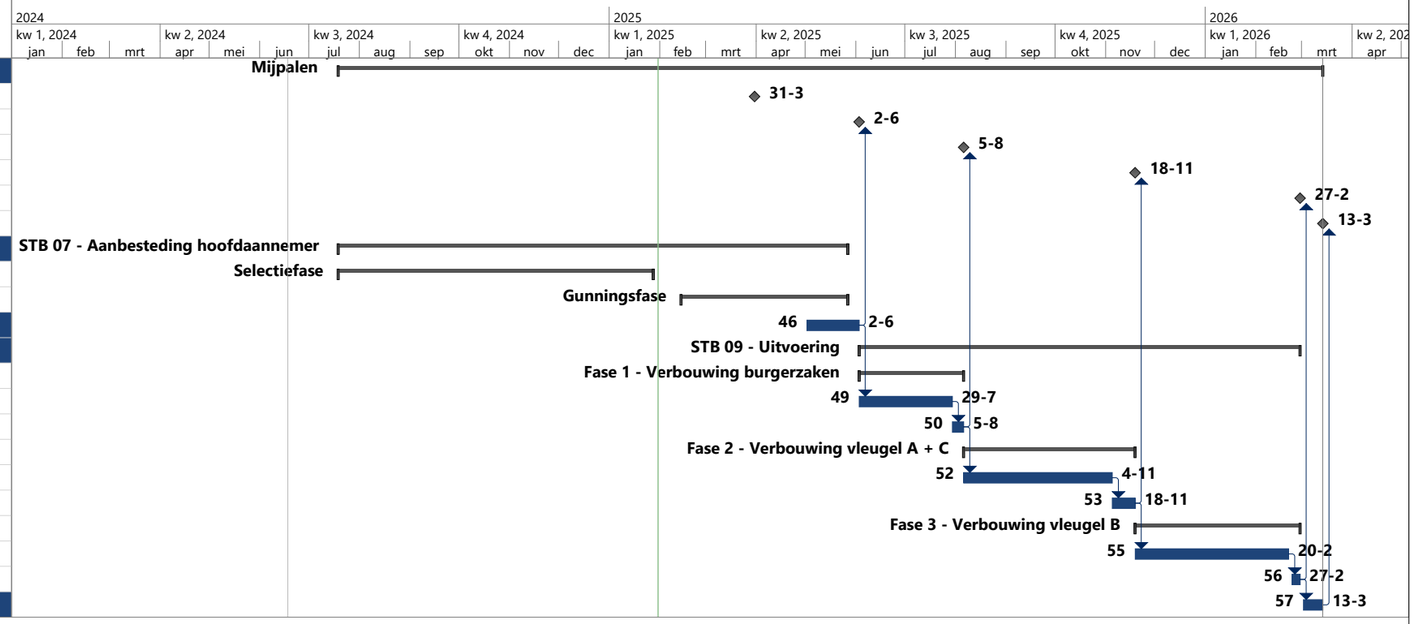
Id		Taakmodu	Task Name	Duur	% voltooid	Begindatum	Einddatum
1			**Mijpalen**	**420 dagen**	**25%**	**19-7-2024**	**13-3-2026**
2			Afgifte onherroepelijke omgevingsvergunning	0 dagen	0%	31-3-2025	31-3-2025
3			Afronding STB08 - uitvoeringsontwerp	0 dagen	0%	2-6-2025	2-6-2025
4			Oplevering STB09 | fase 1 - Burgerzaken	0 dagen	0%	5-8-2025	5-8-2025
5			Oplevering STB09 | fase 2 - Vleugel A + C	0 dagen	0%	18-11-2025	18-11-2025
6			Oplevering STB09 | fase 3 - Vleugel B	0 dagen	0%	27-2-2026	27-2-2026
7			Administratieve afronding project	0 dagen	0%	13-3-2026	13-3-2026
8			**STB 07 - Aanbesteding hoofdaannemer**	**216 dagen**	**54%**	**19-7-2024**	**26-5-2025**
9			**Selectiefase**	**134 dagen**	**74%**	**19-7-2024**	**27-1-2025**
25			**Gunningsfase**	**69 dagen**	**0%**	**14-2-2025**	**26-5-2025**
46			**STB 08 - Uitvoeringsgereed ontwerp**	**4 wkn**	**0%**	**2-5-2025**	**2-6-2025**
47			**STB 09 - Uitvoering**	**190 dagen**	**0%**	**3-6-2025**	**27-2-2026**
48			**Fase 1 - Verbouwing burgerzaken**	**45 dagen**	**0%**	**3-6-2025**	**5-8-2025**
49			Verbouwing fase 1	8 wkn	0%	3-6-2025	29-7-2025
50			Inhuizen burgerzaken	1 wk	0%	30-7-2025	5-8-2025
51			**Fase 2 - Verbouwing vleugel A + C**	**75 dagen**	**0%**	**6-8-2025**	**18-11-2025**
52			Verbouwing fase 2	13 wkn	0%	6-8-2025	4-11-2025
53			Inhuizen vleugel A+C	2 wkn	0%	5-11-2025	18-11-2025
54			**Fase 3 - Verbouwing vleugel B**	**70 dagen**	**0%**	**19-11-2025**	**27-2-2026**
55			Verbouwing fase 3	13 wkn	0%	19-11-2025	20-2-2026
56			Inhuizen vleugel B	1 wk	0%	23-2-2026	27-2-2026
57			**Administratieve afronding project**	**2 wkn**	**0%**	**2-3-2026**	**13-3-2026**
