'indicatieve doorlooptijden deelopdrachten'

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1	**Onderstaand is indicatief en kan afwijken per deelnemend Stadsdeel**	1 dag	maa 23-6-14	din 24-6-14	4GB	
2						
3						
4	**Indicatieve doorlooptijden deelopdrachten**	**53 dagen**	**maa 23-6-14**	**don 4-9-14**		
5	Schouw	2 dagen	maa 23-6-14	woe 25-6-14	24GB-50 dagen	OG, Leverancier, Plaastsingsaannemer
6	Opstellen Deelopdracht Leverantie	10 dagen	woe 25-6-14	woe 9-7-14	5	OG
7	Opstellen Deelopdracht Plaatsing	10 dagen	woe 25-6-14	woe 9-7-14	5	OG
8	Productie Leverantie	40 dagen	woe 9-7-14	woe 3-9-14	7	Leverancier
9	Inleveren werkplan, verkeersplan (per deelopdracht) aan OG	1 dag	din 22-7-14	woe 23-7-14	7GE+10 dagen	Plaatsingsaannemer
10	Beoordelen plannen (per deelopdracht)	5 dagen	woe 23-7-14	woe 30-7-14	9	OG
11	Aanmelden Grondtransport (per deelopdracht)	1 dag	vri 1-8-14	maa 4-8-14	24GB-21 dagen	OG
12	Aanvragen Verwijderen Fietsen (per locatie) kan per SD verschillen	1 dag	vri 1-8-14	maa 4-8-14	24GB-21 dagen	OG
13	Plaatsen borden verwijderen Fietsen (per locatie)	1 dag	vri 15-8-14	maa 18-8-14	24GB-11 dagen	MD, Handhaving
14	Behandeling mededeling WWU (per locatie indien van toepassing)	1 dag	maa 18-8-14	din 19-8-14	24GB-10 dagen	Plaatsingsaannemer, OG
15	Melding Waternet / Ontrekking Grondwater (per locatie)	1 dag	maa 28-7-14	din 29-7-14	24GB-25 dagen	Plaatsingsaannemer
16	Aanvragen TVM (per locatie) kan per SD verschillen	1 dag	maa 25-8-14	din 26-8-14	24GB-5 dagen	Plaatsingsaannemer
17	Plaatsen TVM (per locatie)	1 dag	don 28-8-14	vri 29-8-14	24GB-2 dagen	Wegbeheerder
18	Busmelding indien van toepassing	1 dag	maa 25-8-14	din 26-8-14	24GB-5 dagen	OG
19						
20						
21	Wegslepen auto	1 dag	vri 29-8-14	maa 1-9-14	24GB-1 dag	Handhaving, Plaatsingsaannemer
22	Verwijderen Fietsen+buiten gebruik stellen fietsenrekken (per locatie)	1 dag	vri 29-8-14	maa 1-9-14	24GB-1 dag	Plaatsingsaannemer, Handhaving
23	Inrichten werkterrein	1 dag	vri 29-8-14	maa 1-9-14	24GB-1 dag	Plaatsingsaannemer
24	Uitvoering Locatie	3 dagen	maa 1-9-14	don 4-9-14		Plaatsingsaannemer

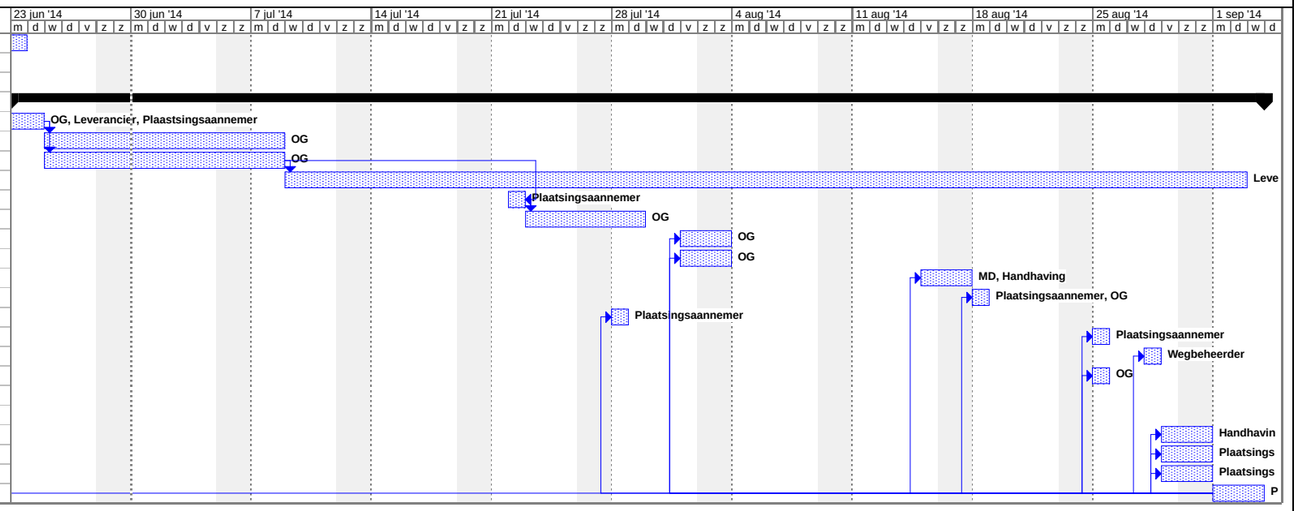

Project: Proces Uitvoering
Datum: maa 30-6-14

Taak | Splitsing | Voortgang | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline
