Concept Hoofdlijnenplanning Renovatie MPH
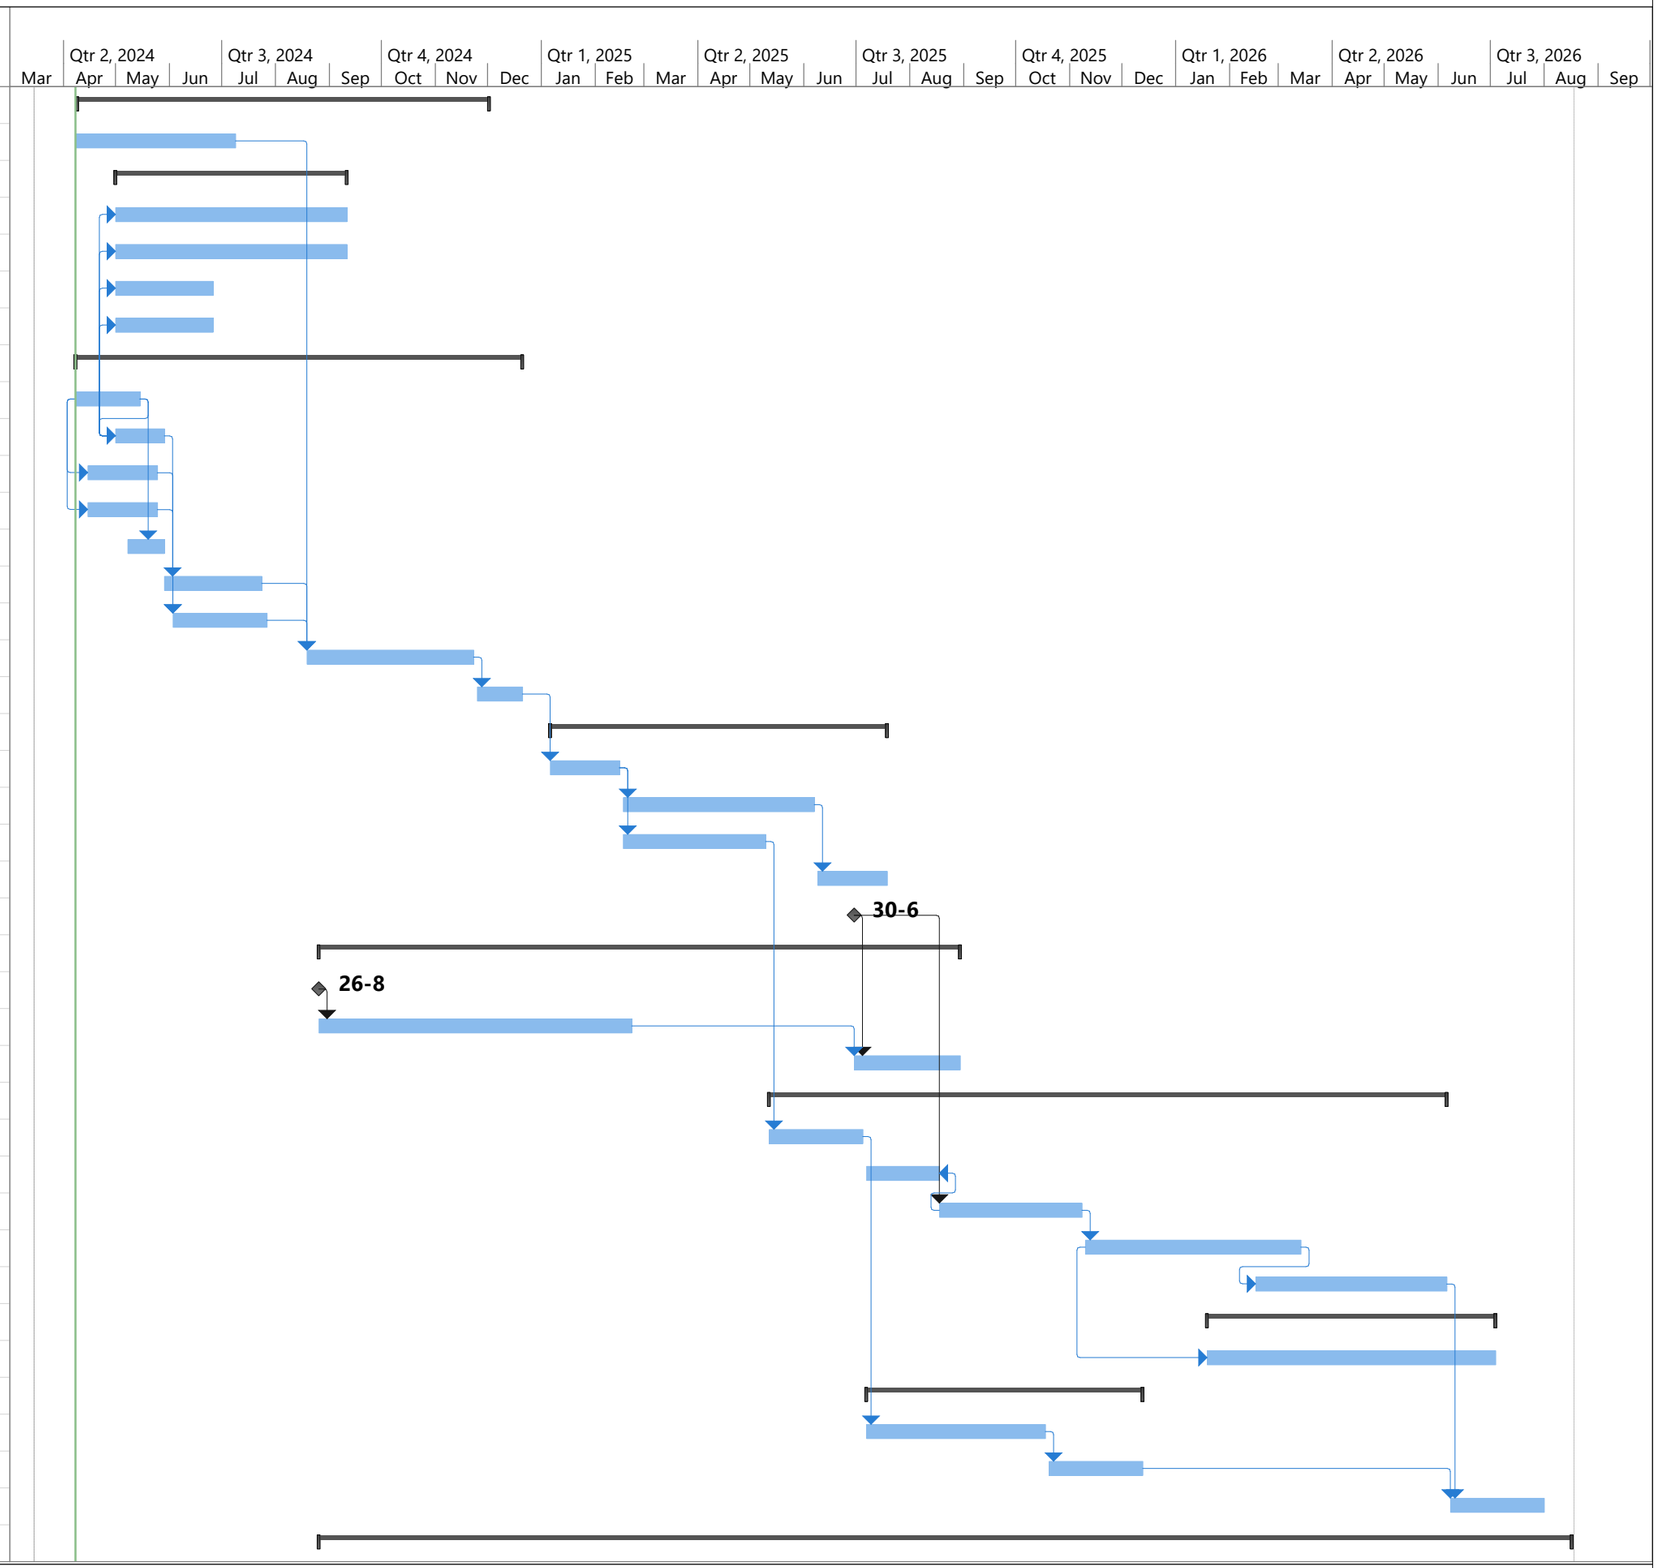
ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Stuurgroepoverleggen**	**154 days**	**Tue 9-4-24**	**Mon 2-12-24**
8	Aanbesteding PM	13,2 wks	Mon 8-4-24	Mon 8-7-24
9	**Onderzoeken**	**80 days**	**Wed 1-5-24**	**Tue 10-9-24**
10	Asbestinventarisatie	16 wks	Wed 1-5-24	Tue 10-9-24
11	Hist. Bodemonderzoek	16 wks	Wed 1-5-24	Tue 10-9-24
12	Flora- en fauna	8 wks	Wed 1-5-24	Tue 25-6-24
13	Staat leidingnet	8 wks	Wed 1-5-24	Tue 25-6-24
14	**Aanbesteding DB(M)**	**170 days**	**Mon 8-4-24**	**Fri 20-12-24**
15	Uitvraag adviesbureau	5,4 wks	Mon 8-4-24	Tue 14-5-24
16	Opstellen stukken voorselectie	4 wks	Wed 1-5-24	Tue 28-5-24
17	Uitvraag stedenbouwer	6 wks	Mon 15-4-24	Fri 24-5-24
18	Uitvraag installatieadviesbureau	6 wks	Mon 15-4-24	Fri 24-5-24
19	Opstellen kostenraming	3 wks	Wed 8-5-24	Tue 28-5-24
20	Publicatie: Voorselectie	8 wks	Wed 29-5-24	Tue 23-7-24
21	Opstellen stukken Dialoogfase	8 wks	Mon 3-6-24	Fri 26-7-24
22	Dialoogfase	14 wks	Mon 19-8-24	Fri 22-11-24
23	Alcatel	20 days	Mon 25-11-24	Fri 20-12-24
24	**Ontwerpfase**	**140 days**	**Mon 6-1-25**	**Fri 18-7-25**
25	Verwerken opm DO	6 wks	Mon 6-1-25	Fri 14-2-25
26	WABO-vergunning	16 wks	Mon 17-2-25	Fri 6-6-25
27	Technisch ontwerp	12 wks	Mon 17-2-25	Fri 9-5-25
28	Bezwaartermijn	6 wks	Mon 9-6-25	Fri 18-7-25
29	***Einde studiejaar '24 - '25***	***0 days***	***Mon 30-6-25***	***Mon 30-6-25***
30	**Verhuizing RAC**	**240 days**	**Mon 26-8-24**	**Fri 29-8-25**
31	Besluit huisvesting MP	0 days	Mon 26-8-24	Mon 26-8-24
32	Voorbereiding	6 mons	Mon 26-8-24	Fri 21-2-25
33	Verhuizing Gebruikers MPH	6 wks	Mon 30-6-25	Fri 29-8-25
34	**Uitvoering gevel**	**255 days**	**Mon 12-5-25**	**Fri 5-6-26**
35	Bouwplaatsvoorbereiding	8 wks	Mon 12-5-25	Fri 4-7-25
36	Opbouw steigers	3 wks	Mon 7-7-25	Mon 18-8-25
37	Sloop gevelplaten	3 mons	Mon 18-8-25	Fri 7-11-25
38	Vervanging gevel	4 mons	Mon 10-11-25	Fri 13-3-26
39	Ruwe afbouw	4 mons	Mon 16-2-26	Fri 5-6-26
40	**Uitvoering installaties**	**120 days**	**Mon 19-1-26**	**Fri 3-7-26**
41	Uitvoering	6 mons	Mon 19-1-26	Fri 3-7-26
42	**Uitvoering WKO**	**100 days**	**Mon 7-7-25**	**Fri 12-12-25**
43	Boren en ontwikkelen bronnen	3 mons	Mon 7-7-25	Fri 17-10-25
44	Aanleg terreinleidigen + putten	2 mons	Mon 20-10-25	Fri 12-12-25
45	**Herstel binnentuin + omgeving**	2 mons	Mon 8-6-26	Fri 31-7-26
46	**Interieuropgave MPH (buiten scop**	**480 days**	**Mon 26-8-24**	**Mon 17-8-26**
