Taak	Begindatum	Einddatum	Duur
0. Inkoopproject "Ing-bureau" (Europese Openbaar)	23-04-2024	27-02-2027	1034 w
1.1. Opstellen uitvraag	23-04-2024	17-06-2024	8 w
1.2. Opstellen aanlevering	23-04-2024	30-04-2024	1 w
1.3. Opstellen inkoopstrategie	23-04-2024	30-04-2024	1 w
1.4. Standstill-periode (bezwaretijd)	23-04-2024	23-05-2024	3 w
1.6. Vaststellen kaders inkoopimpact (concernmanager)	21-05-2024	21-05-2024	0 u
1.7. Inrichten Tendernet	07-05-2024	07-05-2024	1 w
1.12. Verzenddatum uitnodiging tot inschrijving	07-06-2024	07-06-2024	0 u
1.18. Open klok	09-08-2024	09-08-2024	0 u
1.19. Beoordelen inschrijvingen	13-08-2024	13-08-2024	40 u
1.10. Opstellen gunningsadvies	23-08-2024	23-08-2024	1 w
1.11. Vaststellen gunningsbesluit	30-09-2024	30-09-2024	0 u
1.12. Standstill-periode Alcatel	23-10-2024	23-10-2024	3 w 1d
1.13. Definitieve gunning	22-10-2024	22-10-2024	0 u
2. Deelgebied 1B en 3	19-11-2024	15-04-2026	1153 w 1d
2.1. Definitiefase	19-11-2024	21-01-2025	10 w
2.1.1. Stap 1: Verkenning & vergelijkende	19-11-2024	19-11-2024	4 w
2.1.3. Stap 2: Concepteren	17-12-2024	21-01-2025	5 w
2.1.3.1. Parkeerzijde	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3.2. Nottke verkenning verkeersafwikkeling inrichtingsplafeien	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3.3. Inventariseite afkopje/pladerte	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3.4. Circulatieplan	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3.5. Kanaerkaart waterberging en -infiltratie	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3.6. Inrichtingsplan groen	17-12-2024	17-12-2024	4 w
2.1.3. Vaststellen kaders SO-varianten	21-01-2025	21-01-2025	0 u
2.1.4. Stap 3: Uitwerken varianten schetsontwerpen	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.4.1. SO-varianten	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.4.2. Doorgrunnentekaarten en -notes	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.4.3. Grondcultuurkaarten	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.4.4. SSK-ramingen	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.4.5. Ansaplmcostenplan	21-01-2025	18-02-2025	4 w
2.1.5. Vaststellen kaders SO-voorkeursvariant (BOR)	18-03-2025	18-03-2025	0 u
2.1.6. Stap 4: Uitwerken SO-voorkeursvariant	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.6.1. SO-voorkeursvariant	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.6.2. Doorgrunnentekaart en -notes	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.6.3. Grondcultuurkaart	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.6.4. SSK-raming	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.6.5. Ansaplmcostenplan	18-03-2025	15-04-2025	4 w
2.1.7. Vaststellen SO-voorkeursvariant (BOR)	08-05-2025	08-05-2025	0 u
2.2. Uitnodigen	10-04-2025	30-04-2026	103 w 1d
2.2.1. Start participatieproject	10-04-2025	10-04-2025	0 u
2.2.2. Participatieproject	10-04-2025	19-07-2025	13 w
2.2.3. Stap 5: Uitwerken VO	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.3.1. VO	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.3.2. Doorgrunnentekaart en -nota	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.3.3. Grondcultuurkaart	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.3.4. Grond- en bouwstoffenbalans	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.3.5. SSK-raming	19-07-2025	19-08-2025	5 w
2.2.4. Vaststellen VO (BOR)	09-09-2025	09-09-2025	0 u
2.2.5. Opstellen BBR bestuur voor zienswijzen BBR bestuur	19-08-2025	09-09-2025	3 w 1d
2.2.5.1. Opstellen BBR bestuur	19-08-2025	19-08-2025	1 w
2.2.5.2. Advies	22-08-2025	22-08-2025	1 w
2.2.5.3. Bespreken in PHO	01-09-2025	01-09-2025	1 d
2.2.5.4. Besluit	09-09-2025	09-09-2025	0 u
2.2.6. (Optioneel) Ter inzage leggen verkeersbesluit voor zienswijzen	08-09-2025	08-09-2025	0 u
2.2.7. Einde termijn indienen zienswijzen	19-11-2025	19-11-2025	0 u
2.2.8. Opstellen nota van zienswijzen	19-11-2025	23-12-2025	5 w
2.2.9. Publicatie VO en nota van zienswijzen voor besluit BBR bestuur	23-12-2025	10-12-2026	24 w
2.2.9.1. Opstellen BBR bestuur	23-12-2025	10-12-2026	1 w
2.2.9.2. Advies	11-12-2026	11-12-2026	1 w
2.2.9.3. Bespreken in PHO	21-12-2026	21-12-2026	1 w
2.2.9.4. Besluit	24-12-2026	24-12-2026	0 u
2.2.10. (Optioneel) Publicatie verkeersbesluit voor besluit	24-12-2026	14-01-2028	57 w
2.2.11. Vastgesteld VO (conform besluit)	04-03-2026	04-03-2026	0 u
2.2.12. Informeren gemeenteraad (RIB)	04-06-2026	04-06-2026	0 u
2.2.13. Opstellen vergunningencan	28-01-2026	28-01-2028	104 w
2.2.14. Stap 7: Uitwerken DO	01-04-2026	30-04-2026	4 w
2.2.14.1. DO	01-04-2026	30-04-2026	4 w
2.2.14.2. Doorgrunnentekaart en -nota	01-04-2026	30-04-2026	4 w
2.2.14.3. Grondcultuurkaart	01-04-2026	30-04-2026	4 w
2.2.14.4. SSK-raming	01-04-2026	30-04-2026	4 w
2.2.14.5. Vaststellen DO (BOR)	24-04-2026	24-04-2026	0 u
2.2.15. Opstellen planning en draaiuren	12-05-2026	12-05-2026	2 w
2.3. Voorbereidingsfase	13-04-2026	27-02-2027	45 w
2.3.1. Uitwerken UO	13-04-2026	30-06-2026	11 w
2.3.2. Directiearaning	27-06-2026	27-06-2026	1 w
2.3.3. WLO-plan	27-06-2026	27-06-2026	1 w
2.3.4. Maatregelenplan CROW p-500	27-06-2026	27-06-2026	1 w
2.4. Inkoopproject "werk" (15,082 mij EU-openbaar)	13-04-2026	27-02-2027	45 w
2.4.1. Besluit BBR start aanbesteding	13-04-2026	29-06-2026	2 w
2.4.1.1. Opstellen inkoopstrategie	13-04-2026	29-06-2026	1 w
2.4.1.2. Opstellen BBR bestuit	29-06-2026	29-06-2026	1 w
2.4.1.3. Advies	13-08-2026	13-08-2026	1 w
2.4.1.4. Bespreken in PHO	27-08-2026	27-08-2026	1 w
2.4.1.5. Besluit	24-09-2026	24-09-2026	0 u
2.4.2. Inrichten Tenderned	03-09-2026	03-09-2026	1 w
2.4.3. Verzendatum uitnodiging tot inschrijving	04-11-2026	04-11-2026	0 u
2.4.4. Open klok	04-11-2026	04-11-2026	0 u
2.4.5. Beoordelen inschrijvingen	25-11-2026	25-11-2026	2 w
2.4.6. Opstellen gunningsadvies	02-12-2026	02-12-2026	1 w
2.4.7. Besluit BBR vaststellen gunningsbesluit	09-12-2026	09-12-2026	2 w 1d
2.4.7.1. Opstellen BBR bestuit	09-12-2026	09-12-2026	1 w
2.4.7.2. Advies	16-12-2026	16-12-2026	1 w
2.4.7.3. Bespreken in PHO	22-12-2027	22-12-2027	1 d
2.4.7.4. Besluit	14-01-2027	14-01-2027	0 u
2.4.8. Standstill-periode	04-02-2027	04-02-2027	3 w
2.4.9. Definitieve gunning	04-02-2027	04-02-2027	0 u
3. Deelgebied 2A	19-11-2024	15-04-2026	1153 w 1d
3.1. Stap 7: Uitwerken DO	19-11-2024	17-12-2024	4 w
3.1.1. DO	19-11-2024	17-12-2024	4 w
3.1.2. Doorgrunnentekaart en -nota	17-12-2024	17-12-2024	0 u
3.1.3. Grondcultuurkaart	17-12-2024	17-12-2024	0 u
3.1.4. SSK-raming	17-12-2024	17-12-2024	0 u
3.1.5. Vaststellen DO (BOR)	21-01-2025	21-01-2025	0 u
3.1.6. Opstellen planning en draaiuren	04-02-2025	04-02-2025	0 u
3.2. Voorbereidingsfase	17-03-2025	15-04-2026	57 w
3.2.1. Uitwerken UO	17-03-2025	16-05-2025	8 w
3.2.2. Directiearaning	16-05-2025	16-05-2025	1 w
3.2.3. WLO-plan	16-05-2025	16-05-2025	1 w
3.2.4. Maatregelenplan CROW p-500	16-05-2025	16-05-2025	1 w
3.3. Inkoopproject "werk" (meerwerk/nij onderhoud)	17-03-2025	15-04-2026	57 w
3.3.1. Besluit bestuurlijk start aanbesteding	17-03-2025	25-03-2025	1 w
3.3.1.1. Opstellen inkoopstrategie	17-03-2025	25-03-2025	1 w
3.3.1.2. Opstellen bestuurlijk besluit	17-03-2025	25-03-2025	1 w
3.3.1.3. Advies	21-04-2025	21-04-2025	1 w
3.3.1.4. Bespreken in PHO	29-04-2025	29-04-2025	1 w
3.3.1.5. Besluit	13-04-2025	13-04-2025	0 u
3.3.2. Inrichten Tenderned	25-03-2025	25-03-2025	1 w
3.3.3. Verzendatum uitnodiging tot inschrijving	30-05-2025	30-05-2025	0 u
3.3.4. Open klok	23-06-2025	23-06-2025	0 u
3.3.5. Beoordelen inschrijvingen	14-07-2025	14-07-2025	2 w
3.3.6. Opstellen gunningsadvies	11-08-2025	11-08-2025	1 w
3.3.7. Besluit bestuurlijk vaststellen gunningsbesluit	18-08-2025	18-08-2025	2 w 1d
3.3.7.1. Opstellen bestuurlijk besluit	18-08-2025	18-08-2025	1 w
3.3.7.2. Advies	26-08-2025	26-08-2025	1 w
3.3.7.3. Bespreken in PHO	02-09-2025	02-09-2025	1 w
3.3.7.4. Besluit	09-09-2025	09-09-2025	0 u
3.3.8. Standstill-periode	30-09-2025	30-09-2025	3 w
3.3.9. Definitieve gunning	30-09-2025	30-09-2025	0 u
4. Onderzoeken	19-11-2024	27-02-2027	1034 w 2d
4.1. NGE (bureau- onderzoek)	19-11-2024	06-07-2025	34 w
4.1.1. Offerte-uitvraag	19-11-2024	01-05-2025	24 w
4.1.2. Opdracht (1 op 1 clic)	01-05-2025	06-05-2025	1 w
4.1.3. Uitvoeren onderzoek en opstellen rapportage	06-05-2025	06-07-2025	8 w
4.2. Archeologie (bureau-onderzoek)	19-11-2024	06-07-2025	34 w
4.2.1. Offerte-uitvraag	19-11-2024	01-05-2025	24 w
4.2.2. Opdracht (1 op 1 clic)	01-05-2025	06-05-2025	1 w
4.2.3. Uitvoeren onderzoek en opstellen rapportage	06-05-2025	06-07-2025	8 w
4.3. BEA	22-01-2024	22-01-2024	1 d
4.4. Proefsleuvenonderzoek	22-01-2024	17-06-2025	1 d
4.5. Bodemonderzoek	19-11-2024	06-07-2025	33 w
4.5.1. Eerste trap bureau-onderzoek	19-11-2024	01-05-2025	24 w
4.5.1.1. Offerte-uitvraag	19-11-2024	01-05-2025	24 w
4.5.1.2. Opdracht (1 op 1 clic)	01-05-2025	06-05-2025	1 w
4.5.1.3. Uitvoeren onderzoek en opstellen rapportage	06-05-2025	06-07-2025	8 w
4.5.2. Tweede trap veldonderzoek	08-05-2025	06-07-2025	9 w
4.5.2.1. Opstellen uitvraag	08-05-2025	12-05-2025	3 w
4.5.2.2. Opstellen raming	12-05-2025	16-05-2025	1 w
4.5.2.3. Opstellen inkoopstrategie	16-05-2025	16-05-2025	1 w
4.5.2.4. Standstill-periode (bezwaretijd)	16-05-2025	10-06-2025	3 w
4.5.2.5. Vaststellen kaders inkoopimpact (concernmanager)	10-06-2025	10-06-2025	0 u
4.5.2.6. Inrichten Tenderned	23-06-2025	23-06-2025	1 w
4.5.2.7. Verzendatum uitnodiging tot inschrijving	10-06-2025	10-06-2025	0 u
4.5.2.8. Open klok	02-07-2025	02-07-2025	0 u
4.5.2.9. Beoordelen inschrijvingen	14-08-2025	14-08-2025	2 w
4.5.2.10. Opstellen gunningsadvies	21-08-2025	21-08-2025	1 w
4.5.2.11. Vaststellen gunningsbesluit	21-08-2025	21-08-2025	0 u
4.5.2.12. Standstill-periode Alcatel	11-09-2025	11-09-2025	3 w
4.5.2.13. Definitieve gunning	11-09-2025	11-09-2025	0 u
4.5.2.14. Uitvoeren veldonderzoek en opstellen rapportage	12-09-2025	04-12-2025	12 w
4.6. Stikstof	13-04-2026	02-07-2026	12 w
4.6.1. Aerius	13-04-2026	28-05-2026	6 w
4.6.1.1. Offerte-uitvraag	13-04-2026	28-05-2026	6 w
4.6.1.2. Opdracht (1 op 1 clic)	28-05-2026	04-06-2026	1 w
4.6.1.3. Uitvoeren onderzoek en opstellen rapportage	04-06-2026	02-07-2026	4 w
4.6.2. (Optioneel) voorfaseb	02-07-2026	20-08-2026	7 w
5. Nevenstaken	24-05-2026	17-08-2026	12 w
5.1. CVL-plan	24-05-2026	14-07-2026	7 w
5.1.1. Opstellen CV-plan	24-05-2026	24-05-2026	4 w
5.1.2. Vaststellen CV- plan (BOR)	26-05-2026	26-05-2026	0 u
5.1.3. Offerte-uitvraag	26-05-2026	23-06-2026	4 w
5.1.4. Verificatie offerte	23-06-2026	14-07-2026	3 w
5.2. Opdracht (1 op 1 SPIE)	14-07-2026	17-08-2026	5 w
5.3. VTA Nutsbedrijven	17-04-2026	17-08-2026	17 w
5.3.1. Opstellen maatregelenplan CROW p-500	17-04-2026	17-04-2026	2 w
5.3.2. Inventariseite conflicten	30-05-2026	30-05-2026	4 w
5.3.3. Proefsleuvenonderzoek	29-06-2026	29-06-2026	1 w
5.3.3.1. 1 op 1 opdracht raamovereenkomst Aktiebloeve	29-06-2026	29-06-2026	0 u
5.3.3.2. Uitvoeren onderzoek	29-06-2026	17-08-2026	7 w
5.3.4. Opdracht VTA (1 op 1)	02-07-2026	17-08-2026	6 w
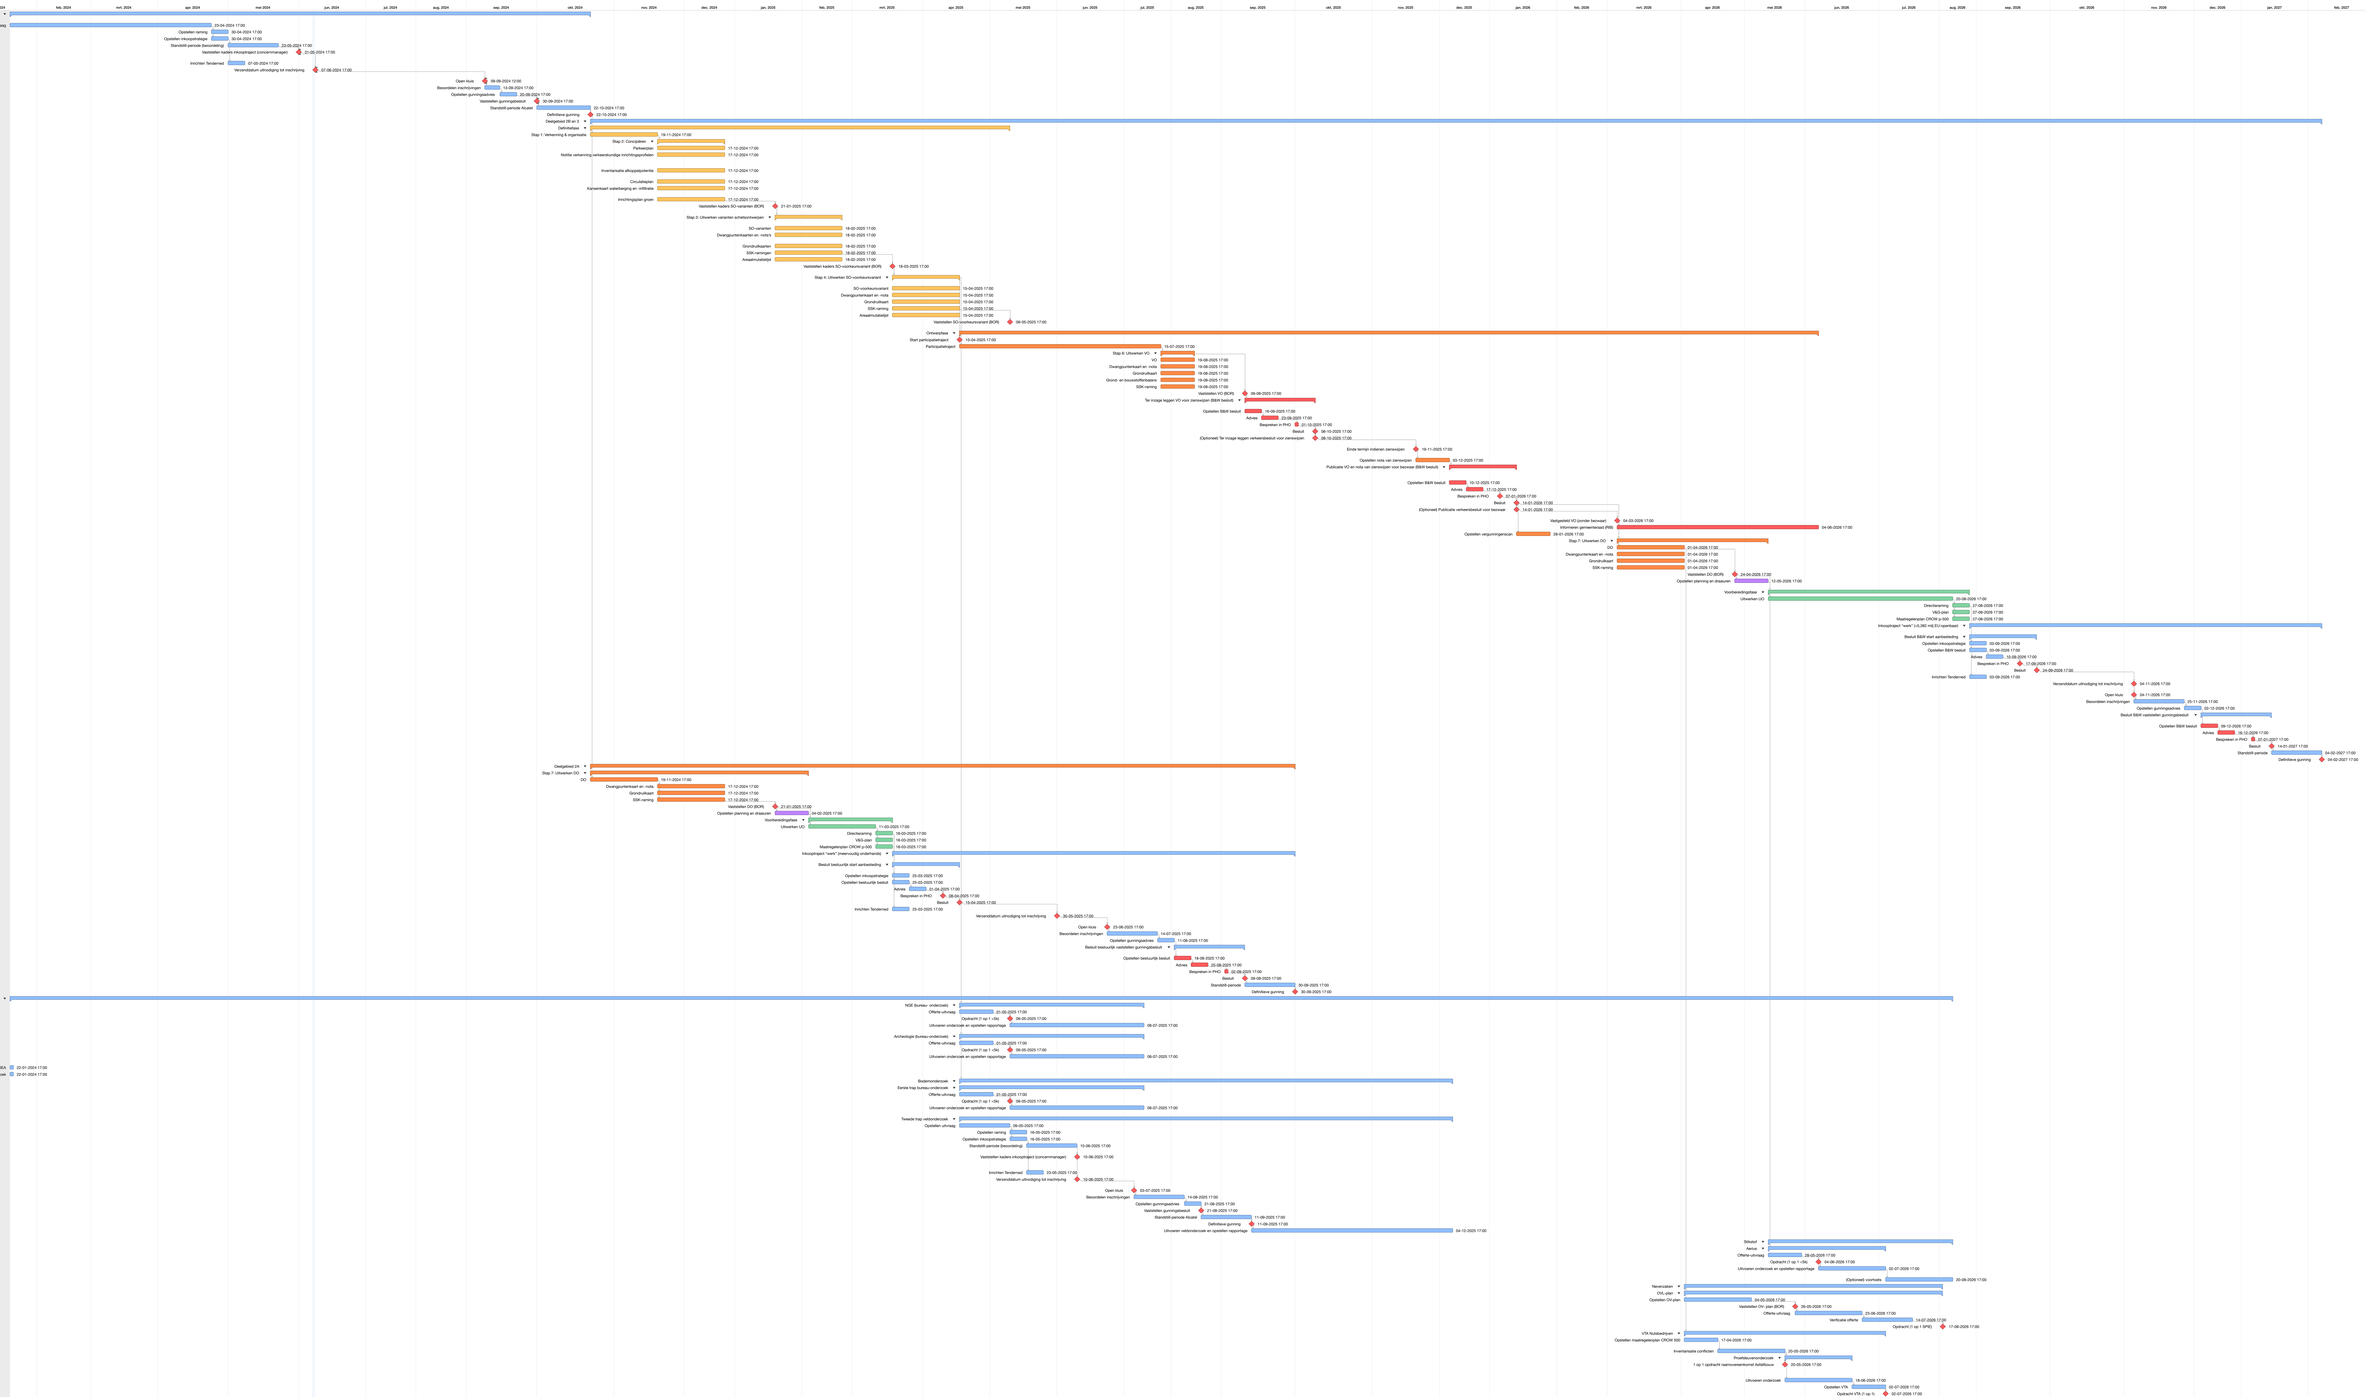
Inkoopproject "Ing-bureau" (Europese Openbaar)
