Referentienummer: 1622102-0110
Versie: 24-6-2024
Opgesteld door: EB/MV

NIEUWBOUW MFD OTTERLO
OVERALL PROJECTPLANNING
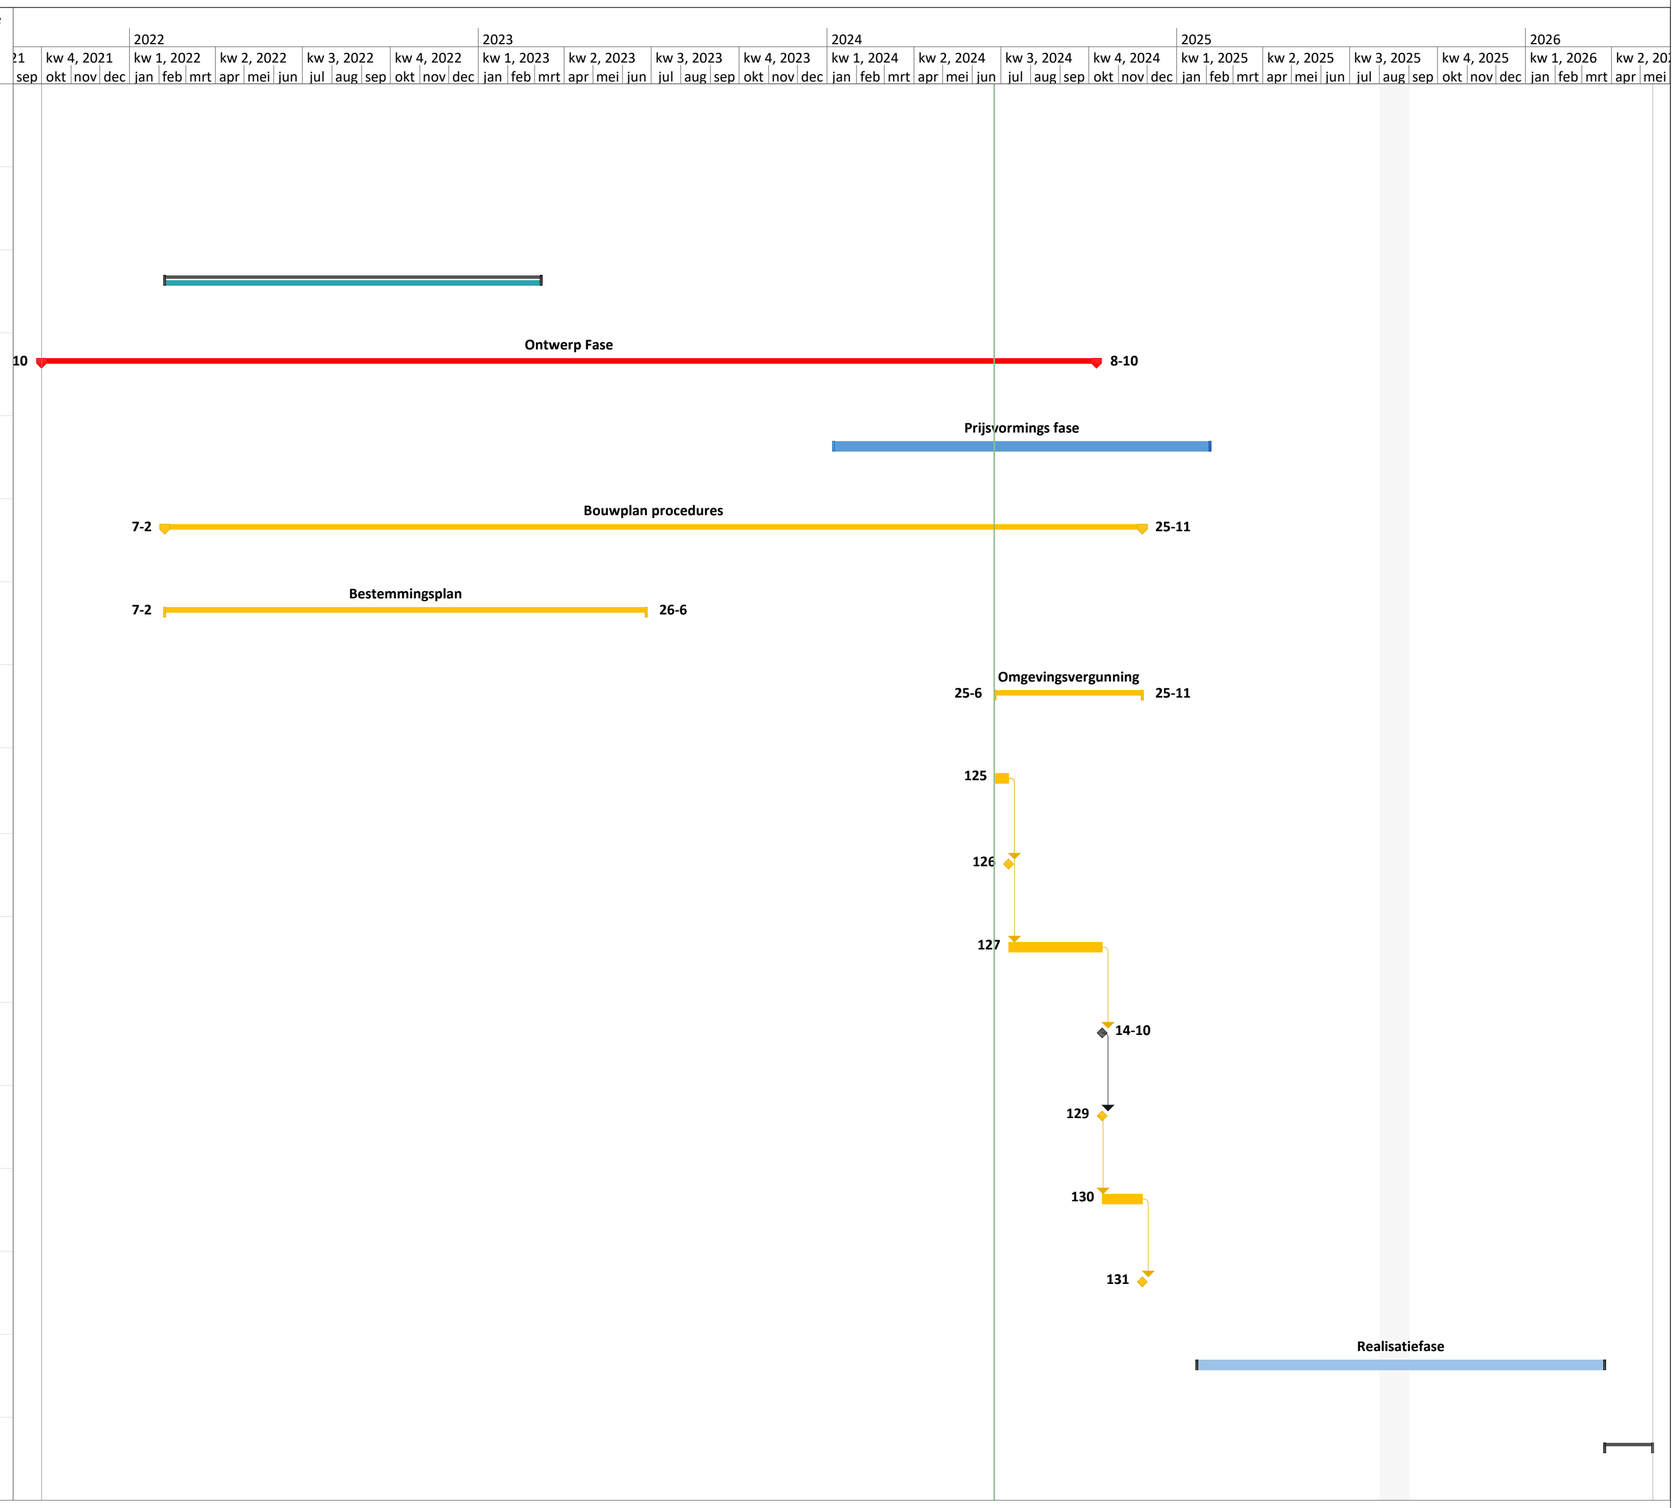
Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1	**Overall planning MFD Otterlo**				
2					
3	**Herijking en herstart fase**	**246 dagen**	**maa 7-2-22**	**din 7-3-23**	
20	**Ontwerp Fase**	**677 dagen?**	**vri 1-10-21**	**din 8-10-24**	
88	**Prijsvorming Fase**	**232 dagen?**	**maa 8-1-24**	**din 4-2-25**	**56**
116	**Bouwplan procedures**	**615 dagen**	**maa 7-2-22**	**maa 25-11-24**	
117	**Bestemmingsplan**	**324 dagen**	**maa 7-2-22**	**maa 26-6-23**	
124	**Omgevingsvergunning**	**75 dagen**	**din 25-6-24**	**maa 25-11-24**	
125	Documenten gereed maken voor aanvraag omgevingsvergunning	10 dagen	din 25-6-24	maa 8-7-24	68
126	Aanvraag omgevingsvergunning	0 dagen	maa 8-7-24	maa 8-7-24	125
127	Toets documenten tbv omgevingsvergunning /proceduretijd	8 wkn	din 9-7-24	maa 14-10-24	125
128	Publicatie omgevingsvergunning	0 dagen	maa 14-10-24	maa 14-10-24	127
129	Verlenen omgevingsvergunning	0 dagen	maa 14-10-24	maa 14-10-24	128
130	Bezwaarperiode	6 vwkn	maa 14-10-24	maa 25-11-24	129
131	Onherroepelijke omgevingsvergunning	0 dagen	maa 25-11-24	maa 25-11-24	130
132	**Realisatie Fase**	**260 dagen**	**woe 22-1-25**	**din 24-3-26**	**113**
136	**Inrichtingsfase door SMFDO**	**31 dagen**	**woe 25-3-26**	**woe 13-5-26**	**135**
