251114 SL2 - Overallplanning (aanbesteding bouwteam en VLI)
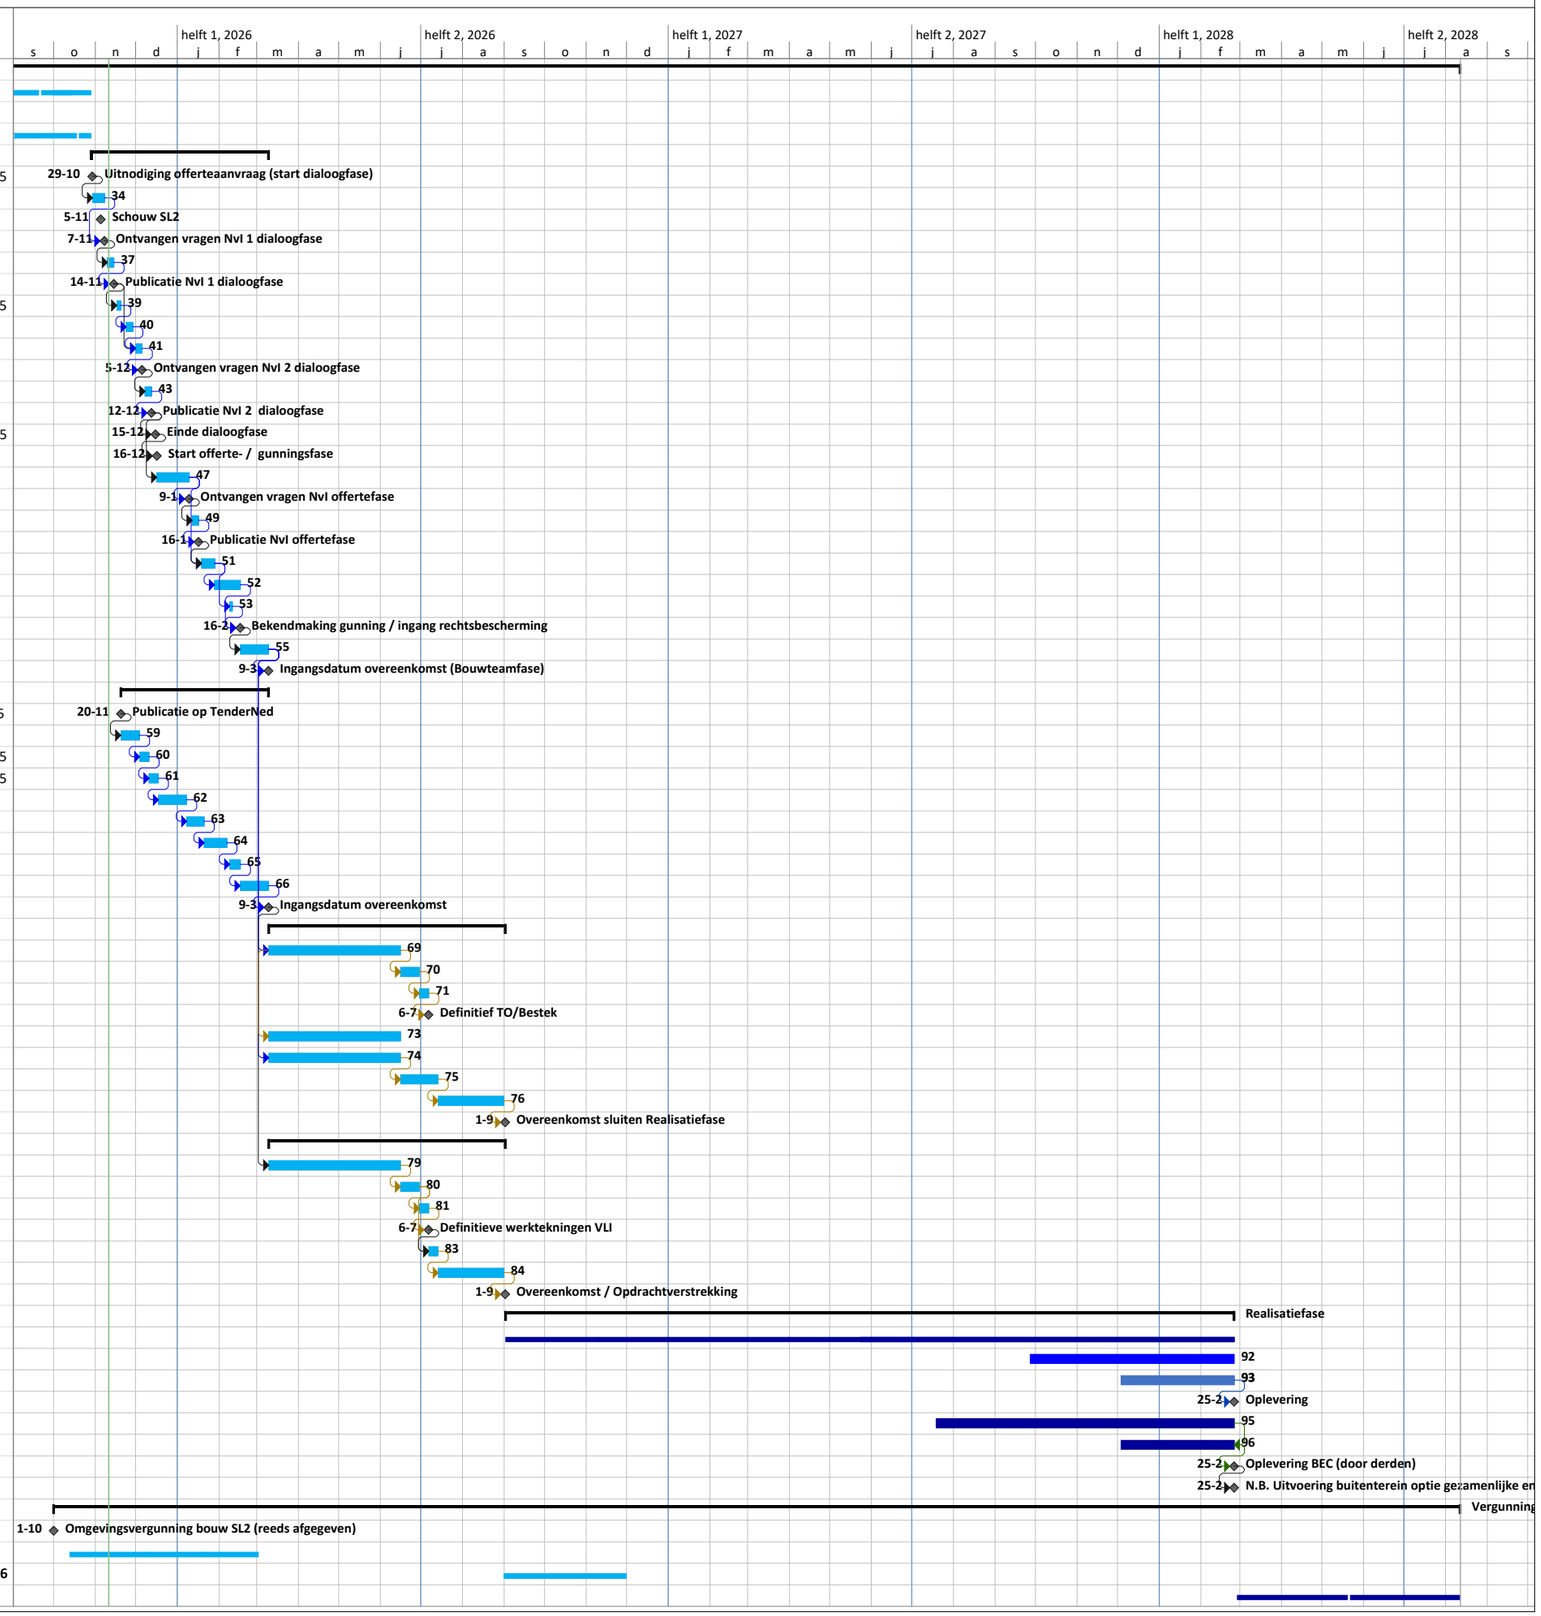
Id	Projecten	Duur	Start	Gereed
1	**1 Renovatie SL2**	**161 wkn**	**maa 31-3-25**	**vri 11-8-28**
2	**1.1 Herijken DO+**	**16,4 wkn**	**maa 16-6-25**	**din 28-10-25**
19	**1.2 Voorbereiden Heraanbesteding bouwteam aannemer**	**18 wkn**	**maa 31-3-25**	**vri 22-8-25**
25	**1.3 Selectiefase aanbesteding bouwteam aannemer (concurrentiegerichte dialoog)**	**9,38 wkn**	**maa 25-8-25**	**din 28-10-25**
32	**1.4 Dialoog- en Gunningsfase aanbesteding bouwteam aannemer**	**16,8 wkn**	**woe 29-10-25**	**maa 9-3-26**
33	1.4.1 Uitnodiging offerteaanvraag (start dialoogfase)	1 dag	woe 29-10-25	woe 29-10-25
34	1.4.2 Vragen stellen offerteaanvraag Nvl 1 dialoogfase	7 dagen	don 30-10-25	vri 7-11-25
35	1.4.3 Schouw SL2	0 dagen	woe 5-11-25	woe 5-11-25
36	1.4.4 Ontvangen vragen Nvl 1 dialoogfase	0 dagen	vri 7-11-25	vri 7-11-25
37	1.4.5 Beantwoorden vragen Nvl 1 dialoogfase	5 dagen	maa 10-11-25	vri 14-11-25
38	1.4.6 Publicatie Nvl 1 dialoogfase	0 dagen	vri 14-11-25	vri 14-11-25
39	1.4.7 Inleveren agenda dialooggesprekken (1 ronde)	3 dagen	maa 17-11-25	woe 19-11-25
40	1.4.8 Dialooggesprekken	1 wk	maa 24-11-25	vri 28-11-25
41	1.4.9 Vragen stellen offerteaanvraag Nvl 2 dialoogfase	1 wk	maa 1-12-25	vri 5-12-25
42	1.4.10 Ontvangen vragen Nvl 2 dialoogfase	0 dagen	vri 5-12-25	vri 5-12-25
43	1.4.11 Beantwoorden vragen Nvl 2 dialoogfase	1 wk	maa 8-12-25	vri 12-12-25
44	1.4.12 Publicatie Nvl 2 dialoogfase	0 dagen	vri 12-12-25	vri 12-12-25
45	1.4.13 Einde dialoogfase	0 wkn	maa 15-12-25	maa 15-12-25
46	1.4.14 Start offerte- / gunningsfase	0 wkn	din 16-12-25	din 16-12-25
47	1.4.15 Stellen vragen Nvl offertefase	24 vdagen	din 16-12-25	vri 9-1-26
48	1.4.16 Ontvangen vragen Nvl offertefase	0 wkn	vri 9-1-26	vri 9-1-26
49	1.4.17 Beantwoorden vragen Nvl offertefase	1 wk	maa 12-1-26	vri 16-1-26
50	1.4.18 Publicatie Nvl offertefase	0 wkn	vri 16-1-26	vri 16-1-26
51	1.4.19 Indienen inschrijvingen	8 dagen	maa 19-1-26	woe 28-1-26
52	1.4.20 Beoordelen inschrijvingen	19 vdagen	woe 28-1-26	maa 16-2-26
53	1.4.21 Presentaties inschrijvers	2 dagen	maa 9-2-26	din 10-2-26
54	1.4.22 Bekendmaking gunning / ingang rechtsbescherming	0 vdagen	maa 16-2-26	maa 16-2-26
55	1.4.23 Rechtsbeschermingsperiode	21 vdagen	maa 16-2-26	maa 9-3-26
56	1.4.24 Ingangsdatum overeenkomst (Bouwteamfase)	0 dagen	maa 9-3-26	maa 9-3-26
57	**1.5 Aanbesteding Vaste Labinrichting (separate aanbesteding, openbaar)**	**13,6 wkn**	**don 20-11-25**	**maa 9-3-26**
58	1.5.1 Publicatie op TenderNed	0 dagen	don 20-11-25	don 20-11-25
59	1.5.2 Vragen stellen t.b.v. Nvl 1	10 dagen	don 20-11-25	woe 3-12-25
60	1.5.3 Publicatie Nvl 1	1 wk	don 4-12-25	woe 10-12-25
61	1.5.4 Vragen stellen t.b.v. Nvl 2	5 dagen	don 11-12-25	woe 17-12-25
62	1.5.5 Publicatie Nvl 2	1 wk	don 18-12-25	woe 7-1-26
63	1.5.6 Sluitingsdatum indienen inschrijvingen	1,8 wkn	don 8-1-26	din 20-1-26
64	1.5.7 Beoordelen inschrijvingen	2,6 wkn	woe 21-1-26	vri 6-2-26
65	1.5.8 Bekendmaking gunning / ingang rechtsbescherming	6 dagen	maa 9-2-26	maa 16-2-26
66	1.5.9 Rechtsbeschermingsperiode	21 vdagen	maa 16-2-26	maa 9-3-26
67	1.5.10 Ingangsdatum overeenkomst	0 wkn	maa 9-3-26	maa 9-3-26
68	**1.6 Fase TO/bestek (Bouwteamfase)**	**22,2 wkn**	**din 10-3-26**	**din 1-9-26**
69	1.6.1 Opstellen concept TO/bestek incl onderzoeken en optimalisaties	14 wkn	din 10-3-26	maa 15-6-26
70	1.6.2 Beoordeling concept TO/bestek	2 wkn	din 16-6-26	maa 29-6-26
71	1.6.3 Opmerkingen verwerken in definitief TO/bestek	1 wk	din 30-6-26	maa 6-7-26
72	1.6.4 Definitief TO/Bestek	0 wkn	maa 6-7-26	maa 6-7-26
73	1.6.5 Inbreng deskundigheid aannemer (uitvoering, planning, kosten)	14 wkn	din 10-3-26	maa 15-6-26
74	1.6.6 Prijsvorming aannemer (opstellen ramingen en bewaking Taakstellend Budget)	14 wkn	din 10-3-26	maa 15-6-26
75	1.6.7 Opstellen en indienen prijsaanbieding (inclusief planning)	4 wkn	din 16-6-26	maa 13-7-26
76	1.6.8 Beoordeling prijsaanbieding en (eventueel) prijsoverleg	4 wkn	din 14-7-26	maa 31-8-26
77	1.6.9 Overeenkomst sluiten Realisatiefase	1 dag	din 1-9-26	din 1-9-26
78	**1.7 Ontwerpfase VLI (Werktekeningen)**	**22,2 wkn**	**din 10-3-26**	**din 1-9-26**
79	1.7.1 Opstellen concept werktekeningen VLI	14 wkn	din 10-3-26	maa 15-6-26
80	1.7.2 Beoordeling concept Werktekeningen VLI	2 wkn	din 16-6-26	maa 29-6-26
81	1.7.3 Opmerkingen verwerken in definitieve werktekeningen VLI	1 wk	din 30-6-26	maa 6-7-26
82	1.7.4 Definitieve werktekningen VLI	0 wkn	maa 6-7-26	maa 6-7-26
83	1.7.5 Opstellen en indienen Definitieve offerte (inclusief planning)	1 wk	din 7-7-26	maa 13-7-26
84	1.7.6 Beoordeling Definitieve offerte	4 wkn	din 14-7-26	maa 31-8-26
85	1.7.7 Overeenkomst / Opdrachtverstrekking	1 dag	din 1-9-26	din 1-9-26
86	**1.8 Realisatiefase**	**77,58 wkn**	**woe 2-9-26**	**vri 25-2-28**
87	**1.8.1 Realisatiefase (incl. werkvoorbereiding/UO/sloopwerk/asbestsanering)**	**77,58 wkn**	**woe 2-9-26**	**vri 25-2-28**
92	1.8.2 Uitvoering Vaste Labinrichting (VLI) - levering, plaatsing, aansluiting (door derden)	20 wkn	maa 27-9-27	vri 25-2-28
93	1.8.3 Commissioning	12 wkn	vri 3-12-27	vri 25-2-28
94	1.8.4 Oplevering	0 dagen	vri 25-2-28	vri 25-2-28
95	1.8.5 Uitvoering BEC (door derden)	27 wkn	maa 19-7-27	vri 25-2-28
96	1.8.6 Commissioning BEC (door derden)	12 wkn	vri 3-12-27	vri 25-2-28
97	1.8.7 Oplevering BEC (door derden)	0 dagen	vri 25-2-28	vri 25-2-28
98	1.8.8 N.B. Uitvoering buitenterein optie gezamenlijke entree (door derden) n.t.b.	0 wkn	vri 25-2-28	vri 25-2-28
99	**1.9 Vergunningen**	**149,57 wkn**	**woe 1-10-25**	**vri 11-8-28**
100	**1.9.1 Omgevingsvergunning bouw SL2 (reeds afgegeven)**	**0 wkn**	**woe 1-10-25**	**woe 1-10-25**
102	**1.9.2 Omgevingsvergunning bouw Entreevolume**	**20 wkn**	**maa 13-10-25**	**maa 2-3-26**
109	**1.9.3 Sloopmelding**	**13 wkn**	**din 1-9-26**	**maa 30-11-26**
115	**1.9.4 Inhuizing en in gebruikname SL2**	**24 wkn**	**maa 28-2-28**	**vri 11-8-28**
