
Id		Taakı	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1			Start aanbesteding renovatie fietsbruggen	0 dagen	din 2-12-25	din 2-12-25	
2			Hoogwater seizoen 2026 (15 oktober - 1 april)	121 dager	don 15-10-26	don 1-4-27	
3			Hoogwater seizoen 2027 (15 oktober - 1 april)	122 dager	vri 15-10-27	zat 1-4-28	
4			Aanbesteding (inschrijvingsfase)	16 wkn	din 2-12-25	maa 23-3-26	1
5			Besluitvorming gemeente/opdrachtverlening realisatie	2 mndn	din 24-3-26	maa 18-5-26	4
6			Mobilisatie/Startup	3 wkn	din 19-5-26	maa 8-6-26	5
7			**Voorbereidende werkzaamheden**	**180 dage**	**din 9-6-26**	**maa 8-3-27**	
8			Uitwerken DO aanpassingen brug + tijdelijke voorzieningen	12 wkn	din 9-6-26	maa 21-9-26	6
9			Toetsing/review en definitief maken DO	4 wkn	din 22-9-26	maa 19-10-26	8
10			Uitwerken UO aanpassingen brug	6 wkn	din 20-10-26	maa 30-11-26	9
11			Uitwerken uitvoeringsplannen, e.d.	10 wkn	din 30-6-26	maa 28-9-26	6BE+3 wkn
12			Vergunningenprocedure	20 wkn	din 20-10-26	maa 8-3-27	9
13			**Uitvoeringswerkzaamheden**	**283 dage**	**vri 2-4-27**	**din 23-5-28**	
14			Fase 0: Voorbereidende werkzaamheden	8 wkn	vri 2-4-27	don 27-5-27	12;2
15			Fase 1: Demontage brug en transport naar werkterrein	2 dagen	vri 28-5-27	maa 31-5-27	14
16			Fase 2: Verdere demontage brugsecties, transport over de w	1 wk	maa 31-5-27	vri 4-6-27	15GB+1 dag
17			Fase 3: Uitvoeren groot onderhoud in fabriek	10 mndn	maa 7-6-27	vri 31-3-28	16;10
18			Fase 4: Transport onderdelen naar werkterrein Hardenberg	1 wk	maa 3-4-28	vri 7-4-28	17;3
19			Fase 5: Uitvoeren groot onderhoud (montage onderdelen)	3 wkn	maa 10-4-28	vri 28-4-28	18
20			Fase 6: Transport naar locatie, montage dekdelen	2 dagen	maa 1-5-28	din 2-5-28	19
21			Afwerking/oplevering, opruimen werkterrein	3 wkn	woe 3-5-28	din 23-5-28	20
22							
23							
24							

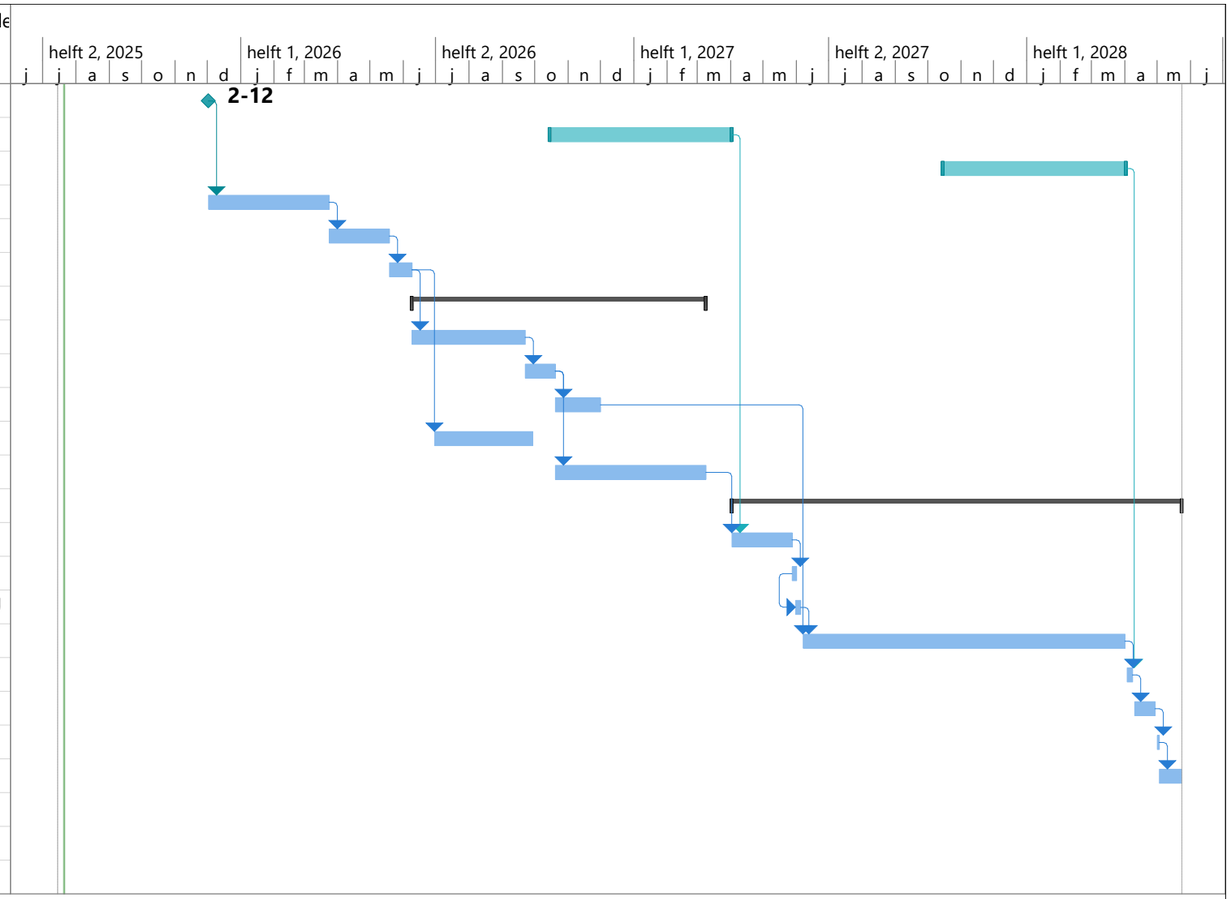

Project: uitvoeringsplanning
Amaliabrug
Datum: maa 21-7-25

Taak	Projectsamenvatting	Handmatig taak	Alleen begindatum	Deadline	
Splitsing	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum	Voortgang	
Mijlpaal	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang, handmatig	
Samenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Externe mijlpaal		
