UMCG **Overzichtsplanning CLDR gebouw ta Groningen** Versie 1.0

Nr.	Activiteit	Soort	Begindatum	Einddatum	Geschatte duur	Gereed
1	Excavatie Noord 2023 (tijd zo'n 10 augustus tot8. 31. 32)	Grond	ma 14-08	ma 14-08		
2	Excavatie Noord 2023 (tijd zo'n 10 augustus tot8. 31. 32)	Grond	ma 14-08	ma 14-08		
3	Excavatie Noord 2023 (tijd zo'n 10 augustus tot8. 31. 32)	Grond	ma 14-08	ma 14-08		
4						
5	Aanpassingen PvE	Model	ma 14-08	ma 14-08		
6	PE Programma aangeleverd	Tool	ma 14-08	ma 14-08		
7	Overleg aanleggroent Gebieden Ontwerpen PvE	Gremi	ma 14-08	ma 11-09		
8	uit Plan gestroomd PvE Gebo - Strukturen	Tool	ma 14-08	ma 14-08		
9	Goedkeuring en afmeting aangepast PvE	Tool	ma 14-08	ma 28-08		
10	Gebieden plan/discussietoegan voor strukturen van PvE (aparatuur en inrichting)	Model	ma 14-08	ma 11-09		
11	IFC Gebouw + lyptoll database	Gremi	ma 14-08	ma 14-08		
12						
13	**Structuur ontwerp**	Model	ma 14-08	ma 18-09		
14	Gebiedsbeschrijvingen toepasing op locatie	Tool	ma 14-08	ma 11-09		
15	Plaatsgebonden zaka- controlelijk programma (controlelijke inrichting typisch 3600x7200)	Tool	ma 14-08	ma 18-10 HUB		
16	Toepasing schema BSL 01 Lab	Tool	ma 14-08	ma 18-09 HUB		
17	Verificatie RIS 01 (HKO-constructeur)	Extern	ma 25-08	ma 01-10 HUB		
18	Gevels - / hoofdindeelplanning - / detail - /constructeurs - (kun aangepaste/gegl)	Tool	ma 14-08	ma 18-09 HUB		
19	Overzicht/ontwerp bouwmaas + bouwwaarde	Tool	ma 14-08	ma 18-10 HUB		
20	Verificatie (incl.) gevels HKO+ constructeur	Extern	ma 25-08	ma 01-10		
21	MUFN: Limited deel van de ecosysteem (aspecten zonder bouwsteen (HKO) + constructeur (HKO) + installatie (HKO))	Model	ma 01-09	ma 18-09		
22	Check verdichtbaar, in ongeveeg op problemen/vorm (kaska op tap dak)	Tool	ma 04-09	ma 11-10 HUB		
23	Check toepasing op ongeveeg - Gevelkeep - kastenstelsel/ramen	Tool	ma 11-09	ma 18-09 HUB		
24	Hoofdbeginselen/hulde principe en uitgangspunten	Tool	ma 14-08	ma 11-10 HUB		
25	Principe opzet installatie en construkte (overlapzones, hetgeste toepasing	Tool	ma 14-08	ma 11-10 HUB		
26	Budgetering (ex.+/-0 bouwkosten) en installatie	Tool	ma 11-10	ma 11-10		
27	Checkp. - goedkeuring gemeente (stedenbouwkundig)	Tool	ma 11-10	ma 11-10		
28	DO Vaas document, indeeing	Tool	ma 11-10	ma 31-10 HUB		
29	**Goedkeuring directie (HKO) (GRID) (Milestone)**	Tool	ma 31-10	ma 31-10		
30						
31	**Voorlopig ontwerp**	Model	ma 11-10	ma 13-12		
32	Plattegronden (dlo Plantafel) PvE, + toepasing op locatie	Tool	ma 31-10	ma 14-09		
33	Tekening aanzicht vlaardeelnet B - mind. kun gebruiken dm typisch - bretfoutlier	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB + uur		
34	Gevels incl metaalbekleding	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB		
35	Overzicht/ontwerp bouwmaas/constructeur/Constructies	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB		
36	Uitgewerkte varianten B dm typisch + inrichting dm/bretfoutlier aanbieden voor gebruiker en installatiebeeld	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB + uur		
37	Materialen overzicht plattegronden Bouwkundig	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB		
38	Aanzicht elementen/ate incl/bitbitten interieur en exterieur	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB + uur		
39	Materialen overzicht plattegronden interieur en exterieur	Tool	ma 14-09	ma 14-09 HUB		
40	IBA keten (HKO + constructeur)	Extern	ma 14-09	ma 21-09		
41	Akoestiek (HKO + constructeur)	Model	ma 14-09	ma 21-09		
42	Tekening brandwerende construkties (HKO) - constructeur - installatie (HKO) - gevels - dak - gebouwdelen	Tool	ma 14-09	ma 21-09		
43	Verkeerstechnisch Gevelwerk - / interieur bouwsel (HKO) + constructeur	Extern	ma 14-09	ma 28-09 HUB		
44	Uitlegpunten van de Meerpunt + aanzicht - dm de Meerpunt (HKO) + constructeur	Tool	ma 21-09	ma 28-09		
45	Integrale ecologische maatregelen	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
46	Concept bestekbegroting en kostenplanning	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB + uur		
47	Opstellen 1400 dossier – impact op ontwerp	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB + uur		
48	Principe opzet installatie en construkte (overlapzones horizontaal en verticaal	Tool	ma 11-09	ma 21-09 HUB + uur		
49	Afstemming met technische behoeders	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB + uur		
50	Concept schema BSL 01 Lab	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
51	Verdeldiagramme BSL 01 Lab	Tool	ma 21-09	ma 21-09		
52	Tekening aanzicht plattegronden Model W10 met de gebouwen dm typisch bretfoutlier	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
53	Tekeninnmeting, toepasing in ongeveeg dm met dm/ate	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB + uur		
54	VO ontwerp bouwmaas - installaties, aan.ate interieur dmv schetsen	Tool	ma 21-09	ma 28-09 HUB + uur		
55	VO (Integraal Voor Overleg) opstellen met gemeente	Tool	ma 21-09	ma 28-09 HUB		
56	Goedkeuring gemeente stedenbouwkundig + wetstoezicht	Tool	ma 28-09	ma 28-09 HUB + uur		
57	Verwerkte typisch W10 en Strukturen toegepast mut gebouw	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB + uur		
58	Rookmeeuwmeting (aanbestedd) - ter overleg met TC Gebouw	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
59	Rookmeeuwmeting ter controle aan TC	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
60	Vegetatie begroot W10 dm bretfoutlier aanbieden mut gebouw	Tool	ma 14-09	ma 21-09 HUB		
61	VO Vaas document incl. documentenlijst + financien	Tool	ma 21-09	ma 28-09 HUB		
62	**Goedkeuring directie (HKO) (GRID) (Milestone)**	Tool	ma 28-09	ma 28-09		
63						
64	**Definitief Ontwerp fase (incl. bouwtoestemming)**	Model	ma 14-09	ma 09-04		
65	Definitieve plattegronden bouwkundig inclusief concept Labinrichting	Tool	ma 14-09	ma 19-09		
66	Gevels definitief	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
67	Overzicht/ontwerp inclusief Constructies en Installaties	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
68	Principe details Bouwkundig en Constructies	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
69	Materialenstaat definitief Bouwkundig	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
70	Gevels, aanzicht interieur en vaste inrichtingen	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
71	Afwerkstaat interieur en exterieur	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
72	Plaatsingen bouwtechnisch en bouwfysisch	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
73	Gebiden 1500 dossier – impact op ontwerp	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
74	Concept plattegronden en bestekbegroting	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
75	Principe details Constructies	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
76	Definitief Ontwerp Installaties	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
77	Afstemming met technische behoeders	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
78	Concept plattegronden/gevels – / constructeur (K - W)/E dm Strukturen (video - / aanzicht) - / installatie (K - W)/E dm/ate gebruiker en overige stakeholders	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
79	Concept bestekbegroot Installaties	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
80	Plaatsingen Installaties	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
81	Definitief Labinrichtingstekeningen	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
82	Definitief Ontwerp BSL 01 Lab	Tool	ma 14-09	ma 19-09		
83	Verdeldiagramme BSL 01 Lab	Tool	ma 14-09	ma 19-09		
84	Definitieve plattegronden/tekening ter onderbouwing door gebruiker en stakeholders	Tool	ma 14-09	ma 19-09		
85	Tekeninnmeting definitief dan dmv/ate	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
86	Overzicht/verdeldiagramme/plan van uitgangspunt PvE voor B, W/E	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB		
87	DO ontwerp Bouwkundig - Installaties - Labs.ate interieur door bouwbedrijvenpromotor	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
88	Tussenrg DO ontwerp door externe kostenbestekgebuiger	Tool	ma 14-09	ma 19-09		
89	Tussenrg door gewaardeerd gemeente stedenbouwkundig + wetstoez	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
90	DO Vaas document incl. documentenlijst	Tool	ma 14-09	ma 19-09 HUB + uur		
91						
92	**Goedkeuring directie (HKO) (GRID) (Milestone)**	Tool	ma 19-09	ma 19-09		
93						
94	**Technisch Ontwerp fase (bouwtoez + aanvraag omgevingsvergunning)**	Model	ma 19-09	ma 14-01		
95	Bouwconstructieplan/detail Bouwkundig	Tool	ma 19-09	ma 26-09		
96	Bouwconstructieplan/detail Constructies	Tool	ma 19-09	ma 26-09 HUB		
97	Bouwconstructieplan/detail Installaties	Tool	ma 19-09	ma 26-09 HUB + uur		
98	Plaatsingen Bouwkundig/detail en Bouwfysisch	Tool	ma 19-09	ma 26-09 HUB		
99	Plaatsingen Installatie	Tool	ma 19-09	ma 26-09 HUB		
100	Plaatsingen Constructie dmv (HKO) (update?)	Tool	ma 19-09	ma 26-09 HUB		
101	**MUFN (vergunning technische haalbaarheid) indiening door (HKO) (Milestone)**	Tool	ma 26-09	ma 26-09		
102	Behandeltrajectoren omgevingsvergunning	Tool	ma 26-09	ma 23-01 HUB		
103	Uitlegde aanvulinge aanleveringen behandeltrajectoren omgevingsvergunning	Tool	ma 26-09	ma 23-01		
104	Aanvraag toepassingsreg	Tool	ma 26-09	ma 23-01 HUB		
105	Vergunning verleend (weken)	Tool	ma 26-09	ma 23-01		
106						
107	**Bouwtoestemm (14 april t/m 15 augustus)**	Tool	ma 14-01	ma 14-01		
108						
109	**Bouw ketter incl ketelerak + tunnel**	Model	ma 14-08	ma 21-09		
110	Grus + bouwkuip gereed	Grond	ma 14-08	ma 11-09 HUB + uur		
111	Eindcuvette grondopvang	Grond	ma 11-09	ma 11-09 HUB + uur		
112	Stal bakstenen ext. (dc deelplan) (Milestone)	Grond	ma 21-07	ma 21-07		
113						
114	**Technisch Ontwerp (bestekbaar)**	Model	ma 14-01	ma 17		
115	Concept bestekbegroot Bouwkundig	Tool	ma 21-09	ma 21-09		
116	Concept bestekbegroot - tekeningen - aaiw.ate/inrichtingen	Tool	ma 21-09	ma 21-09		
117	Materialenstaat	Tool	ma 21-09	ma 21-09		
118		Tool	ma 21-09	ma 21-09		
119	Bestek algemeen Deel voor alle percelen	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
120	Bouwkundig Ruwe bestek	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
121		Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
122	Constructie tekeningen en berekeningen	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
123	Constructief Ruwe bestek	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
124	Plaatsingen installatietechnik en constructies	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
125	Concepbestekbesteken Bouwkundig beoordeeld door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
126						
127	Concept bestekbegroot Installatie W10 + Transportinstallaties	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB + uur		
128	Uitgegeven documenten - bijgevoegde tekeningen bij installaties	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
129	Transportinstallaties Ruwe bestek	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
130	Concepbestekbesteken installaties beoordeeld door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
131						
132	Concept bestekbegroot Labinrichting	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB + uur		
133	Lab inrichting Ruwe bestek	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
134	Concepbestekbesteken labinrichtingen beoordeeld door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
135						
136	Concept bestekbegroot BSL 01 lab	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
137	Installatie BSL 01 lab	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
138	BSL 01 Ruwe bestek	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
139	Concepbestekbesteken BSL 01 beoordeeld door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
140						
141	Finishkleuring bestekbesteken indiening + Opstelling van aanvraagregs (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
142						
143	Goedkeuring bestekbesteken Bouwkundig door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
144	Goedkeuring bestekbesteken Vaste Inrichting door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
145	Goedkeuring bestekbesteken Installaties + Transportinstallaties door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
146	Goedkeuring bestekbesteken Labinrichting door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
147	Goedkeuring bestekbesteken BSL 01 lab door (HKO)	Tool	ma 21-09	ma 21-09 HUB		
148	**Uitgifte bestekstaten (Milestone)**	Tag	ma 21-09	ma 21-09		
149						
150	**Prijs- en Gunningsronde**	Model	ma 21-09	ma 19-09		
151	Rekenprijs ter aanvraagbegeeting Bouwkundig + Transportinstallaties	Tool	ma 21-09	ma 26-09		
152	Rekenprijs ter aanvraagbegeeting Installaties W10	Tool	ma 21-09	ma 26-09		
153	Rekenprijs ter aanvraagbegeeting Labinrichting	Tool	ma 21-09	ma 26-09		
154	Rekenprijs ter aanvraagbegeeting BSL 01 lab	Tool	ma 21-09	ma 26-09		
155	Toetsing bestekbegroot/begroot door externe kostenadviseur	Tool	ma 21-09	ma 26-09		
156	Investeringsraming Installatie (HKO)	Tool	ma 26-09	ma 26-09		
157	Verificatie en optimalisatiesprints (uitgewerkt)ten	Tool	ma 26-09	ma 26-09		
158	Investeringsraming Installatie (HKO)	Tool	ma 26-09	ma 26-09		
159	**Goedkeuring directie (HKO) (GRID) (Milestone)**	Tool	ma 26-09	ma 26-09		
160						
161	**Uitvoeringsfase**	Model	ma 19-09	ma 14-01		
162	Bestemmingsplan door (HKO) (Pol nab bodemonderzoeken + omgevingsdienst)	Grond	ma 19-09	vr 30-09		
163	Kunstwerking start Grond	Grond	vr 01-08	vr 08-08 HUB		
164	Bouwdoorlopfase	Grond	vr 08-08	vr 15-08 HUB		
165	Opening nrd gereed vormgevoeing + (SAT) Milestone	Tool	vr 15-08	vr 15-08 HUB		
166	Pasbyzicht afhanden	Grond	vr 15-08	vr 29-09 HUB		
167	**Opening (Milestone)**	Tag	vr 29-09	vr 29-09 HUB		
168	Inregelen + testen installaties	Grond	vr 29-09	vr 06-11 HUB		
169	Inbedrijf	Grond	vr 29-09	vr 06-11 HUB		
170	Verhuizing	Grond	vr 06-11	vr 13-11 HUB		
171	Ingebruikneming	Tag	vr 13-11	ma 17-11 HUB		

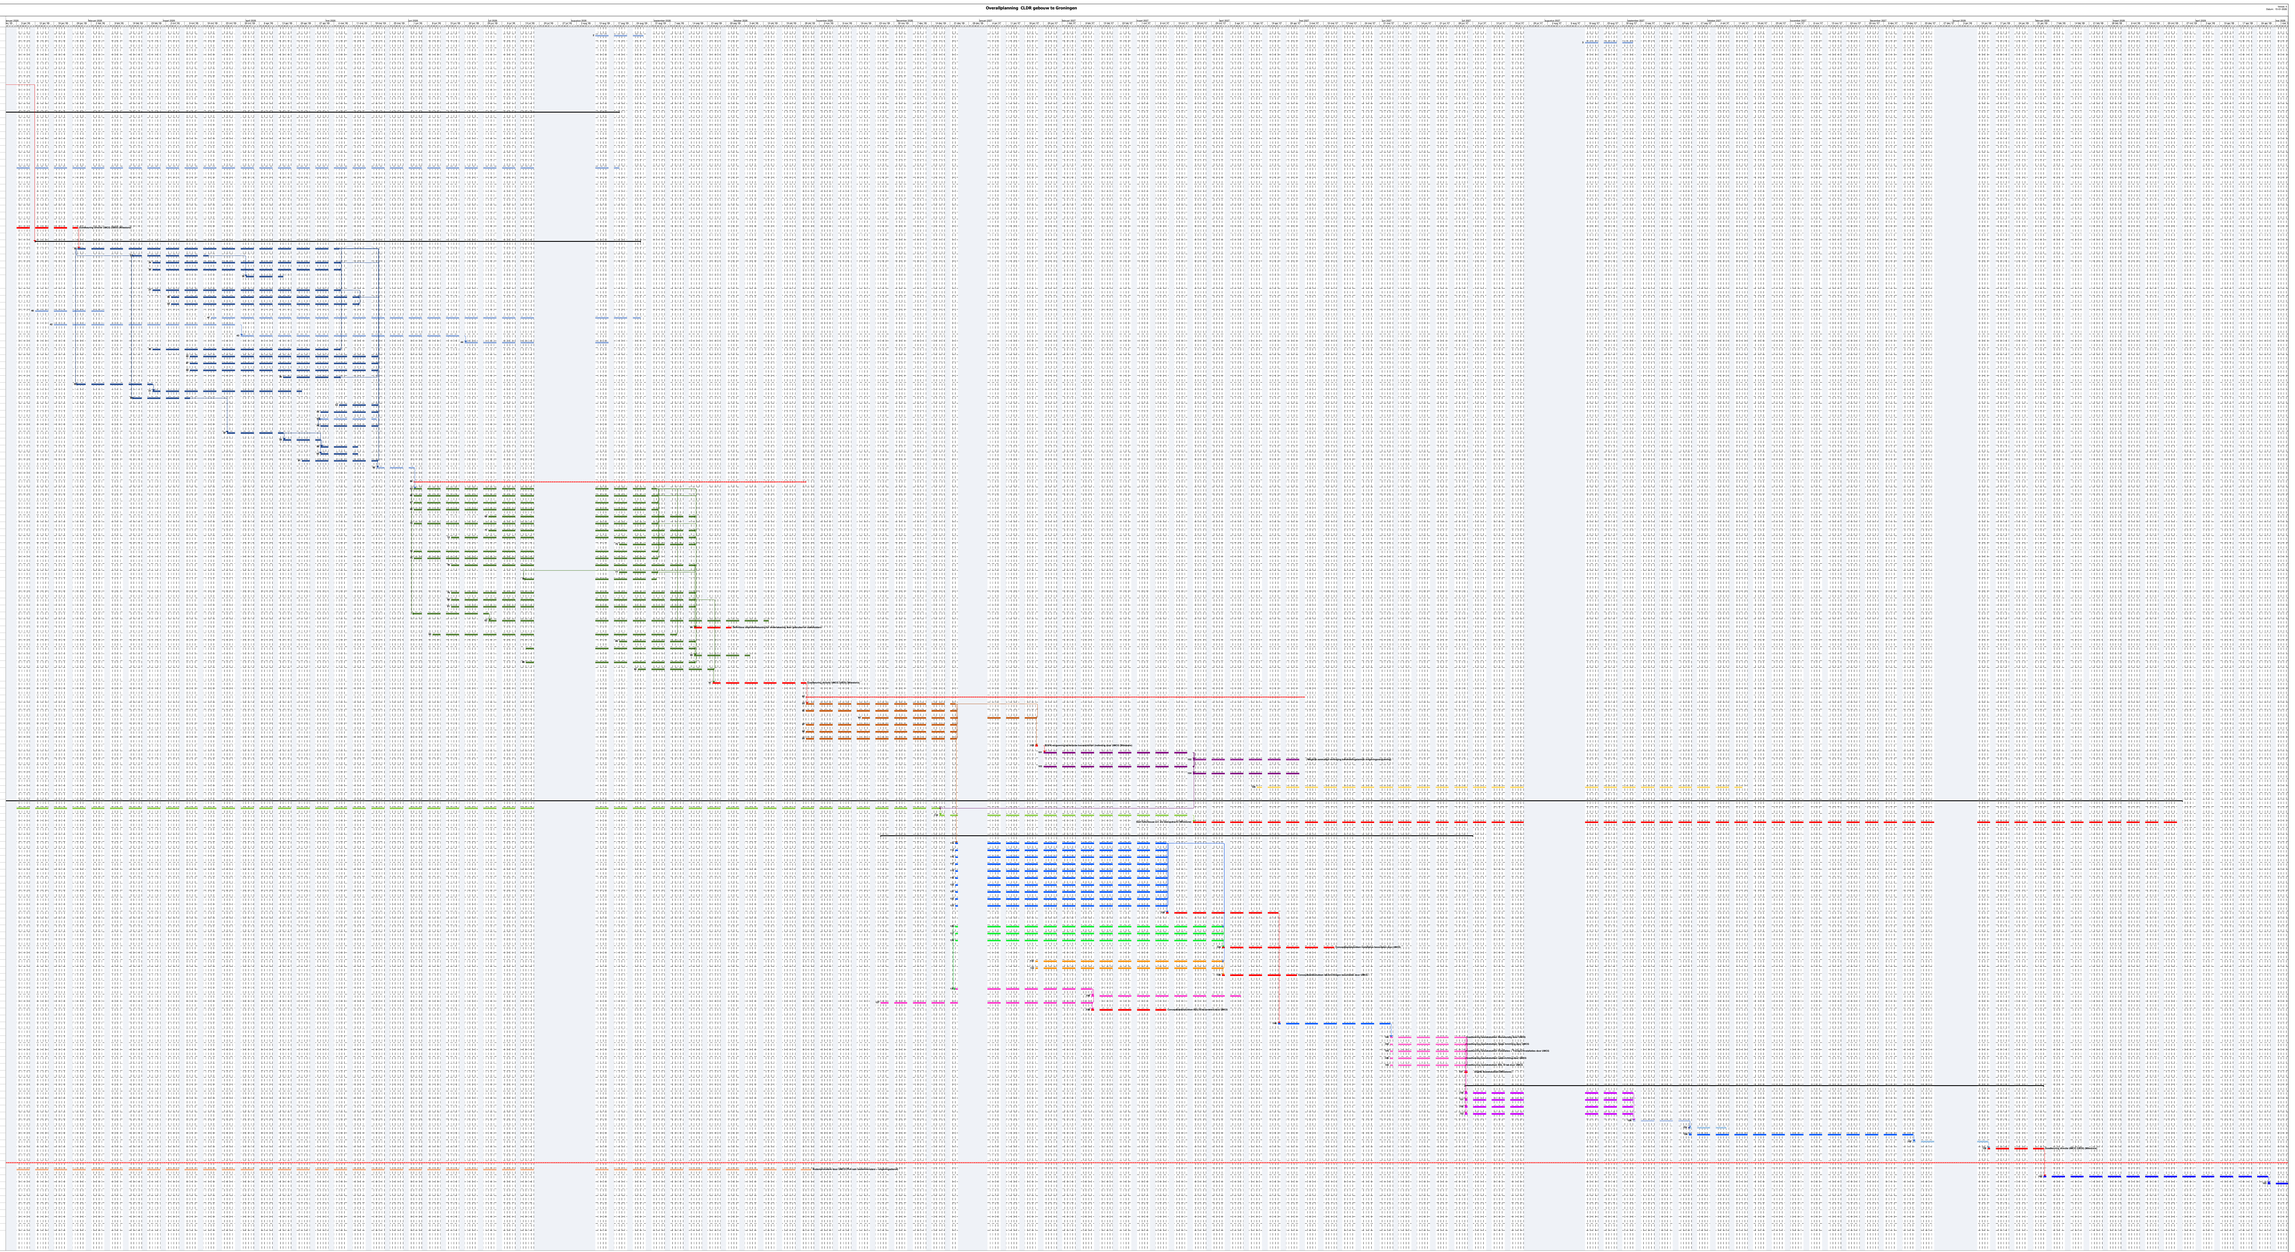
Aug-2023
Sept-2023
Okt-2023
Nov-2023
Dec-2023
Jan-2024
Feb-2024
Mrt-2024
Apr-2024
Mei-2024
Jun-2024
Jul-2024
Aug-2024
Sept-2024
Okt-2024
Nov-2024
Dec-2024
Jan-2025
Feb-2025
Mrt-2025
Apr-2025
Mei-2025
Jun-2025
Jul-2025
Aug-2025
Sept-2025
Okt-2025
Nov-2025
Dec-2025
Jan-2026
Feb-2026
Mrt-2026
Apr-2026
Mei-2026
Jun-2026
Jul-2026
Aug-2026
Sept-2026
Okt-2026
Nov-2026
Dec-2026
Jan-2027
Feb-2027
Mrt-2027
Apr-2027
Mei-2027
Jun-2027
Jul-2027
Aug-2027
Sept-2027
Okt-2027
Nov-2027
Dec-2027
Jan-2028
Feb-2028
Mrt-2028
Apr-2028
Mei-2028
Jun-2028
Jul-2028
Aug-2028
Sept-2028
Okt-2028
Nov-2028
Dec-2028
Jan-2029
Feb-2029
Mrt-2029
Apr-2029
Mei-2029
Jun-2029
Jul-2029
Aug-2029
Sept-2029
Okt-2029
Nov-2029
Dec-2029
Jan-2030
Feb-2030
Mrt-2030
Apr-2030
Mei-2030
Jun-2030
Jul-2030
Aug-2030
Sept-2030
Okt-2030
Nov-2030
Dec-2030
Jan-2031
Feb-2031
Mrt-2031
Apr-2031
Mei-2031
Jun-2031
Jul-2031
Aug-2031
Sept-2031
Okt-2031
Nov-2031
Dec-2031
Jan-2032
Feb-2032
Mrt-2032
Apr-2032
Mei-2032
Jun-2032
Jul-2032
Aug-2032
Sept-2032
Okt-2032
Nov-2032
Dec-2032
Jan-2033
Feb-2033
Mrt-2033
Apr-2033
Mei-2033
Jun-2033
Jul-2033
Aug-2033
Sept-2033
Okt-2033
Nov-2033
Dec-2033
Jan-2034
Feb-2034
Mrt-2034
Apr-2034
Mei-2034
Jun-2034
Jul-2034
Aug-2034
Sept-2034
Okt-2034
Nov-2034
Dec-2034
Jan-2035
Feb-2035
Mrt-2035
Apr-2035
Mei-2035
Jun-2035
Jul-2035
Aug-2035
Sept-2035
Okt-2035
Nov-2035
Dec-2035
Jan-2036
Feb-2036
Mrt-2036
Apr-2036
Mei-2036
Jun-2036
Jul-2036
Aug-2036
Sept-2036
Okt-2036
Nov-2036
Dec-2036
Jan-2037
Feb-2037
Mrt-2037
Apr-2037
Mei-2037
Jun-2037
Jul-2037
Aug-2037
Sept-2037
Okt-2037
Nov-2037
Dec-2037
Jan-2038
Feb-2038
Mrt-2038
Apr-2038
Mei-2038
Jun-2038
Jul-2038
Aug-2038
Sept-2038
Okt-2038
Nov-2038
Dec-2038
Jan-2039
Feb-2039
Mrt-2039
Apr-2039
Mei-2039
Jun-2039
Jul-2039
Aug-2039
Sept-2039
Okt-2039
Nov-2039
Dec-2039
Jan-2040
Feb-2040
Mrt-2040
Apr-2040
Mei-2040
Jun-2040
Jul-2040
Aug-2040
Sept-2040
Okt-2040
Nov-2040
Dec-2040
Jan-2041
Feb-2041
Mrt-2041
Apr-2041
Mei-2041
Jun-2041
Jul-2041
Aug-2041
Sept-2041
Okt-2041
Nov-2041
Dec-2041
Jan-2042
Feb-2042
Mrt-2042
Apr-2042
Mei-2042
Jun-2042
Jul-2042
Aug-2042
Sept-2042
Okt-2042
Nov-2042
Dec-2042
Jan-2043
Feb-2043
Mrt-2043
Apr-2043
Mei-2043
Jun-2043
Jul-2043
Aug-2043
Sept-2043
Okt-2043
Nov-2043
Dec-2043
Jan-2044
Feb-2044
Mrt-2044
Apr-2044
Mei-2044
Jun-2044
Jul-2044
Aug-2044
Sept-2044
Okt-2044
Nov-2044
Dec-2044
Jan-2045
Feb-2045
Mrt-2045
Apr-2045
Mei-2045
Jun-2045
Jul-2045
Aug-2045
Sept-2045
Okt-2045
Nov-2045
Dec-2045
Jan-2046
Feb-2046
Mrt-2046
Apr-2046
Mei-2046
Jun-2046
Jul-2046
Aug-2046
Sept-2046
Okt-2046
Nov-2046
Dec-2046
Jan-2047
Feb-2047
Mrt-2047
Apr-2047
Mei-2047
Jun-2047
Jul-2047
Aug-2047
Sept-2047
Okt-2047
Nov-2047
Dec-2047
Jan-2048
Feb-2048
Mrt-2048
Apr-2048
Mei-2048
Jun-2048
Jul-2048
Aug-2048
Sept-2048
Okt-2048
Nov-2048
Dec-2048
Jan-2049
Feb-2049
Mrt-2049
Apr-2049
Mei-2049
Jun-2049
Jul-2049
Aug-2049
Sept-2049
Okt-2049
Nov-2049
Dec-2049
Jan-2050
Feb-2050
Mrt-2050
Apr-2050
Mei-2050
Jun-2050
Jul-2050
Aug-2050
Sept-2050
Okt-2050
Nov-2050
Dec-2050
Jan-2051
Feb-2051
Mrt-2051
Apr-2051
Mei-2051
Jun-2051
Jul-2051
Aug-2051
Sept-2051
Okt-2051
Nov-2051
Dec-2051
Jan-2052
Feb-2052
Mrt-2052
Apr-2052
Mei-2052
Jun-2052
Jul-2052
Aug-2052
Sept-2052
Okt-2052
Nov-2052
Dec-2052
Jan-2053
Feb-2053
Mrt-2053
Apr-2053
Mei-2053
Jun-2053
Jul-2053
Aug-2053
Sept-2053
Okt-2053
Nov-2053
Dec-2053
Jan-2054
Feb-2054
Mrt-2054
Apr-2054
Mei-2054
Jun-2054
Jul-2054
Aug-2054
Sept-2054
Okt-2054
Nov-2054
Dec-2054
Jan-2055
Feb-2055
Mrt-2055
Apr-2055
Mei-2055
Jun-2055
Jul-2055
Aug-2055
Sept-2055
Okt-2055
Nov-2055
Dec-2055
Jan-2056
Feb-2056
Mrt-2056
Apr-2056
Mei-2056
Jun-2056
Jul-2056
Aug-2056
Sept-2056
Okt-2056
Nov-2056
Dec-2056
Jan-2057
Feb-2057
Mrt-2057
Apr-2057
Mei-2057
Jun-2057
Jul-2057
Aug-2057
Sept-2057
Okt-2057
Nov-2057
Dec-2057
Jan-2058
Feb-2058
Mrt-2058
Apr-2058
Mei-2058
Jun-2058
Jul-2058
Aug-2058
Sept-2058
Okt-2058
Nov-2058
Dec-2058
Jan-2059
Feb-2059
Mrt-2059
Apr-2059
Mei-2059
Jun-2059
Jul-2059
Aug-2059
Sept-2059
Okt-2059
Nov-2059
Dec-2059
Jan-2060
Feb-2060
Mrt-2060
Apr-2060
Mei-2060
Jun-2060
Jul-2060
Aug-2060
Sept-2060
Okt-2060
Nov-2060
Dec-2060
Jan-2061
Feb-2061
Mrt-2061
Apr-2061
Mei-2061
Jun-2061
Jul-2061
Aug-2061
Sept-2061
Okt-2061
Nov-2061
Dec-2061
Jan-2062
Feb-2062
Mrt-2062
Apr-2062
Mei-2062
Jun-2062
Jul-2062
Aug-2062
Sept-2062
Okt-2062
Nov-2062
Dec-2062
Jan-2063
Feb-2063
Mrt-2063
Apr-2063
Mei-2063
Jun-2063
Jul-2063
Aug-2063
Sept-2063
Okt-2063
Nov-2063
Dec-2063
Jan-2064
Feb-2064
Mrt-2064
Apr-2064
Mei-2064
Jun-2064
Jul-2064
Aug-2064
Sept-2064
Okt-2064
Nov-2064
Dec-2064
Jan-2065
Feb-2065
Mrt-2065
Apr-2065
Mei-2065
Jun-2065
Jul-2065
Aug-2065
Sept-2065
Okt-2065
Nov-2065
Dec-2065
Jan-2066
Feb-2066
Mrt-2066
Apr-2066
Mei-2066
Jun-2066
Jul-2066
Aug-2066
Sept-2066
Okt-2066
Nov-2066
Dec-2066
Jan-2067
Feb-2067
Mrt-2067
Apr-2067
Mei-2067
Jun-2067
Jul-2067
Aug-2067
Sept-2067
Okt-2067
Nov-2067
Dec-2067
Jan-2068
Feb-2068
Mrt-2068
Apr-2068
Mei-2068
Jun-2068
Jul-2068
Aug-2068
Sept-2068
Okt-2068
Nov-2068
Dec-2068
Jan-2069
Feb-2069
Mrt-2069
Apr-2069
Mei-2069
Jun-2069
Jul-2069
Aug-2069
Sept-2069
Okt-2069
Nov-2069
Dec-2069
Jan-2070
Feb-2070
Mrt-2070
Apr-2070
Mei-2070
Jun-2070
Jul-2070
Aug-2070
Sept-2070
Okt-2070
Nov-2070
Dec-2070
Jan-2071
Feb-2071
Mrt-2071
Apr-2071
Mei-2071
Jun-2071
Jul-2071
Aug-2071
Sept-2071
Okt-2071
Nov-2071
Dec-2071
Jan-2072
Feb-2072
Mrt-2072
Apr-2072
Mei-2072
Jun-2072
Jul-2072
Aug-2072
Sept-2072
Okt-2072
Nov-2072
Dec-2072
Jan-2073
Feb-2073
Mrt-2073
Apr-2073
Mei-2073
Jun-2073
Jul-2073
Aug-2073
Sept-2073
Okt-2073
Nov-2073
Dec-2073
Jan-2074
Feb-2074
Mrt-2074
Apr-2074
Mei-2074
Jun-2074
Jul-2074
Aug-2074
Sept-2074
Okt-2074
Nov-2074
Dec-2074
Jan-2075
Feb-2075
Mrt-2075
Apr-2075
Mei-2075
Jun-2075
Jul-2075
Aug-2075
Sept-2075
Okt-2075
Nov-2075
Dec-2075
Jan-2076
Feb-2076
Mrt-2076
Apr-2076
Mei-2076
Jun-2076
Jul-2076
Aug-2076
Sept-2076
Okt-2076
Nov-2076
Dec-2076
Jan-2077
Feb-2077
Mrt-2077
Apr-2077
Mei-2077
Jun-2077
Jul-2077
Aug-2077
Sept-2077
Okt-2077
Nov-2077
Dec-2077
Jan-2078
Feb-2078
Mrt-2078
Apr-2078
Mei-2078
Jun-2078
Jul-2078
Aug-2078
Sept-2078
Okt-2078
Nov-2078
Dec-2078
Jan-2079
Feb-2079
Mrt-2079
Apr-2079
Mei-2079
Jun-2079
Jul-2079
Aug-2079
Sept-2079
Okt-2079
Nov-2079
Dec-2079
Jan-2080
Feb-2080
Mrt-2080
Apr-2080
Mei-2080
Jun-2080
Jul-2080
Aug-2080
Sept-2080
Okt-2080
Nov-2080
Dec-2080
Jan-2081
Feb-2081
Mrt-2081
Apr-2081
Mei-2081
Jun-2081
Jul-2081
Aug-2081
Sept-2081
Okt-2081
Nov-2081
Dec-2081
Jan-2082
Feb-2082
Mrt-2082
Apr-2082
Mei-2082
Jun-2082
Jul-2082
Aug-2082
Sept-2082
Okt-2082
Nov-2082
Dec-2082
Jan-2083
Feb-2083
Mrt-2083
Apr-2083
Mei-2083
Jun-2083
Jul-2083
Aug-2083
Sept-2083
Okt-2083
Nov-2083
Dec-2083
Jan-2084
Feb-2084
Mrt-2084
Apr-2084
Mei-2084
Jun-2084
Jul-2084
Aug-2084
Sept-2084
Okt-2084
Nov-2084
Dec-2084
Jan-2085
Feb-2085
Mrt-2085
Apr-2085
Mei-2085
Jun-2085
Jul-2085
Aug-2085
Sept-2085
Okt-2085
Nov-2085
Dec-2085
Jan-2086
Feb-2086
Mrt-2086
Apr-2086
Mei-2086
Jun-2086
Jul-2086
Aug-2086
Sept-2086
Okt-2086
Nov-2086
Dec-2086
Jan-2087
Feb-2087
Mrt-2087
Apr-2087
Mei-2087
Jun-2087
Jul-2087
Aug-2087
Sept-2087
Okt-2087
Nov-2087
Dec-2087
Jan-2088
Feb-2088
Mrt-2088
Apr-2088
Mei-2088
Jun-2088
Jul-2088
Aug-2088
Sept-2088
Okt-2088
Nov-2088
Dec-2088
Jan-2089
Feb-2089
Mrt-2089
Apr-2089
Mei-2089
Jun-2089
Jul-2089
Aug-2089
Sept-2089
Okt-2089
Nov-2089
Dec-2089
Jan-2090
Feb-2090
Mrt-2090
Apr-2090
Mei-2090
Jun-2090
Jul-2090
Aug-2090
Sept-2090
Okt-2090
Nov-2090
Dec-2090
Jan-2091
Feb-2091
Mrt-2091
Apr-2091
Mei-2091
Jun-2091
Jul-2091
Aug-2091
Sept-2091
Okt-2091
Nov-2091
Dec-2091
Jan-2092
Feb-2092
Mrt-2092
Apr-2092
Mei-2092
Jun-2092
Jul-2092
Aug-2092
Sept-2092
Okt-2092
Nov-2092
Dec-2092
Jan-2093
Feb-2093
Mrt-2093
Apr-2093
Mei-2093
Jun-2093
Jul-2093
Aug-2093
Sept-2093
Okt-2093
Nov-2093
Dec-2093
Jan-2094
Feb-2094
Mrt-2094
Apr-2094
Mei-2094
Jun-2094
Jul-2094
Aug-2094
Sept-2094
Okt-2094
Nov-2094
Dec-2094
Jan-2095
Feb-2095
Mrt-2095
Apr-2095
Mei-2095
Jun-2095
Jul-2095
Aug-2095
Sept-2095
Okt-2095
Nov-2095
Dec-2095
Jan-2096
Feb-2096
Mrt-2096
Apr-2096
Mei-2096
Jun-2096
Jul-2096
Aug-2096
Sept-2096
Okt-2096
Nov-2096
Dec-2096
Jan-2097
Feb-2097
Mrt-2097
Apr-2097
Mei-2097
Jun-2097
Jul-2097
Aug-2097
Sept-2097
Okt-2097
Nov-2097
Dec-2097
Jan-2098
Feb-2098
Mrt-2098
Apr-2098
Mei-2098
Jun-2098
Jul-2098
Aug-2098
Sept-2098
Okt-2098
Nov-2098
Dec-2098
Jan-2099
Feb-2099
Mrt-2099
Apr-2099
Mei-2099
Jun-2099
Jul-2099
Aug-2099
Sept-2099
Okt-2099
Nov-2099
Dec-2099
Jan-2100
Feb-2100
Mrt-2100
Apr-2100
Mei-2100
Jun-2100
Jul-2100
Aug-2100
Sept-2100
Okt-2100
Nov-2100
Dec-2100
Jan-2101
Feb-2101
Mrt-2101
Apr-2101
Mei-2101
Jun-2101
Jul-2101
Aug-2101
Sept-2101
Okt-2101
Nov-2101
Dec-2101
Jan-2102
Feb-2102
Mrt-2102
Apr-2102
Mei-2102
Jun-2102
Jul-2102
Aug-2102
Sept-2102
Okt-2102
Nov-2102
Dec-2102
Jan-2103
Feb-2103
Mrt-2103
Apr-2103
Mei-2103
Jun-2103
Jul-2103
Aug-2103
Sept-2103
Okt-2103
Nov-2103
Dec-2103
Jan-2104
Feb-2104
Mrt-2104
Apr-2104
Mei-2104
Jun-2104
Jul-2104
Aug-2104
Sept-2104
Okt-2104
Nov-2104
Dec-2104
Jan-2105
Feb-2105
Mrt-2105
Apr-2105
Mei-2105
Jun-2105
Jul-2105
Aug-2105
Sept-2105
Okt-2105
Nov-2105
Dec-2105
Jan-2106
Feb-2106
Mrt-2106
Apr-2106
Mei-2106
Jun-2106
Jul-2106
Aug-2106
Sept-2106
Okt-2106
Nov-2106
Dec-2106
Jan-2107
Feb-2107
Mrt-2107
Apr-2107
Mei-2107
Jun-2107
Jul-2107
Aug-2107
Sept-2107
Okt-2107
Nov-2107
Dec-2107
Jan-2108
Feb-2108
Mrt-2108
Apr-2108
Mei-2108
Jun-2108
Jul-
