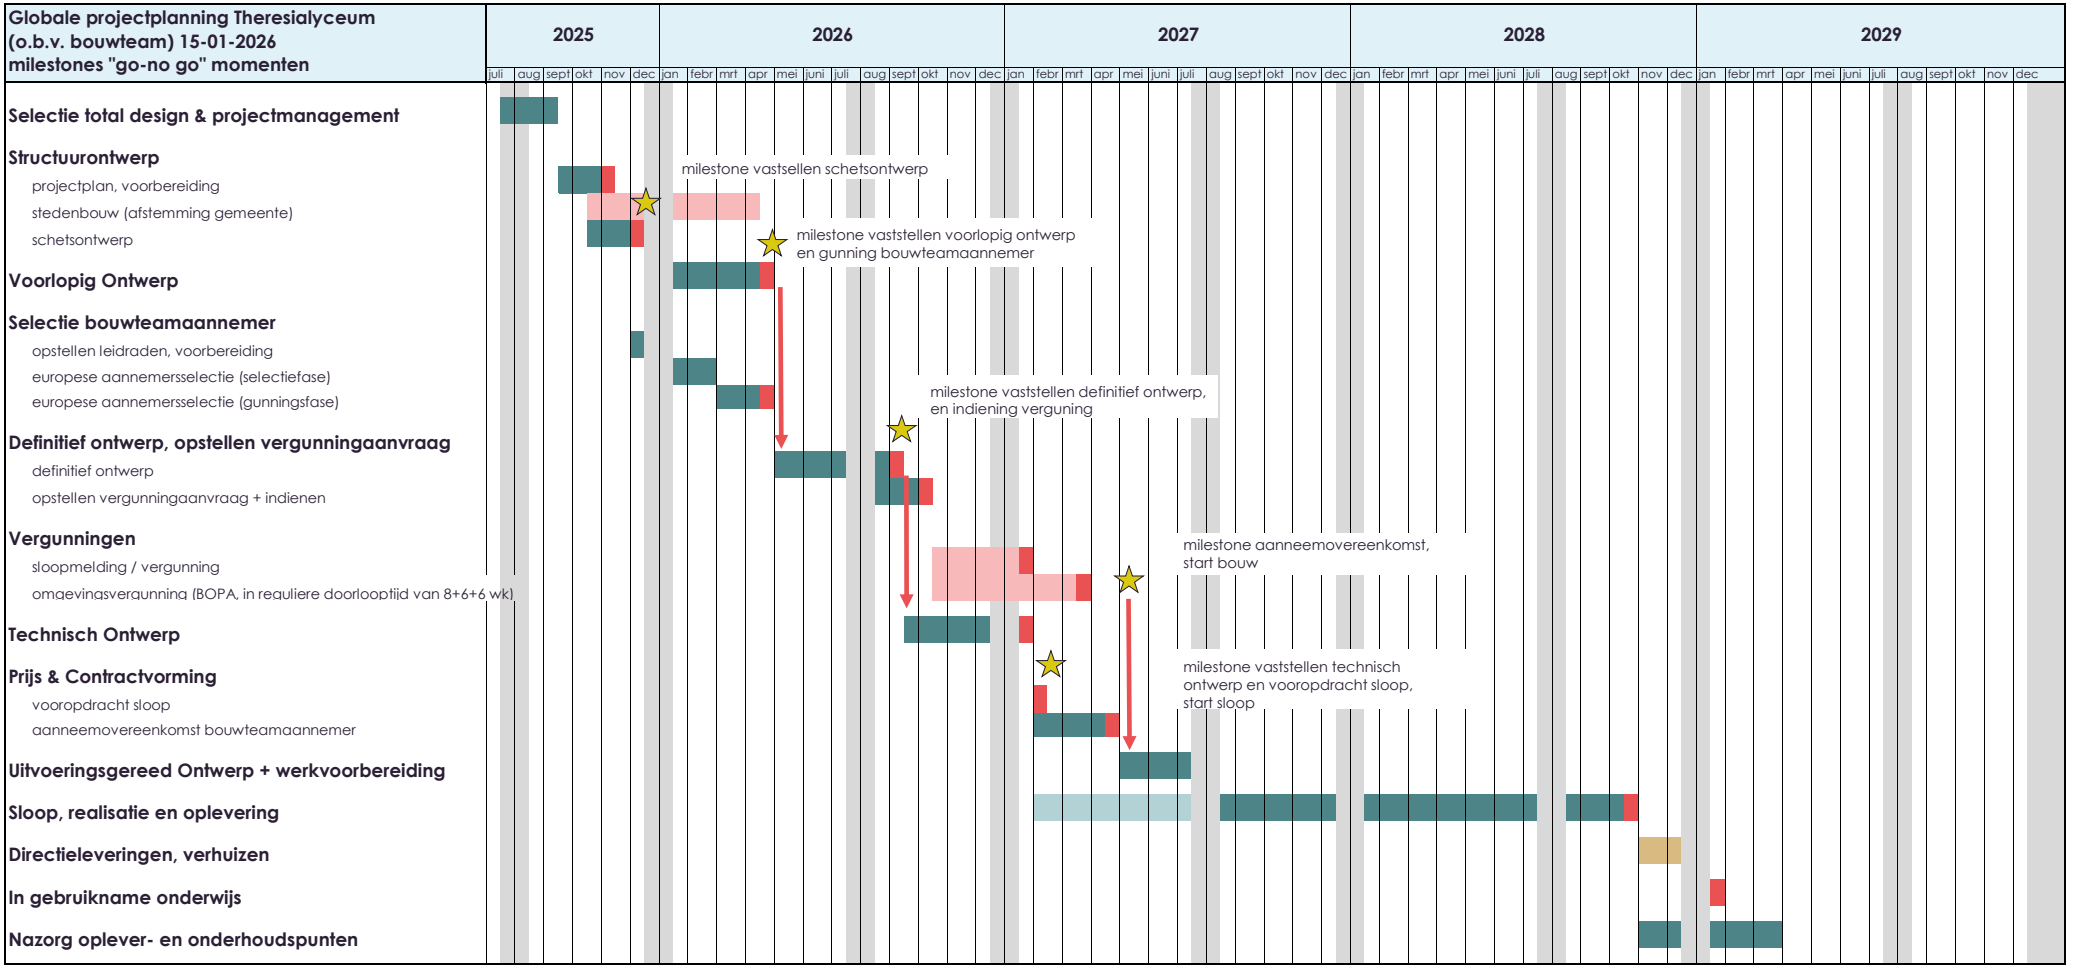
Globale projectplanning Theresialyceum
(o.b.v. bouwteam) 15-01-2026
milestones "go-no go" momenten
2025
2026
2027
2028
2029
juli aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec
Selectie total design & projectmanagement
Structuurontwerp
projectplan, voorbereiding
stedenbouw (afstemming gemeente)
schetsontwerp
milestone vastsellen schetsontwerp
Voorlopig Ontwerp
milestone vaststellen voorlopig ontwerp
en gunning bouwteamaannemer
Selectie bouwteamaannemer
opstellen leidraden, voorbereiding
europese aannemersselectie (selectiefase)
europese aannemersselectie (gunningsfase)
Definitief ontwerp, opstellen vergunningaanvraag
definitief ontwerp
opstellen vergunningaanvraag + indienen
milestone vaststellen definitief ontwerp,
en indiening verguning
Vergunningen
sloopmelding / vergunning
omgevingsvergunning (BOPA, in reguliere doorlooptijd van 8+6+6 wk)
milestone aanneemovereenkomst,
start bouw
Technisch Ontwerp
Prijs & Contractvorming
vooropdracht sloop
aanneemovereenkomst bouwteamaannemer
milestone vaststellen technisch
ontwerp en vooropdracht sloop,
start sloop
Uitvoeringsgereed Ontwerp + werkvoorbereiding
Sloop, realisatie en oplevering
Directieleveringen, verhuizen
In gebruikname onderwijs
Nazorg oplever- en onderhoudspunten
