Id	Taakmodu	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1		**Vergunningen**	**281 dagen?**	**don 2-10-25**	**don 29-10-26**		
2		**Omgevingsvergunning nieuwbouw + sloop**	**281 dagen?**	**don 2-10-25**	**don 29-10-26**		
3		Ingediend	0 dagen	don 2-10-25	don 2-10-25		
4		Beslistermijn	8 wkn	don 2-10-25	woe 26-11-25	3	
5		Verlenging	20 wkn	don 27-11-25	woe 15-4-26	4	
6		Verlenen	1 dag?	vri 31-7-26	vri 31-7-26	5;16	
7		AWB termijn	6 wkn	maa 3-8-26	vri 11-9-26	6	
8		Onherroepelijk	0 dagen	vri 11-9-26	vri 11-9-26	7	
9		**Omgevingsvergunning kap bomen**	**100 dagen**	**vri 13-2-26**	**don 2-7-26**		
10		Ingediend	0 dagen	vri 13-2-26	vri 13-2-26		
11		Beslistermijn	8 wkn	vri 13-2-26	don 9-4-26	10	
12		Verlenging	6 wkn	vri 10-4-26	don 21-5-26	11	
13		AWB termijn	6 wkn	vri 22-5-26	don 2-7-26	12	
14		Onherroepelijk	0 dagen	don 2-7-26	don 2-7-26	13	
15		**Vergunning Flora en Fauna**	**65 dagen**	**vri 31-7-26**	**don 29-10-26**		
16		Uitkomst F&F	0 dagen	vri 31-7-26	vri 31-7-26		Blom Ecologie
17		Vergunning Flora en Fauna	3 mndn	vri 31-7-26	don 22-10-26	66	Blom Ecologie
18		Ongeschikt maken F&F	1 wk	vri 23-10-26	don 29-10-26	67	Blom Ecologie
19		**Omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting**	**130 dagen**	**din 24-3-26**	**maa 21-9-26**		
20		**Afwijken van het omgevingsplan**	**100 dagen**	**din 24-3-26**	**maa 10-8-26**		
21		Indienen* (Afhankelijk van RO-motivatie/aanbesteding)	0 dagen	din 24-3-26	din 24-3-26		HFF/Falco
22		Beslistermijn	8 wkn	din 24-3-26	maa 18-5-26	21	
23		Verlenging	6 wkn	din 19-5-26	maa 29-6-26	22	
24		AWB termijn	6 wkn	din 30-6-26	maa 10-8-26	23	
25		Onherroepelijk	0 dagen	maa 10-8-26	maa 10-8-26	24	
26		**Bouwen / technische bouwactiviteit**	**100 dagen**	**maa 4-5-26**	**maa 21-9-26**		
27		Indienen	0 dagen	maa 4-5-26	maa 4-5-26	71	HFF/Falco
28		Beslistermijn	8 wkn	din 5-5-26	maa 29-6-26	27	
29		Verlenging	6 wkn	din 30-6-26	maa 10-8-26	28	
30		AWB termijn	6 wkn	din 11-8-26	maa 21-9-26	29	
31		Onherroepelijk	0 dagen	maa 21-9-26	maa 21-9-26	30	
32		**Objectvergunning tijdelijke inrit**	**147 dagen**	**maa 2-3-26**	**din 22-9-26**		
33		Opstellen BLVC plan	2 mndn	maa 2-3-26	vri 24-4-26		Bureau BLVC
34		Indienen	0 dagen	din 5-5-26	din 5-5-26	33	
35		Beslistermijn	8 wkn	woe 6-5-26	din 30-6-26	34	
36		Verlenging	6 wkn	woe 1-7-26	din 11-8-26	35	
37		AWB termijn	6 wkn	woe 12-8-26	din 22-9-26	36	
38		Onherroepelijk	0 dagen	din 22-9-26	din 22-9-26	37	
39		**WIOR aanvragen**	**52 dagen**	**maa 13-7-26**	**din 22-9-26**		
40		Aanvraag voorbereiden	2 wkn	maa 13-7-26	vri 24-7-26		
41		Indienen WIOR	1 dag	maa 27-7-26	maa 27-7-26	40	
42		Beslistermijn	8 wkn	woe 29-7-26	din 22-9-26	41;38GE	
43							
44		Aanbestedingen	1 dag?	maa 19-1-26	maa 19-1-26		
45		**Aanbesteding tijdelijke huisvesting [TenderNed]**	**31 dagen**	**maa 16-2-26**	**maa 30-3-26**		
53		**Aanbesteding niebouw [TenderNed]**	**97 dagen?**	**vri 27-2-26**	**maa 13-7-26**		
54		Publiceren aankondiging	1 dag?	vri 27-2-26	vri 27-2-26		
55		Indienen vragen NvI	1 dag?	vri 20-3-26	vri 20-3-26	54	
56		Verstrekken NvI	1 dag?	maa 23-3-26	maa 23-3-26	55	
57		Versturen van uitnodiging	1 dag?	maa 6-4-26	maa 6-4-26	56	
58		Indienen inschrijvingen	1 dag?	vri 12-6-26	vri 12-6-26	57	
59		Bepalen BPKV	1 dag?	maa 15-6-26	maa 15-6-26	58	
60		Voorlopige gunning	1 dag?	maa 22-6-26	maa 22-6-26	59	
61		Definitieve gunning	1 dag?	maa 13-7-26	maa 13-7-26	60	
62		**Sloop**	**331 dagen**	**maa 19-1-26**	**maa 26-4-27**		
77		**Ontwerp en realisatie TH**	**280 dagen**	**din 31-3-26**	**maa 26-4-27**		
78		Stukken t.b.v. vergunning gereed maken	8 wkn	din 31-3-26	maa 25-5-26	52	
79		Vergunning verleend	0 dagen	maa 10-8-26	maa 10-8-26	29	
80		Productie	6 wkn	din 11-8-26	maa 21-9-26	79	
81		Verleggen gasleiding	16 wkn	woe 1-4-26	din 21-7-26		
82		Realisatie	8 wkn	din 22-9-26	maa 16-11-26	80	
83		Verhuizing	1 wk	din 23-2-27	maa 1-3-27		
84		Sloop	2 mndn	din 2-3-27	maa 26-4-27	83	
85		**Nieuwbouw**	**525 dagen**	**din 14-7-26**	**maa 17-7-28**		
86		Bouwvoorbereiding	10 mndn	din 14-7-26	maa 19-4-27	61	
87		Start nieuwbouw	16 mndn	din 27-4-27	maa 17-7-28	84	
88							
89		**Verhuizing**	1 dag?	maa 19-1-26	maa 19-1-26		
90		Groepen 5 t/m 8 verhuizen naar KC Mokum (voorjaarsvakantie 2027)	1 wk	maa 22-2-27	vri 26-2-27		
91		Groepen 1 t/m 4 verhuizen naar TH (Vooraarsvakantie 2027)	1 wk	maa 22-2-27	vri 26-2-27		
92		Terugverhuizing (zomer 2028)	6 wkn	din 6-6-28	maa 17-7-28		

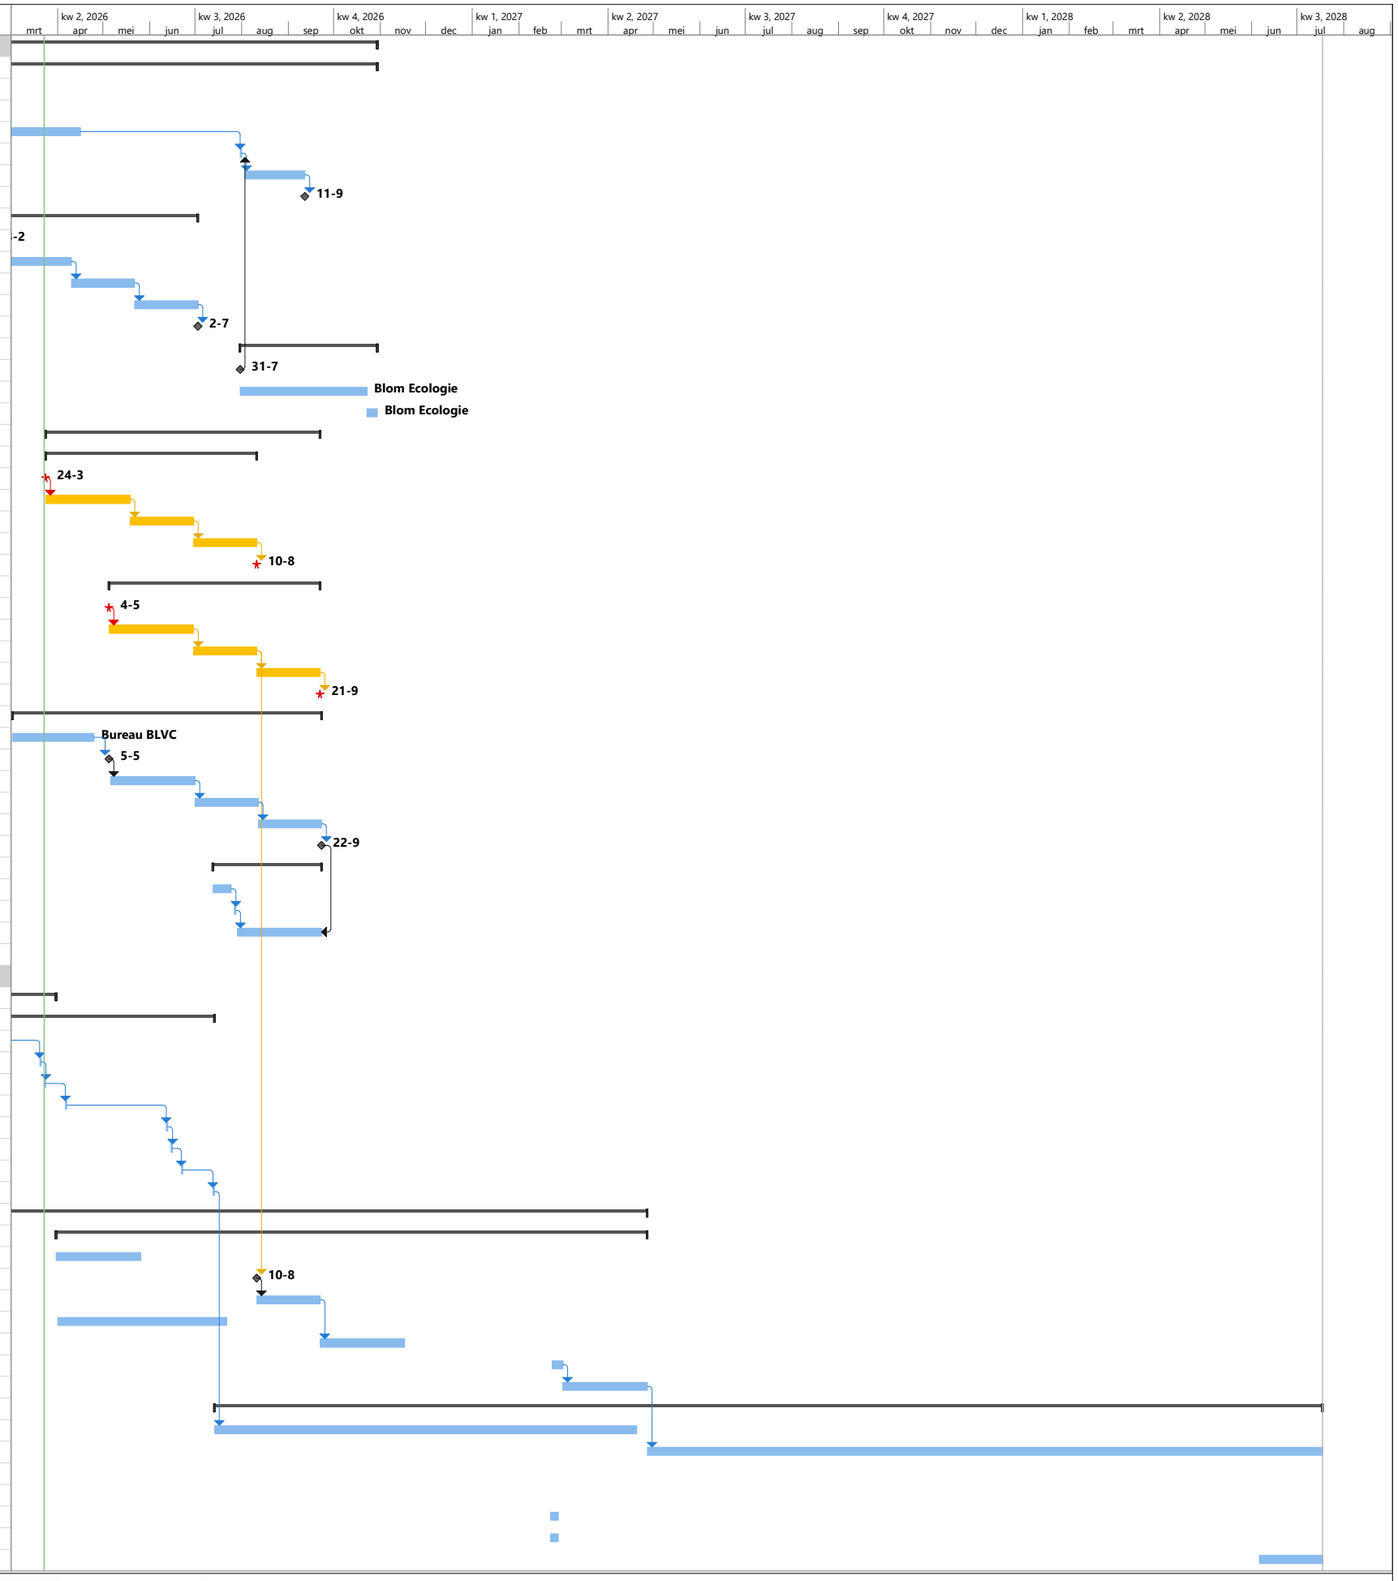

Project: Totaal planning Boven
Datum: maa 23-3-26

Taak	Samenvatting	Inactieve mijlpaal	Alleen duur	Alleen begindatum	Externe mijlpaal	Voortgang, handmatig	
Splitsing	Projectsamenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Deadline		
Mijlpaal	Inactieve taken	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang		
