Bijlage 13 - Toelichting implementatie PPS

Versie 20-05-2026

Inleiding

Alle in deze bijlage genoemde planningen en data zijn indicatief en gebaseerd op de huidige inzichten. De 3RO behouden zich het recht voor deze te wijzigen. De inschrijver kan aan de in deze bijlage genoemde planningen en data geen rechten ontlenen.

De aanbesteding van het dataplatform maakt onderdeel uit van het programma FOCUS. Dit programma omvat de beheerste vervanging van het huidige primaire processysteem IRIS en het huidige dataplatform ROBIN. Binnen het programma worden twee samenhangende projecten uitgevoerd: de implementatie van het nieuwe primair processysteem (iPPS) en de vervanging van het dataplatform. Deze bijlage licht de planning en mijlpalen van het iPPS-project toe, voor zover relevant voor de inschrijver bij het opstellen van zijn plan van aanpak.

De implementatie van het dataplatform is onlosmakelijk verbonden met de implementatie van het nieuwe PPS. Het iPPS-project is leidend en kent eigen mijlpalen. Het implementatieproject voor het dataplatform moet hieraan ondergeschikt worden ingepast. De inschrijver dient in zijn plan van aanpak (G2) aan te tonen hoe zijn fasering aansluit op de hier beschreven iPPS-planning én hoe hij omgaat met eventuele verschuivingen daarin.

Programma FOCUS – high level planning

Het programma FOCUS kent zeven beslismomenten die de Directieraad van de 3RO de gelegenheid geven om per fase expliciet te besluiten over de voortgang. Onderstaande figuur toont de high-level planning van het programma.

Programma FOCUS high level planning

ID	Omschrijving	Datum	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27	Q3 '27	Q4 '27	jan '28
PROGRAMMA												
B1	Na PPS mijlpaal 1, vóórdat design start	01-jan-26		◆ jan								
B2	Na PPS mijlpaal 4, vóór de bouw/configuratie	30-jun-26			jun◆							
B3	Gunning Dataplatform	10-aug-26				◆ aug						
B4	Na GI & werkstraf acceptatie tests	30-okt-26					◆ okt					
B5	Na EM, Advies & Toezicht acc tests	30-apr-27							◆ apr			
B6	Vóór Go-live Dataplatform	30-sep-27								sep ◆		
B7	Vóór Go-live PPS	01-jan-28									dec ◆	

Fasering iPPS

De implementatie van het nieuwe PPS is gegund aan een leverancier en verloopt conform onderstaande indicatieve planning.


FOCUS projecten high-level planning												
ID	Omschrijving	Datum	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27	Q3 '27	Q4 '27	jan '28
iPPS												
Voorbereidingsfase, M1		1-10-25 tot 31-12-25										
IP1	Voorbereiding											
Ontwikkelfase, M2 - M8		1-1-26 tot 30-11-27										
IP2	Generieke componenten	01-apr-26										
IP3	ICB Flow	01-jul-26										
IP4	Gedragsinterventie	01-jul-26					GAT					
IP5	Werkstraf	01-aug-26					GAT					
IP6	Logistiek & administratie	01-sep-26										
IP7	EM	01-nov-26						GAT				
IP8	Advies	01-jan-27							GAT			
IP9	Toezicht	01-apr-27							GAT			
IP10	ICB	01-okt-27										
IP11	COSA & Bureau Buitenland	01-nov-27										
IP12	Overige vrijwillige kaders	01-nov-27										
IP13	RACT	01-nov-27										
IP14	Datamigratie	01-jan-28										
IP15	Dataplatform integratie	01-nov-27										
Acceptatiefase, M9-M11												
IP16	Gebruikersacceptatie (UAT)	01-nov-27										
IP17	Go-live PPS	01-jan-28										

Mijlpalen dataplatform-traject

Het dataplatform-traject kent de onderstaande indicatieve mijlpalen. De mijlpalen DP5 tot en met DP8 zijn inhoudelijk verbonden aan de iPPS-planning en schuiven proportioneel mee met verschuivingen daarin, conform het antwoord op vraag 397 in de Nota van Inlichtingen. De overige mijlpalen (DP1 t/m DP4 en DP9) zijn algemene project-mijlpalen.

FOCUS projecten high-level planning												
ID	Omschrijving	Datum	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27	Q3 '27	Q4 '27	jan '28
DATAPLATFORM												
DP1	Publicatie aanbesteding	08-apr-26										
DP2	Definitieve gunning	10-aug-26										
DP3	Contractstart	01-sep-26										
DP4	Implementatie start	01-sep-26										
DP5	Ontsluitin IRIS → DP	01-apr-27										
DP6	Go-live Dataplatform	30-sep-27										
DP7	Aansluiting PPS → DP	01-nov-27										
DP8	Omschakeling IRIS --> PPS	x-jan-28										
DP9	Implementatie einde	31-jan-28										

Gegevensstromen gedurende implementatieperiode

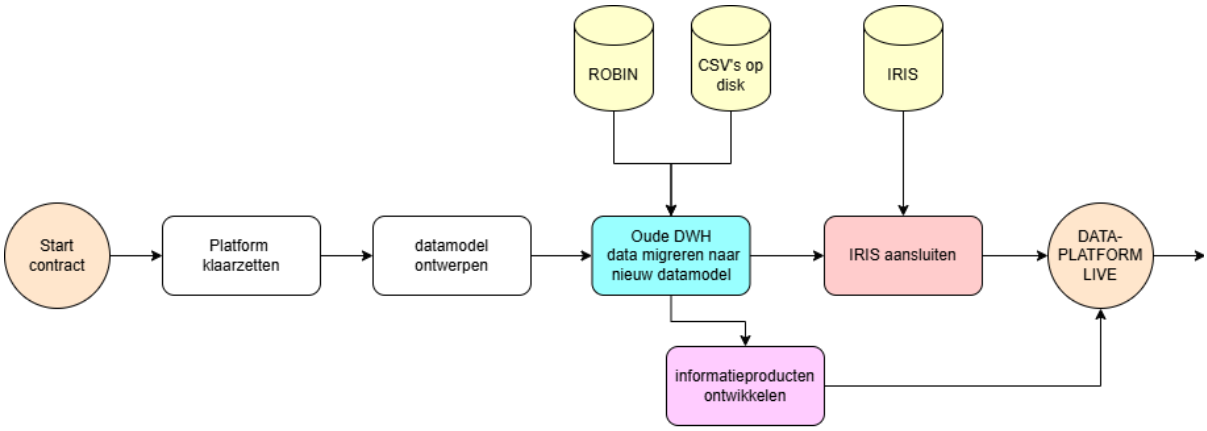


Platform klaarzetten en datamodel ontwerpen
In deze stap wordt de technische omgeving ingericht en wordt het gegevensmodel ontworpen. Dit model zal zowel de huidige IRIS-structuren als de toekomstige PPS-structuren moeten kunnen verwerken.

Migratie bestaand datawarehouse
De gegevens uit het huidige reclasseringsdatawarehouse (ROBIN) en de historische bestanden op fileshares worden verladen naar het nieuwe dataplatform. De migratie vindt plaats vóór livegang, zodat historische continuïteit van informatieproducten vanaf dag één gewaarborgd is.

Informatieproducten ontwikkelen
Parallel aan de migratie worden bestaande gegevensmodellen, datasets, scripts en rapportages in samenwerking met Reclassering Data en Statistiek opnieuw opgebouwd in de nieuwe omgeving. Per informatieproduct wordt bepaald of het wordt overgenomen, herontworpen of uitgefaseerd.

IRIS aansluiten
Het dataplatform wordt aangesloten op IRIS voor de dagelijkse gegevensverversing. Deze aansluiting blijft actief totdat IRIS wordt uitgefaseerd begin 2028.

Dataplatform live
Het dataplatform wordt operationeel gebracht op basis van IRIS-data en gemigreerde historische gegevens. De beoogde livegang is september 2027.

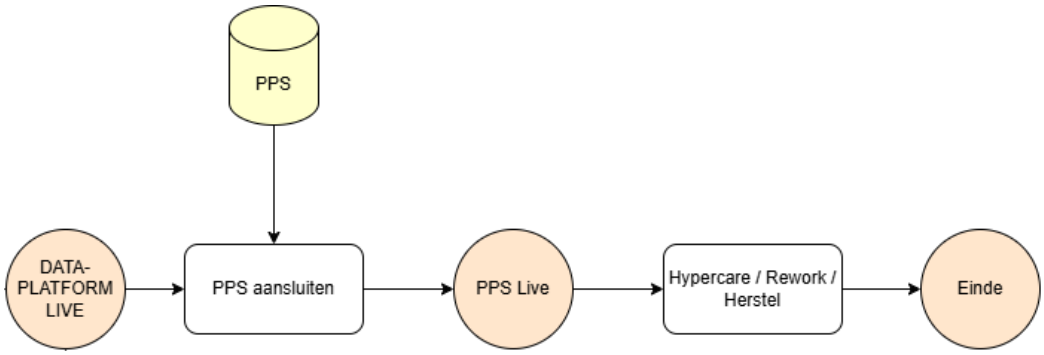


PPS aansluiten
De technische aansluiting op het nieuwe PPS wordt voorbereid en getest vóórdat het PPS operationeel is, op basis van testdata uit de iPPS-ontwikkel- en testomgevingen of een beperkt gevuld datamodel. Zodra de exportkoppeling in productie beschikbaar is, ontvangt het dataplatform data uit zowel IRIS als PPS. Deze parallelle situatie is noodzakelijk om gegevens uit beide systemen te valideren en reconciliëren voordat de definitieve omschakeling plaatsvindt.

PPS live en omschakeling
Bij livegang van het nieuwe PPS (beoogd begin 2028) schakelt de autoritaire gegevensbron om van IRIS naar PPS. Het dataplatform adapteert deze omschakeling in de datalineage, zonder onderbreking van de informatievoorziening. IRIS wordt uitgefaseerd als dagelijkse bron; de historische IRIS-gegevens blijven beschikbaar.

Nazorg, rework en herstel
Na livegang PPS volgt een periode waarin bevindingen worden verwerkt, informatieproducten zo-nodig worden bijgesteld op basis van PPS-gegevensstructuren en afwijkingen worden hersteld.

Totaal flow

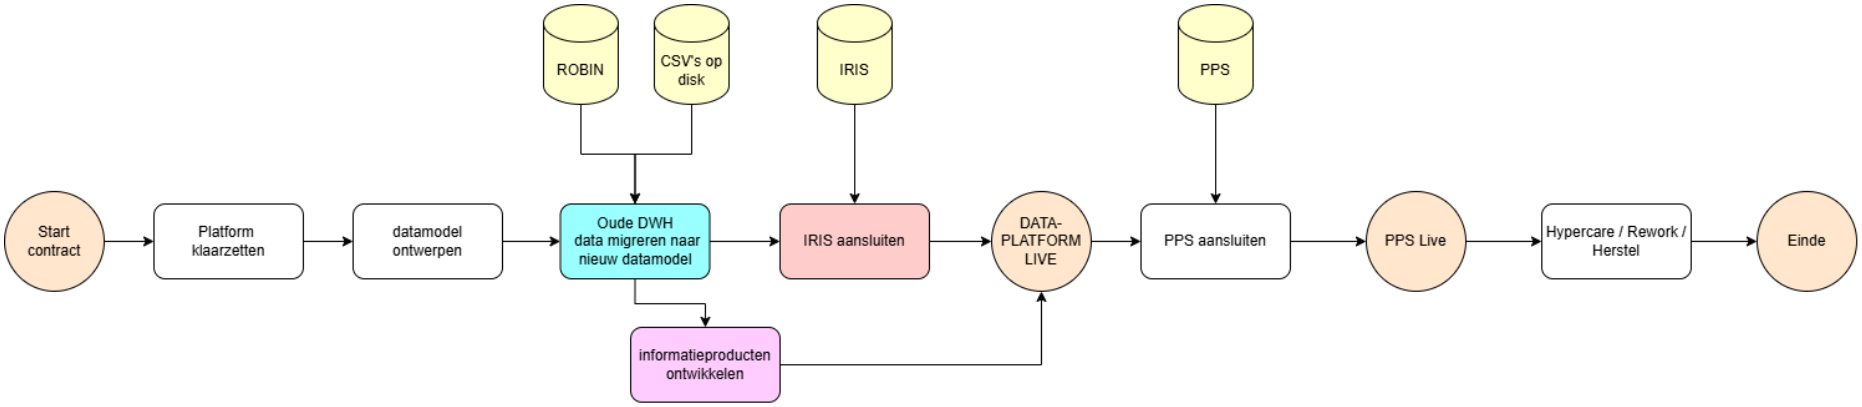
ROBIN
CSV's op disk
IRIS
PPS
Start contract
Platform klaarzetten
datamodel ontwerpen
Oude DWH data migreren naar nieuw datamodel
IRIS aansluiten
DATA-PLATFORM LIVE
PPS aansluiten
PPS Live
Hypercare / Rework / Herstel
Einde
informatieproducten ontwikkelen
